შ.პ.ს. „კოლხა 07“

ქ. თბილისში, სტეფანე ჭრელაშვილის №1-ში არსებული შენობების

სადემონტაჟო სამუშაოთა პროექტი

შ.პ.ს. „კოლხა 07“-ის დირექტორი  თ. ბადათურია

შემსრულებელი  ა. მაისაშვილი

ქ.თბილისი 2018წ.

სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი ქ. თბილისში, სტეფანე ჭრელაშვილის ქ. №1-ში არსებული შენობების დაშლაზე

სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტის შედგენას საფუძვლად დაედო აზომვითი ნახაზი, საკადასტრო რუკა და ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან. ტერიტორიის დათვალიერება და შესწავლა. დასაშლელია ერთ, ორ და სამ სართულიანი შენობები, რომლებიც საკადასტრო გეგმაზე 1/1; 2/3; 3/2; 4/1; 5/1; 6/1; 7/1; 8/1; 9/1; 10/1; 11/1; 12/1; 13/1; 14/1; 15/1; 16/1; 17/1; 18/1; 19/1; 20/1; 21/1; 22/1; 23/1; 24/1; 25/1; 26/1; 27/1; 28/1; 29/1; 30/1; 31/1; 32/1; 33/1; 34/1; 35/1; 36/1; 36/1; 37/1; 38/1; 39/1; 40/1; 41/1; 42/1; 43/1; 44/1; 45/1; 46/1; 47/1- ნომრითაა მითითებული და მისი საერთო ფართობი 2278.45 კვ.მ. და მოცულობით 6060.15 კუბ.მ. შენობა ქალაქის ცენტრალურ ზონაში მდებარეობს. მასთან სამანქანო მისასვლელი გზა სტეფანე ჭრელაშვილის ქუჩის მხრიდანაა, რაც წარმოდგენილია სამუშაოთა წარმართვისა და ორგანიზაციის გეგმაზე. დასაშლელ სამუშაოთა წარმართვა სასურველია ხელით. ასევე დაშლილი სამშენებლო მასალებისა და ნაგვის დასატვირთად თვითმცლელ ავტოტრანსპორტი. უბანი ხასიათდება შემდეგი კლიმატური და სეისმური ფაქტორებით: ქარის დაწოლა - 45კვ.მ./მ2; თოვლის საფარის წონა - 50კვ/მ2, სეისმურობა-8 ბალი. როგორც ავღნიშნეთ, დასაშლელი შენობის საერთო ფართობი შეადგენს 2278.45 კვ.მ-ს. სამუშაოთა საორიენტაციო ღირებულება დადგინდეს ურთიერთ შეთანხმებით. სამუშაოთა წარმოების პროცესში მოსალოდნელია სამუშაოთა რაოდენობა და ღირებულების კორექტრება. აღნიშნულის გამო ანგარიშწორება დამკვეთსა და მეიჯარეს შორის რეკომენდირებულია წარმოებდეს ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით, ურთიერთ შეთანხმებით. დასაშლელი სამუშაოების წარმოების პერიოდში დროებითი ღობის ფარგლებში უნდა მოხდეს გადარჩენული მასალა-ნაკეთობების (აგურის, რკინის მასალის და სხვა.) დაშტაბელება. სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვის გატანა ნაყარში გათვალისწინებულია თვითმცლელი ავტოტრანსპორტით. მათი ნუსხა მოყვანილია ცხრილში მომდევნო ფურცელზე. სამუშაოთა წარმოების დროს აუცილებელია შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა, აგრეთვე შენობის დაშლის დროს სელიტებურ ზონაში მტვრის გაფანტვისაგან დამცავი ღონისძიებების უზრუნველყოფა. სამუშაოები აუცილებელია წარიმართოს საავტორო ზედამხედველობის ქვეშ. დაშლის სამუშაოებზე დამკვეთის მიერ დადგენილია გეგმიური ხანგრძლივობა 12 თვის პერიოდში.

შენობის დასაშლელ სამუშაოთა წარმოების პროექტის შესადგენი ნორმატივები

2.1 СНиП 3.01.01-85 „Оригинализация строительного производства'' М.,1989

2.2 СНиП -4-80 „Техника безопасности на строительстве'' М., 1981

2.3 Справочник инженера строителя, М., 1989

2.4 Строительные стреловые самоходные краны, М., 1984

2.5 კრებული სამახსოვრო "სამშენებლო წარმოების ნორმები და წესები", ამონაწერი სამშენებლო ნორმებიდან და წესებიდან, თბ., 1987

დასაშლელი ობიექტის დახასიათება

შენობები გეგმაში სხვადასხვა ფორმისაა. სხვადასხვა ზომებით საძირკველი შერეული ტიპისაა. კედლების შევსება ხდება აგურით, ბლოკით და რკინის ფურცლებით. სახურავი შეადგენს ხის და რკინის სანივნივე სისტემას და დახურულია თუნუქით.

ტერიტორიაზე გაყვანილია სხვადასხვა საინჟინრო ქსელები და მათი განშტოებები.

სასურველია შენობების, რომელიც საკადასტრო რუკაზე 2/3 და 27/1 ნომრითაა აღნიშნული, დემონტაჟი განხორციელდეს სხვა ზემოთ აღნიშნული შენობეზე სადემონტაჟო სამუშაოების შემდეგ.

დაშლის დაწყებისას აუცილებელია მოეწყოს ხის ან მავთულ-ბადოვანი ღობე და იქ სადაც შენობების კედლები განთავსებულია საკადასტრო საზღვრებზე, შესაძლებელია მათი კედლები გამოყენებულ იქნას დროებით ღობეთ. მათი დაშლა მოხდება სამშენებლო-სადემონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ. ზოგიერთ სამუშაოთა წარმართვისა და ორგანიზაციის გენგეგმის მიხედვით.

მითითებები სამუშაოთა წარმოების თაობაზე

როგორც აღნიშნა დასაშლელი სამუშაოების წარმართვა უნდა მოხდეს ხელით და სამშენებლო ტექნიკის გამოყენებით.

სამუშაოები იწყება კარკასის მოხსნით. საძირკვლები შერეული ტიპისაა. მის დასაშლელად საჭირო გახდება სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენება. გამოთავისუფლებული არმატურა გადაეწყოს ეზოში მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩასაბარებლად.

მონგრეული ბეტონის კოშტებს თუ მიწა ან ნაგავი არ მიეყრება.

შეასაძლებელი გახდება მისი ხელმეორედ გამოყენება მონოლითურ ბეტონში.

მოხსნილი მასალები გასუფთავდეს, გაიწმინდოს, დახარისხდეს და

შტაბელებად დაეწყოს დროებითი ღობის ფარგლებში. მათი ხელმეორედ გამოყენება გაისაზღვროს ახალი მშენებლობების არქიტექტურულ-კონსტრუქციულ გადაწყვეტილებებში: საყრდენ კედლებში, ტიხრებში, კედლებში და ა.შ.

დაშლის ხანგრძლივობის შესახებ

შენობის დაშლა დაკვეთის მიერ განსაზღვრულია 12 თვის ვადაში.
გეგმიურად დადგენილი ხანგრძლივობის დაცვა შენობის დაშლაზე
12 თვის პერიოდში შესაძლებელია უწყვეტი ფინანსირების პერიოდში,
რასაც ხელი უნდა შეუწყოს ქ.თბილისის რბილმა და ზომიერმა კლიმა-
ტურმა პირობებმაც.

სამუშაოთა შესრულების ვადების დაცვა უწყვეტ ფინანსირებაზეა დამოკიდებული, რაც უნდა გაითვალისწინოს დამკვეთმა.

სამშენებლო მანქანა-მექანიზმების, დანადგარებისა და ინსტრუმენტების ჩამონათვალი

№	დასახელება	მარკა	რაოდენ. ცალი
1	2	3	4
1	თვითმცლელი ძარიანი და სპეც-დანიშნულების ავტოტრანსპორტი სამშენებლო ტვირთის გადასატანად	სხვადასხვა	1
2	გადასატანი კომპრესორი	სო-48	1
3	ელექტროშესადუღებელი საჭრელი აგრეგატი	კომპ.	1
4	ავტოკენური შედუღების და ჭრის აპარატი	კომპ. პკუ-35	1
5	სახურავის ფურცლის გასაწმენდი დანადგარი		1
6	პნევმატური ინსტრუმენტი: საბურღი, ხრახნდამჭერი და სხვა.	-	1
7	ლითონის სახარაჩო სექციები 100 მ2 ფართობისათვის	კომპ.	2
8	საავტომობილო ამწე	ც	1

მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების წესების დაცვის თაობაზე

მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვა შენობათა დაშლის ცალკეულ ეტაპებზე აუცილებელია სნ და ვ III-4-80* "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე" და სხვა ნორმატულ-საკანონმდებლო დოკუმენტების შესაბამისობით. მათგან ყურადღებას ვამახვილებთ შემდეგზე:

13.1. სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებით.

13.2 ელექტროუსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია სახელმწიფოსტამდარტში 12.013-88 ელექტროკარადა ყოველთვის უნდა იყოს ჩაკეტილ მდგომარეობაში, ელექტროკაბელები, ელექრტოსადენები და ელექტრომოწყობილობები კი იზოლირებულ. გაშიშვლებული სადენების გამოყენება აკრძალულია.

13.3 ამწეების მუშაობის პერიობში დაუშვებელია უცხო პირთა, ასევე დაშლის ოპერაციებში დაუსაქმებელ მიშა-მომსახურეთა ყოფნა სამშემებლო გენგეგმაზე შემოფარგლული ამწეთა მოქმედების სახიფათო ზონის ფარგლებში. ასეთი ზონები სცილდება შემოღობილი ტერიტორიის ფარგლებსაც, რის გამოც აუცილებელია შემზღუდავი ღონისძიებების განხორციელება: იკრძალება ისრის ტრიალი დასაშლელი შენობის გარეთ; აშლილი კონსტრუქციის ჩამოშვება უნდა განხორციელდეს შენობის ვერტიკალის გასწვრივ მათი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში პირდაპირი ცატვირთვით; კონსტრუქციიდან მარყუჟების ჩახსნაზე გამოყოფილი მუშები შორიდან ხემძღვანელობენ ჩამოშვების პროცესს; შემდეგ უახლოვდებიან მანქანებს და ასრულებენ მათ მანქანებში ჩატვირთვას უსაფრთხოების წესების დაცვითა და მარყუჟების შეხსნით.

იკრძალება ამწის ისარზე ჩამოკიდებული ტვირთით ისრის შემობრუნება მოედნისა და ქუჩის მხარეს, ცხადია ისრის ტრიალიც ღერძის გარშემო.

აუცილებელია დროებით ღობეებზე გაიკრას ამწის მოქმედების სახოფათო ზონების აღნიშნული ფორნიშები ღობის გარეთა რადიუსების მითითებებით მეტრებში. ღამის პერიოდებში უსაფრთხოების ზონის აღმნიშვნელი ფირნიშები აუცილებელია განათდეს.

სამიშაოთა უწყვეტობისა და ტექნოლოგიურობის, აგრეთვე შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფად აუცილებელია მშენებლობის სხრილში მოცემული და ჩვენს მიერ რეკომენდირებული მანქანა-მექანიზმებით, ინსტრუმენტებითა და დანადგარ-სამარჯვეებით აღჭურვა. ცხადია შესაძლებელია მათი შეცვლაც უფრო თანამედროვეთი.

. დაშლით ოპერაციებში დასაქმებული მუშაკები დაცული უნდა იყვნენ თავის დამცავი ჩაფხუტებით (კასკებით).

. დაუშვებელია მანქანების, ხელსაწყოებისა და მოწყობილობების

დატოვება ჩართულ მდგომარეობაში ზედამხედველობის გარეშე. ცხადია მათი ტექნიკური მომსახურეობაც უნდა მოხდეს ძრავის გამორთვის შემდეგ.

. ლითონის ელემენტების ჩაჭრას ელექტრო ან აიროვანი აპარატებით ქვედა იარუსებზე 5 მეტრის რადიუსში ფართობები
უნდა გავანთავისუფლოთ წვადი მასალებისაგან, ხოლო 10 მეტრის რადიოსში ასაფეთქებელი (მაგალითად ჟანგბადის ბალონები) მასალებისაგან.

. დასაშლელ სამუშაოებზე დასაქმებულია ყველა მუშაკმა (როგორც მუშამ, ასევე მოსამსახურემ) უნდა შეისწავლოს შრომის უსაფრთხოების წესებს, ასევე მოსამსახურემ) უნდა შეისწავლოს შრომის უსაფრთხოების წესები, გაიაროს ინსტრუქტაჟი, ჩააბაროს გამოცდა სპეციალურ ჟურნალში ხელმოწერების დაფიქსირებით.

ბუნების დაცვითი და ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებები

შენობა მდებარეობს ქალაქ თბილისის ცენტრში სელიტებურ განაშენიანებაში. აღნიშნულის გამო აუცილებელია შენობათა დაშლის პერიოდში შემდეგი ღონისძიებების დაცვა.

გარემოს დაცვის სამსახურის ნებართვის გარეშე იკრძალება მრავალწლიანი ხეებისა და ნარგავების მოჭრა, ამოძირკვა ან განადგურება.

კედლების, ტიხრების, იატაკის დაშლის პროცესში მოსალოდნელია მტვრის გაფანტვა გარე სივრცეში, რის გამოც შენობას უნდა ჩამოეფაროს ფარდა ანდა სამუშაოები განხოეციელდეს დახურულ სივრცეში ვენტილაციის მოწყობით.

იკრძალება სამშენებლო ნაგვისა და ნარჩენების ღია წესით ჩამოყრა. სასურველია სამშენებლო ნაგვის პირდაპირ თვითმცლელი მანქანების ძარებში ჩაყრა. დიდი ზომის სამშენებლო ნარჩენები ან მოხსნილი ნაკეთობები უნდა ჩამოვუშვათ ამწის საშუალებით. აქაც სასურველია მაშინვე მოხდეს მათი ავტომანქანების ძარებში ჩატვირთვა და ნაგავსაყრელზე ან დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე ტრანსპორტირება.

დაუშვებელია არსებული საკანალიზაციო ჭების დანაგვიანება სამშენებლო ნარცენებით.


ასევე დაუშვებელია ამოსახაპი ორმოების მოწყობა. ინვენტარული საყოფაცხოვრებო ვაგონეტიდან საკანალიზაციო ჩადინება უნდა მოეწყოს უშუალოდ საქალაქო საკანალიზაციო წებში. გენგეგმაზე მათ მოსაწყობად მითითებული ადგილები შესაძლებელია შეიცვალოს საკანალიზაციო წების სიახლოვეს მათი განთავსებით ამწეტა მოქმედების სახიფათო ზონების საზღვრების გათვალისწინებით. სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება ფხვიერ მდგომარეობაში რეკომენდირებული არ არის. ავტომანქანების ძარებში ჩატვირთვის შემდეგ მათი ზედაპირი დაინამოს.

საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო კოდი: **01.17.13.051.011**
განცხადების ნომერი: **892018615328**
მომზადების თარიღი: **13/07/2018**

ნაკვეთის დანიშნულება: **არასასოფლო სამეურნეო**
ფართობი: **3520 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)**

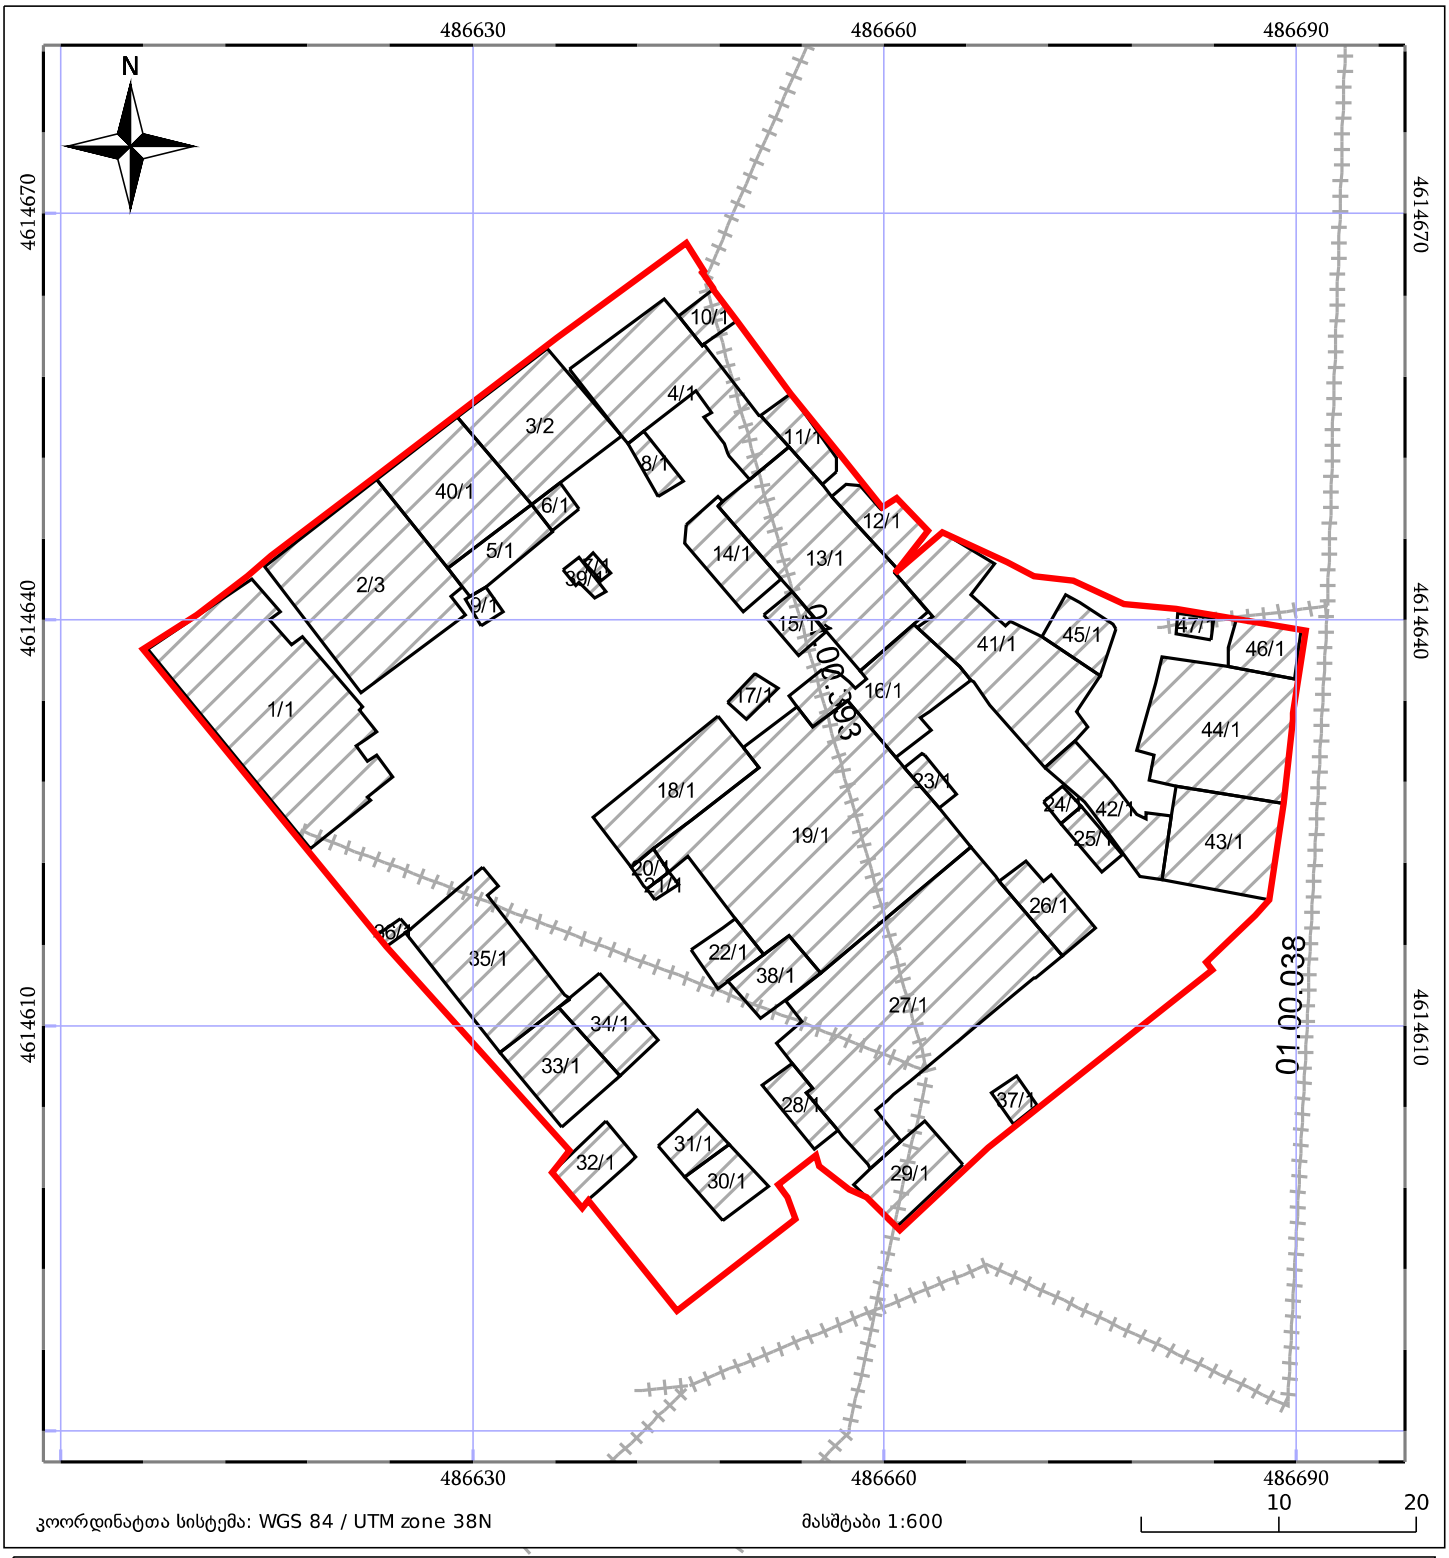

05/25 მშენებარე ნაგებობა
05/25 შენობა/ნაგებობა
ტყის ფონდი
ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
ხაზობრივი ნაგებობა
ვალდებულება

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი **N 01.17.13.051.011**

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 892018623795 - 13/07/2018 16:47:35

მომზადების თარიღი
20/07/2018 11:24:24

საკუთრების განყოფილება

ზონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი
თბილისი	ისანი		
01	**17**	**13**	**051/011**

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სტეფანე ჭრელაშვილის ქუჩა, N 1

ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება

ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო

დაზუსტებული ფართობი: 3520.00 კვ.მ.

ნაკვეთის წინა ნომერი: **01.17.13.051.009; 01.17.13.051.004; 01.17.13.051.007; 01.17.13.051.010;**

შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1-დან 47-ის ჩათვლით.

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 892018566017 , თარიღი 27/06/2018 09:34:00
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 03/07/2018

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- საკუთრების უფლების მოწმობა N692 , დამოწმების თარიღი:01/03/2017 , თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:25/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:15/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:27/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:20/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- უძრავი ქონების ნასყიდობისა და წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულება (უძრავი ქონების შეზღუდულ საკუთრებაში გადაცემისა და სანაცვლოდ ახლადაშენებული ბინის გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:02/07/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:11/07/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრებაში გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:26/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრებაში გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:11/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:22/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:28/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , გაფორმების თარიღი:22/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრებაში გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:11/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 ,სსიპ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 ,სსიპ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 ,სსიპ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 ,სსიპ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:22/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- უძრავი ქონების ნასყიდობისა და წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულება , დამოწმების თარიღი:02/07/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- უძრავი ნივთის ჩუქების ხელშეკრულება , დამოწმების თარიღი:01/02/2012 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- საკუთრების უფლების მოწმობა N254 , დამოწმების თარიღი:20/10/2016 , ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობა
- შეთანხმება , დამოწმების თარიღი:24/01/2017 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- უძრავი ნივთის ჩუქების ხელშეკრულება , დამოწმების თარიღი:06/03/2017 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:15/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , გაფორმების თარიღი:20/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:27/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , გაფორმების თარიღი:27/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ ხელშეკრულება , დამოწმების თარიღი:15/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

მესაკუთრეები:
შპს "ისანი", ID ნომერი:406209954

მესაკუთრე:
შპს "ისანი"

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018522898 თარიღი 15/06/2018 12:10:39

უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 20/06/2018

გამყიდველი: მიხეილ მჭედლიშვილი P/N: 01011059333;
მყიდველი: შპს "ისანი" 406209954;

საგანი:მიხეილ მჭედლიშვილის კუთვნილი წილი;
ინვესტორმა განახორციელოს მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა. აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით განახორციელოს შემდეგი ქმედებები: შექმნას სამშენებლო პროექტი, შეათანხმოს შესაბამის უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან და მოიპოვოს მშონებლობის ნებართვა, ასევე ყველა საჭირო ნებართვა ან/და თანხმობა, რაც საჭიროა სამშენებლო საქმიანობის წარმოებისთვის; მიწის ნაკვეთზე აშენებულ შენობა-ნაგებობიდან გადასცეს მესაკუთრეს მიხეილ მჭედლიშვილს (01011059333) სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ ხელშეკრულების (თარიღი: 15.06.2018) 2.4 პუნქტით გათვალისწინებული ფართები; სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ (თარიღი: 15.06.2018) 2.4 გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებამდე ინვესტორს შპს ,,ისანი"-ს აეკრძალოს მიწის ნაკვეთის გასხვისება ან უფლებრივად დატვირთვა. აღნიშნული აკრძალვა არ ვრცელდება ინვესტორის მიერ აშენებული მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობების სხვათაფართების განკარგვაზე და უფლებრივად დატვირთვაზე. ;

სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ ხელშეკრულება , გაფორმების თარიღი:15/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ,

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018534047 თარიღი 19/06/2018 12:26:59

უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 22/06/2018

გამყიდველი: ლალი ორდენიძე P/N: 01011055963;
მყიდველი: შპს "ისანი" 406209954;

1. ინვესტორი, მიწის ნაკვეთზე აშენებული მრავლფუნქიური შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართიდან მესაკუთრეს (მის უფლებამონაცვლ(ეებს)ეს ან მის მიერ კანონით დადგენილი წესით უფლებამოსილ პირს) საკუთრებაში გადასცემს მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის საცხოვრებელი ფართიდან 145 (ას ორმოცდახუთ) კვ.მ-ს თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში და 1 (ერთ) ცალ ავტოფარეხს. 2. შპს "ისანი-ს" აეკრძალოს მიწის ნაკვეთის გასხვისება ან უფლებრივად დატვირთვა, აღნიშნული აკრძალვა არ ვრცელდება ინვესტორის მიერ აშენებული მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის სხვა ფართების განკარგვაზე ან უფლებრივად დატვირთვაზე.;

ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობითი საკუთრების გადაცემის შესახებ, დამოწმების თარიღი19/06/2018, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018566017 თარიღი 27/06/2018 09:34:00

უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 03/07/2018

გამყიდველი: მაკა კობახიძეP/N: 38001031423;
მყიდველი: შპს "ისანი" 406209954;

1. ინვესტორი მიწის ნაკვეთზე აშენებული მრავლფუნქციური შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართიდან მესაკუთრეს საკუთრებაში გადასცემს მრავალფუნქციური შენობანაგებობის საცხოვრებელი ფართიდან 200 (ორასი) კვ.-მ-ს თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში რომელიც გაღმოცემული უნდა იყოს 3 (სამი) დამოუკიდებელი ნაწილის სახით, სახელდობრ 80 (ოთხმოცი) კვ.მ-ს, და 2(ორი) 60-60 (სამოც-სამოცი) კვ.მ ფართს. ასევე კომერციულ ფართს 30 კვ.მ. 2. შპს "ისანი-ს" აეკრძალოს მიწის ნაკვეთის გასხვისება ან უფლებრივად დატვირთვა, აღნიშნული აკრძალვა არ ვრცელდება ინვესტორის მიერ აშენებული მრავალფუნქციური შენობანაგებობის სხვა ფართების განკარგვაზე ან უფლებრივად დატვირთვაზე.;;;

ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ, დამოწმების თარიღი27/06/2018, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018532345 თარიღი 19/06/2018 09:50:53 **უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 22/06/2018**	**მეორე მხარე**: **შპს "ისანი"** 406209954; **პირველი მხარე**: **სვეტლანა ოდიშელიძე** P/N: 01011035846; 1.მეორე მხარე პირველ მხარეს საკუთრებაში გადასცემს მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის საერთო საცხოვრებელი ფართიდან 90 კვ.მ-ს თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში. 2. სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ (თარიღი: 14.06.2018) 2.4 გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებამდე ინვესტორს, შპს ,,ისანი"-ს აეკრძალოს მიწის ნაკვეთის გასხვისება ან უფლებრივად დატვირთვა, აღნიშნული აკრძალვა არ ვრცელდება ინვესტორის მიერ აშენებული სხვა მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის ფართების განკარგვაზე და უფლებრივად დატვირთვაზე.; **ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018565950 თარიღი 27/06/2018 09:17:27 **უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 02/07/2018**	**მეორე მხარე**: **შპს "ისანი"** 406209954; **პირველი მხარე**: **ნინო იკაშვილი** P/N: 01027053756; საგანი:ფართი 30 კვ.მ; 1.,,მეორე მხარე" მიწის ნაკვეთზე აშენებული მრავლფუნქციური შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართიდან "პირველ მხარეს" საკუთრებაში გადასცემს მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის საცხოვრებელი ფართიდან 120 კვ.მ-ს თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში.2. შპს "ისანი-ს" აეკრძალოს მიწის ნაკვეთის გასხვისება ან უფლებრივად დატვირთვა, აღნიშნული აკრძალვა არ ვრცელდება ინვესტორის მიერ აშენებული მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის სხვა ფართების განკარგვაზე ან უფლებრივად დატვირთვაზე.; ; **ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , გაფორმების თარიღი:27/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018540836 თარიღი 20/06/2018 14:26:18 **უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 25/06/2018**	**მეორე მხარე**: **ამირან ქურციკიძე** P/N: 01011045932; **პირველი მხარე**: **შპს "ისანი"** 406209954; საგანი:1.მეორე მხარე პირველ მხარეს საკუთრებაში გადასცემს მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის საერთო საცხოვრებელი ფართიდან 650 კვ.მ-ს თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში, ასევე 50კვ.მკომერციულ ფართს და 2 ავტოსადგომს. 2. სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ (თარიღი: 14.06.2018) 2.4 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებამდე ინვესტორს, შპს ,,ისანი"-ს აეკრძალოს მიწის ნაკვეთის გასხვისება ან უფლებრივად დატვირთვა, აღნიშნული აკრძალვა არ ვრცელდება ინვესტორის მიერ აშენებული სხვა მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის ფართების განკარგვაზე და უფლებრივად დატვირთვაზე. ; **ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი20/06/2018, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018584879 თარიღი 02/07/2018 13:48:19 **უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 06/07/2018**	**გამყიდველი**: **ავთანდილ ქობულაშვილი** P/N: 01014005277; **მყიდველი**: **შპს "ისანი"** 406209954; საგანი:158.67 კვ.მ.; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების პირობით;; **უძრავი ქონების ნასყიდობისა და წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულება (უძრავი ქონების შეზღუდულ საკუთრებაში გადაცემისა და სანაცვლოდ ახლადაშენებული ბინის გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:02/07/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018613353 თარიღი 11/07/2018 11:26:27	**გამყიდველი**: **ნინო ღლონტი** P/N: 01011023291; **მყიდველი**: **შპს "ისანი"** 406209954; საგანი:ბინა N11, ფართი 70.00 კვ.მ.; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების პირობით.;

11:20:27	
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 11/07/2018	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:11/07/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018536801 თარიღი 19/06/2018 17:08:02	**გამყიდველი:** ირინა ცუცქირიძე P/N: 01029014348; **მყიდველი:** შპს "ისანი" 406209954; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 02/07/2018	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრებაში გადაცემის შესახებ , გაფორმების თარიღი:26/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018506615 თარიღი 11/06/2018 17:03:32	**მეორე მხარე:** შპს "ისანი" 406209954; **პირველი მხარე:** კობა სიდამონიძე P/N: 01011030385; საგანი:ფართი 18.00 კვ.მ. ; მხარეები ვალდებულნი არიან შეასრულონ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 16/06/2018	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრებაში გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:11/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018550814 თარიღი 22/06/2018 12:57:06	**მყიდველი:** შპს "ისანი" 406209954; **იპოთეკარი:** ნორა სიდამონიძე P/N: 01011043786; საგანი:სართული 1, ფართი 25.50კვ.მ; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების პირობით;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 26/06/2018	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , გაფორმების თარიღი:22/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018575567 თარიღი 28/06/2018 16:47:53	**გამყიდველი:** ლია სიდამონიძე P/N: 01011010098; **მყიდველი:** შპს "ისანი" 406209954; საგანი:ფართი 23.00 კვ.მ. ; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების პირობით;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 04/07/2018	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:28/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018550848 თარიღი 22/06/2018 12:59:53	**გამყიდველი:** ნორა სიდამონიძე P/N: 01011043786; **მყიდველი:** შპს "ისანი" 406209954; საგანი:ფართი 138.00 კვ.მ.; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების პირობით;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 28/06/2018	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , გაფორმების თარიღი:22/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ,**

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018506622 თარიღი 11/06/2018 17:04:17 **უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 20/06/2018**	**მეორე მხარე**: **შპს "ისანი"** 406209954; **პირველი მხარე**: **კობა სიდამონიძე**P/N: 01011030385; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების პირობით; **ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრებაში გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:11/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018535286 თარიღი 19/06/2018 14:29:04 **უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 25/06/2018**	**მეორე მხარე**: **კახა ხიზანეიშვილი**P/N: 01015008247; **პირველი მხარე**: **შპს "ისანი"** 406209954; საგანი:პირველი მხარე, მიწის ნაკვეთზე აშენებული მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართიდან მეორე მხარეს (მის უფლებამონაცვლ(ეებ)ეს ან მის მიერ კანონით დადგენილი წესით უფლებამოსილ პირს) საკუთრებაში გადასცემს, N4 კორპუსში 50კვ.მ.-ის არასაცხოვრებელ ფართს პირველ სართულზე, ნავთლუღის ქუჩის მხარეს და 275კვ.მ.-ს საცხოვრებელ ფართს ამავე კორპუსში მეორე და ბოლო სართულებზე, ნავთლუღის, ჭრელაშვილის ქუჩებისა და ეზოს შესაბამისი ხედებით, თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში, ორი მიწისქვეშა ავტოსადგომით; **ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018535289 თარიღი 19/06/2018 14:29:25 **უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 25/06/2018**	**მეორე მხარე**: **კახა ხიზანეიშვილი**P/N: 01015008247; **პირველი მხარე**: **შპს "ისანი"** 406209954; საგანი:პირველი მხარე, მიწის ნაკვეთზე აშენებული მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართიდან მეორე მხარეს (მის უფლებამონაცვლ(ეებ)ეს ან მის მიერ კანონით დადგენილი წესით უფლებამოსილ პირს) საკუთრებაში გადასცემს, N4 კორპუსში 50კვ.მ.-ის არასაცხოვრებელ ფართს პირველ სართულზე, ნავთლუღის ქუჩის მხარეს და 275კვ.მ.-ს საცხოვრებელ ფართს ამავე კორპუსში მეორე და ბოლო სართულებზე, ნავთლუღის, ჭრელაშვილის ქუჩებისა და ეზოს შესაბამისი ხედებით, თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში, ორი მიწისქვეშა ავტოსადგომით; **ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018535292 თარიღი 19/06/2018 14:29:41 **უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 25/06/2018**	**მეორე მხარე**: **კახა ხიზანეიშვილი**P/N: 01015008247; **პირველი მხარე**: **შპს "ისანი"** 406209954; საგანი:პირველი მხარე, მიწის ნაკვეთზე აშენებული მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართიდან მეორე მხარეს (მის უფლებამონაცვლ(ეებ)ეს ან მის მიერ კანონით დადგენილი წესით უფლებამოსილ პირს) საკუთრებაში გადასცემს, N4 კორპუსში 50კვ.მ.-ის არასაცხოვრებელ ფართს პირველ სართულზე, ნავთლუღის ქუჩის მხარეს და 275კვ.მ.-ს საცხოვრებელ ფართს ამავე კორპუსში მეორე და ბოლო სართულებზე, ნავთლუღის, ჭრელაშვილის ქუჩებისა და ეზოს შესაბამისი ხედებით, თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში, ორი მიწისქვეშა ავტოსადგომით;; **ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018535192 თარიღი 19/06/2018 14:18:49	**გამყიდველი**: **ლეილა ხიზანეიშვილი** P/N: 01011019841; **მყიდველი**: **შპს "ისანი"** 406209954; საგანი: შენობა N38 და N27, N19-ის ნაწილი, ფართი 93.22 კვ.მ. ; მხარეები ვალდებული არიან შეასრულონ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები;;;

14:16:42 უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 25/06/2018	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 ,სსიპ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი **892018535206** თარიღი **19/06/2018 14:20:08**	**მეორე მხარე**: შპს **"ისანი"** 406209954; **პირველი მხარე**: **ლეილა ხიზანეიშვილი** P/N: 01011019841; საგანი:დამხმარე ფართი სართული1,შენობა N30 და N31 30.06 კვ.მ. ; მხარეები ვალდებული არიან შეასრულონ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი **25/06/2018**	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ, დამოწმების თარიღი19/06/2018, სსიპ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი **892018535207** თარიღი **19/06/2018 14:20:25**	**მეორე მხარე**: შპს **"ისანი"** 406209954; **პირველი მხარე**: **ლეილა ხიზანეიშვილი** P/N: 01011019841; საგანი:დამხმარე ფართი, სართული1, შენობა N33-34, ფართი: 55.80 კვ.მ. ; მხარეები ვალდებული არიან შეასრულონ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი **25/06/2018**	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ, დამოწმების თარიღი19/06/2018, სსიპ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი **892018535211** თარიღი **19/06/2018 14:20:43**	**მეორე მხარე**: შპს **"ისანი"** 406209954; **პირველი მხარე**: **ლეილა ხიზანეიშვილი** P/N: 01011019841; საგანი:ფართი: შენობა N37 5.74 კვ.მ.; მხარეები ვალდებული არიან შეასრულონ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები;;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი **25/06/2018**	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 ,სსიპ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი **892018550901** თარიღი **22/06/2018 13:05:50**	**გამყიდველი**: **კახაბერ სიდამონიძე** P/N: 01011008771; **მყიდველი**: შპს **"ისანი"** 406209954; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების პირობით;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი **25/06/2018**	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ, დამოწმების თარიღი22/06/2018, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი **892018584883** თარიღი **02/07/2018 13:49:05**	**გამყიდველი**: **ავთანდილ ქობულაშვილი** P/N: 01014005277; **მყიდველი**: შპს **"ისანი"** 406209954; საგანი:სარდაფი შენობა N3/2, 35.00 კვ.მ. ; ხელშეკრულების მე-19 მუხლის 1-ლი ნაწილის ,,ა" და ,,ბ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების პირობით;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი **05/07/2018**	**უძრავი ქონების ნასყიდობისა და წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულება , დამოწმების თარიღი:02/07/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ,**

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018535278 თარიღი 19/06/2018 14:28:11	**მეორე მხარე**: **კახა ხიზანეიშვილი**P/N: 01015008247; **პირველი მხარე**: **შპს "ისანი"** 406209954; საგანი:პირველი მხარე, მიწის ნაკვეთზე აშენებული მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართიდან მეორე მხარეს (მის უფლებამონაცვლ(ეებ)ეს ან მის მიერ კანონით დადგენილი წესით უფლებამოსილ პირს) საკუთრებაში გადასცემს, N4 კორპუსში 50კვ.მ.-ის არასაცხოვრებელ ფართს პირველ სართულზე, ნავთლუღის ქუჩის მხარეს და 275კვ.მ.-ს საცხოვრებელ ფართს ამავე კორპუსში მეორე და ბოლო სართულებზე, ნავთლუღის, ჭრელაშვილის ქუჩებისა და ეზოს შესაბამისი ხედებით, თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში, ორი მიწისქვეშა ავტოსადგომით.;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 25/06/2018	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018522800 თარიღი 15/06/2018 12:00:47	**მეორე მხარე**: **შპს "ისანი"** 406209954; **პირველი მხარე**: **ალექსანდრე დიღმელაშვილი** P/N: 01029002563; მეორე მხარე პირველ მხარეს საკუთრებაში გადასცემს მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის საერთოსაცხოვრებელი ფართიდან 280 კვ.მ-ს, საშუალო ევრო რემონტით და 2 ავტოფარეხს. ;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 21/06/2018	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი15/06/2018, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018533995 თარიღი 19/06/2018 12:23:08	**მეორე მხარე**: **შპს "ისანი"** 406209954; **პირველი მხარე**: **ლალი ორდენიძე** P/N: 01011055963; 1. მეორე მხარე პირველ მხარეს საკუთრებაში გადასცემს მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის საერთო ფართიდან 145 კვ.მ-ს, თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში და 1 ავტოფარეხს. 2. ვალდებულების შესრულებამდე მეორე მხარეს აეკრძალოს მიწის ნაკვეთის გასხვისება ან უფლებრივად დატვირთვა. აღნიშნული აკრძალვა არ ვრცელდება ინვესტორის მიერ აშენებული მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის სხვა ფართების განკარგვაზე და უფლებრივად დატვირთვაზე.;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 22/06/2018	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:19/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018540939 თარიღი 20/06/2018 14:35:42	**მეორე მხარე**: **შპს "ისანი"** 406209954; **პირველი მხარე**: **ალექსანდრე დიღმელაშვილი** P/N: 01029002563; საგანი:მეორე მხარე პირველ მხარეს საკუთრებაში გადასცემს მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის საერთო საცხოვრებელი ფართიდან 100 (ასი) კვ.მ-ს თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში.;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 26/06/2018	**ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , გაფორმების თარიღი:20/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ,**
განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018566009 თარიღი 27/06/2018 09:32:08	**მეორე მხარე**: **შპს "ისანი"** 406209954; **პირველი მხარე**: **მაკა კობახიძე**P/N: 38001031423; 1. ,,მეორე მხარე" მიწის ნაკვეთზე აშენებული მრავლფუნქციური შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართიდან "პირველ მხარეს" საკუთრებაში გადასცემს მრავალფუნქციური შენობანაგებობის საცხოვრებელი ფართიდან 200 (ორასი) კვ.-მ-ს, სახელდობრ 80 (ოთხმოცი) კვ.მ-ს, და 2(ორი) 60-60 (სამოც-სამოცი) კვ.მ ფართს. ასევე კომერციულ ფართს 30 კვ.მ. 2. შპს "ისანი-ს" აეკრძალოს მიწის ნაკვეთის გასხვისება ან უფლებრივად დატვირთვა, აღნიშნული აკრძალვა არ ვრცელდება ინვესტორის მიერ აშენებული მრავალფუნქციური შენობანაგებობის სხვა ფართების განკარგვაზე ან უფლებრივად დატვირთვაზე.;;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 03/07/2018	

ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ, დამოწმების თარიღი27/06/2018, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018522831 თარიღი 15/06/2018 12:04:32

მეორე მხარე: **შპს "ისანი"** 406209954;
პირველი მხარე: **მიხეილ მჭედლიშვილი** P/N: 01011059333;
საგანი:დაზუსტებული ფართობი: 25.00 კვ.მ.დან მიხეილ მჭედლიშვილის პ/ნ 01011059333 კუთვნილი წილი ;
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების პირობით ;

უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 29/06/2018

ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ, დამოწმების თარიღი25/06/2018, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018534023 თარიღი 19/06/2018 12:25:22

მეორე მხარე: **შპს "ისანი"** 406209954;
პირველი მხარე: **ლალი ორდენიძე** P/N: 01011055963;
1." მეორე მხარე" მიწის ნაკვეთზე აშენებული მრავლფუნქიური შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართიდან "პირველ მხარეს" საკუთრებაში გადასცემს მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის საცხოვრებელი ფართიდან 145 (ას ორმოცდახუთ) კვ.მ-ს თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში და 1 (ერთ) ცალ ავტოფარეხს. 2. შპს "ისანი-ს" აეკრძალოს მიწის ნაკვეთის გასხვისება ან უფლებრივად დატვირთვა, აღნიშნული აკრძალვა არ ვრცელდება ინვესტორის მიერ აშენებული მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის სხვა ფართების განკარგვაზე ან უფლებრივად დატვირთვაზე.;

უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 29/06/2018

ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ, დამოწმების თარიღი25/06/2018, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 892018566016 თარიღი 27/06/2018 09:33:54

მეორე მხარე: **შპს "ისანი"** 406209954;
პირველი მხარე: **მაკა კობახიძე**P/N: 38001031423;
საგანი:დაზუსტებული ფართობი: 25.00 კვ.მ-დან, მაკა კობახიძის ,P/N: 38001031423 კუთვნილი წილი.;
1. ,,მეორე მხარე" მიწის ნაკვეთზე აშენებული მრავლფუნქციური შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართიდან "პირველ მხარეს" საკუთრებაში გადასცემს მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის საცხოვრებელი ფართიდან 200 (ორასი) კვ.-მ-ს, სახელდობრ 80 (ოთხმოცი) კვ.მ-ს, და 2(ორი) 60-60 (სამოც-სამოცი) კვ.მ ფართს. ასევე კომერციულ ფართს 30 კვ.მ. 2. შპს "ისანი-ს" აეკრძალოს მიწის ნაკვეთის გასხვისება ან უფლებრივად დატვირთვა, აღნიშნული აკრძალვა არ ვრცელდება ინვესტორის მიერ აშენებული მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის სხვა ფართების განკარგვაზე ან უფლებრივად დატვირთვაზე.;

ხელშეკრულება სანაცვლო შესრულების პირობით საკუთრების გადაცემის შესახებ , დამოწმების თარიღი:27/06/2018 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ,

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის


მოვალეთა რეესტრი:


რეგისტრირებული არ არის

"ფიზიკური პირის მიერ 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული მატერიალური აქტივის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების საჩუქრად მიღებისას საშემოსავლო გადასახადი გადახდას ექვემდებარება საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, რის შესახებაც აღნიშნული ფიზიკური პირი იმავე ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევას, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XVIII თავის მიხედვით."

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ–გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge


მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიული ასომვითი ნახაზი

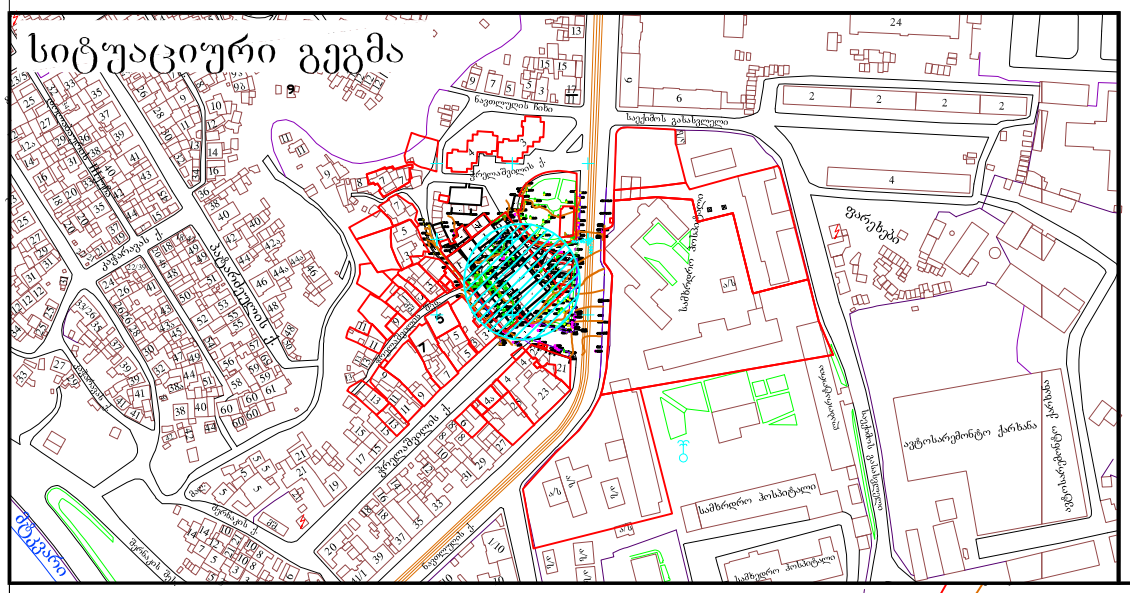

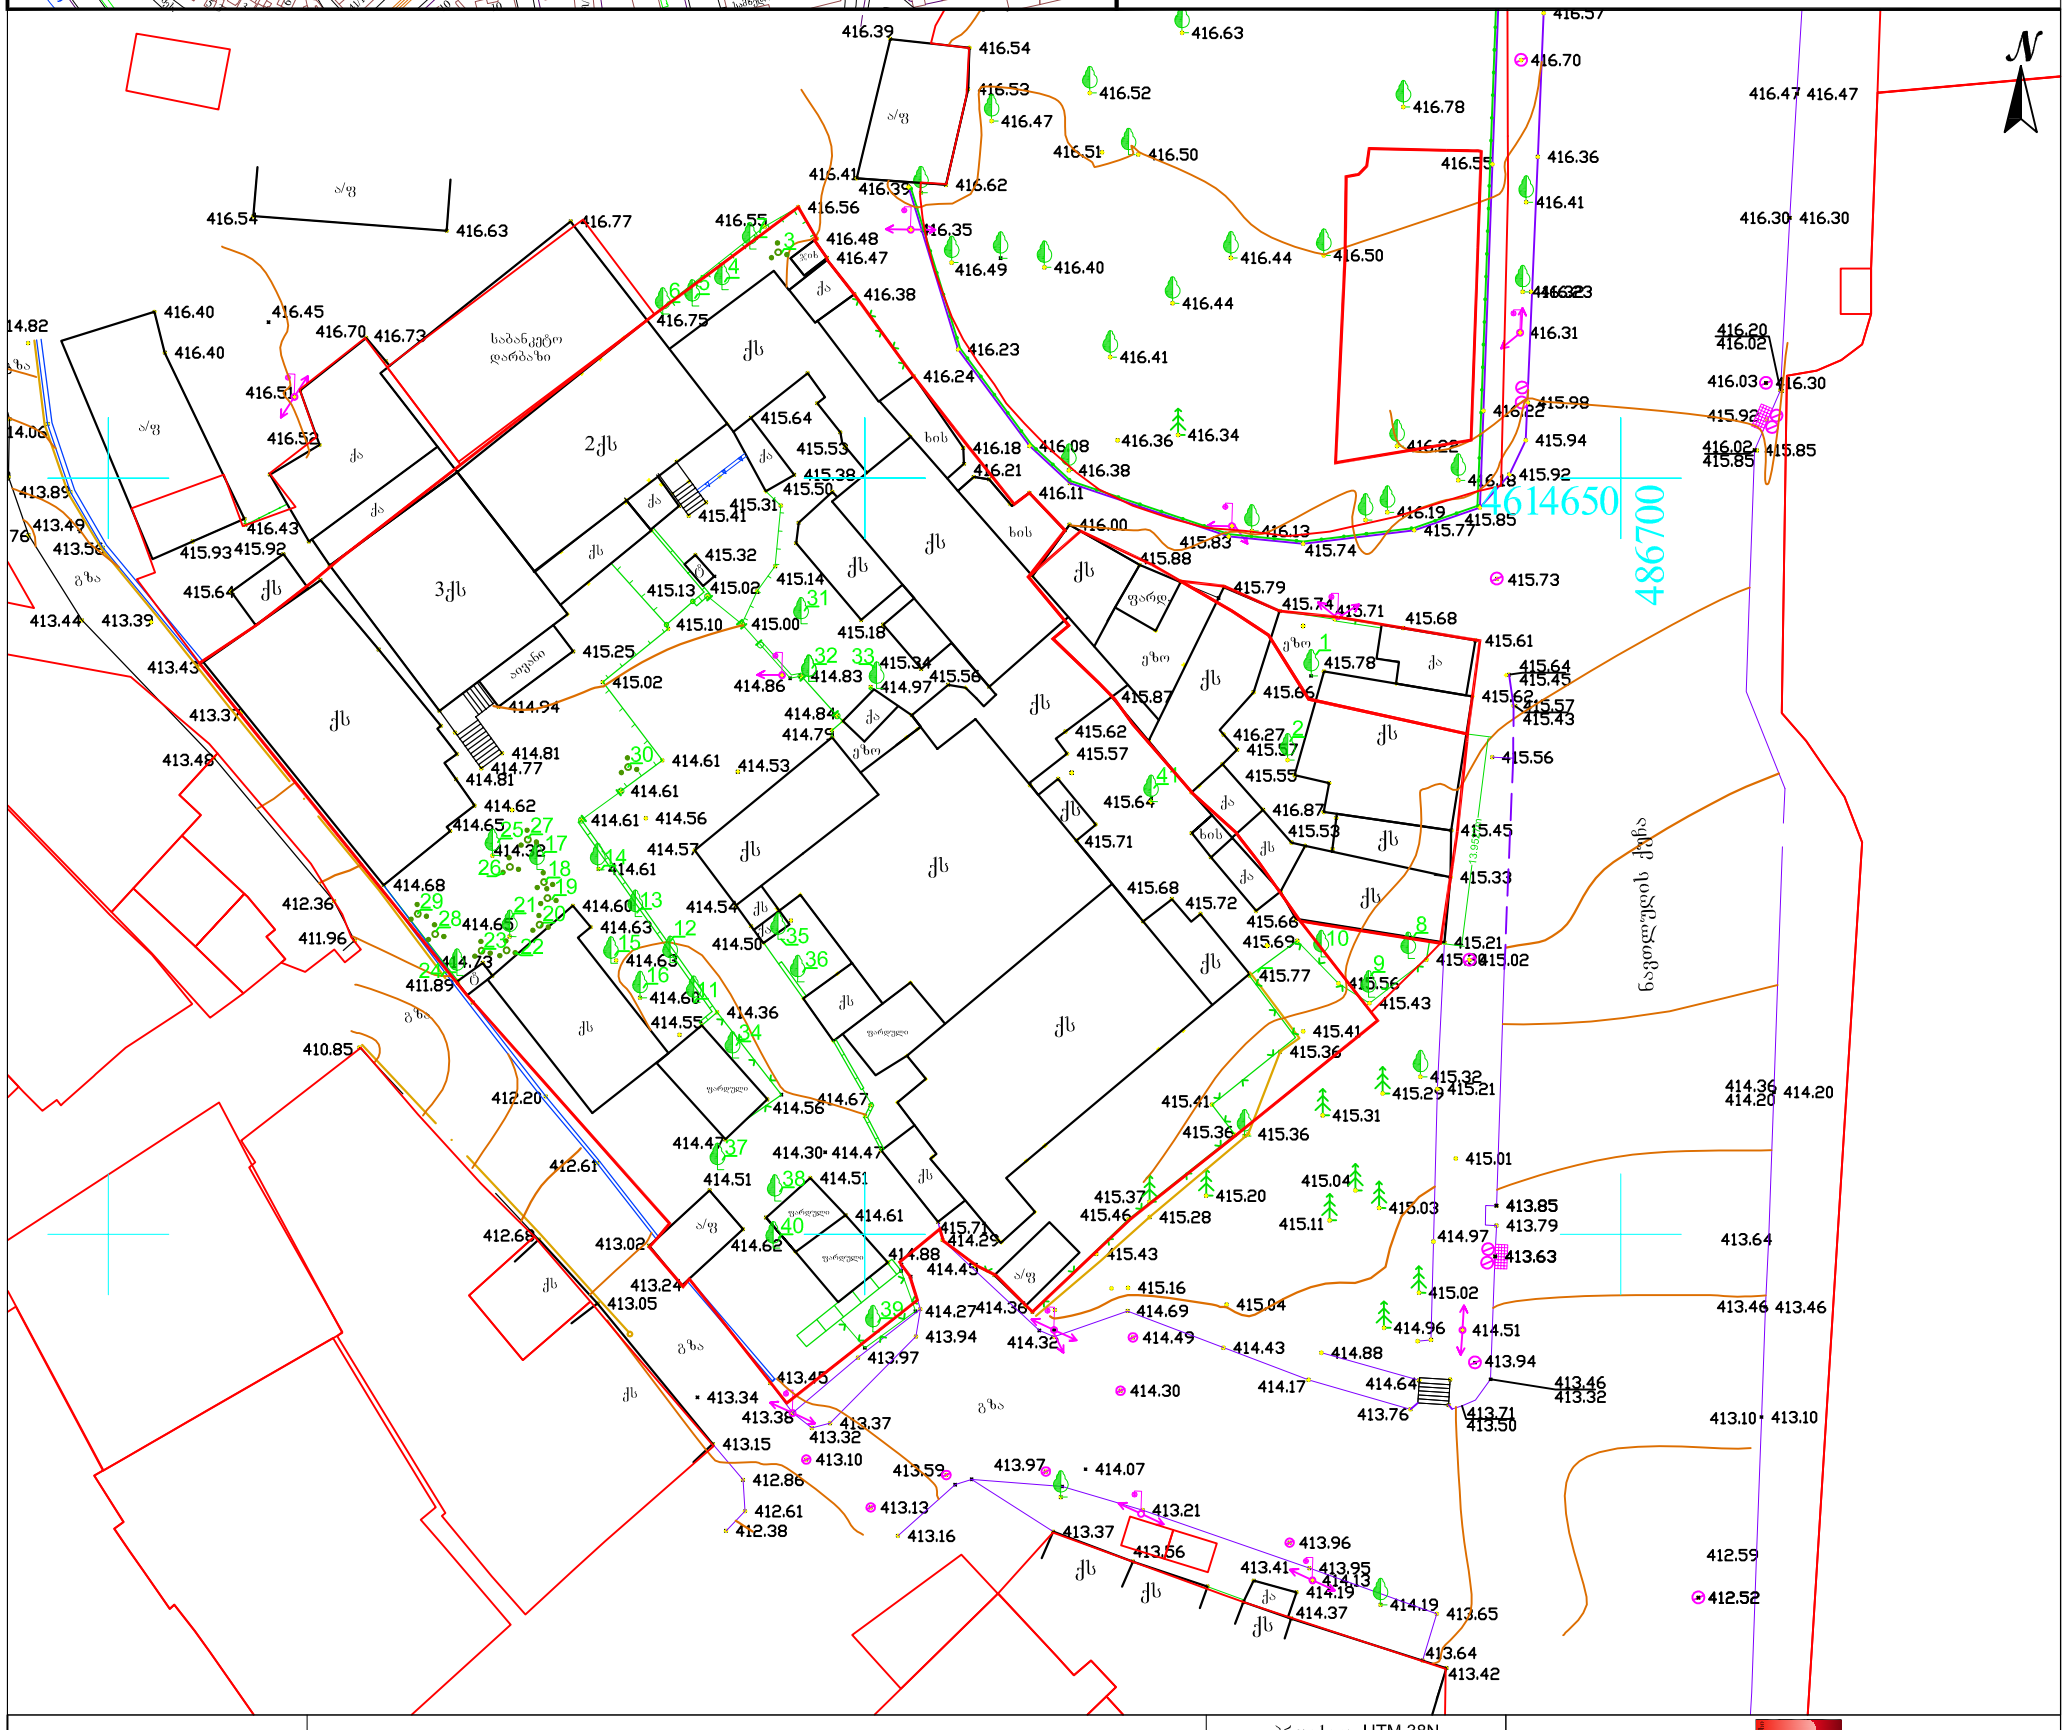

პირობითი აღნიშვნები	შენიშვნა: მიწის სამუშაოები შეათანხმეთ შესაბამის კომუნიკაციის წარმომადგენლებთან			პროექცია UTM 38N საკოორდინატო სისტემა WGS 84	შპს „პრივატტექსერვისი" ქ. თბილისი, სანაპიროს ქუჩა №1 Ltd "PRIVATTEKSERVISI" მობ: +995 514-44-11-41. მობ: +995 557-51-51-15		
მიწისქვეშა კომუნიკაციები	ნაკვეთის საზღვარი	ბუჩქი	ცოცხალი ღობე	ღობე	დირექტორი		ზ. წიკლაური
კანალიზაცია	შენობა	გაზონი	ხეების რიგი	მრავალწახნაგა	მთავ. უზრუნველყოფა		მ. ცინცაძე
დენის კაბელი	არკა	სამეთვალყურეო ჭები	ტრანსფორმატორი	ბეტონის	აზომა		ლ. ჩიტაიშვილი
გაზის მილი	ფარდული	ძეგლი	რადიო ან ტელე ანძა	კიბეები	მისამართი	ქალაქი თბილისი, ჭრელაშვილის ქუჩა №1	
წყლის მილი	კიბე	შადრევანი	ლამპიონები	საწრდენი კაბელი		მაშტაბი 1:500	10.07.2018
კავშირგაბმულობა	ფოთლოვანი ხე	ონკანი	ელექტრო ბოძი	ღობე			
	წიწვოვანი ხე	წყარო ან ჭა	რკინიგზა	გზის კონტური			
	ხეხილის ხე	ბენზინგასამართი სადგური	იზოჰიფსი	ფლატე			
	პალმა	მაღალი ძაბვის გადამცემი	მთავარი იზოჰიფსი	წყლის კონტური			

შენობა №1/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

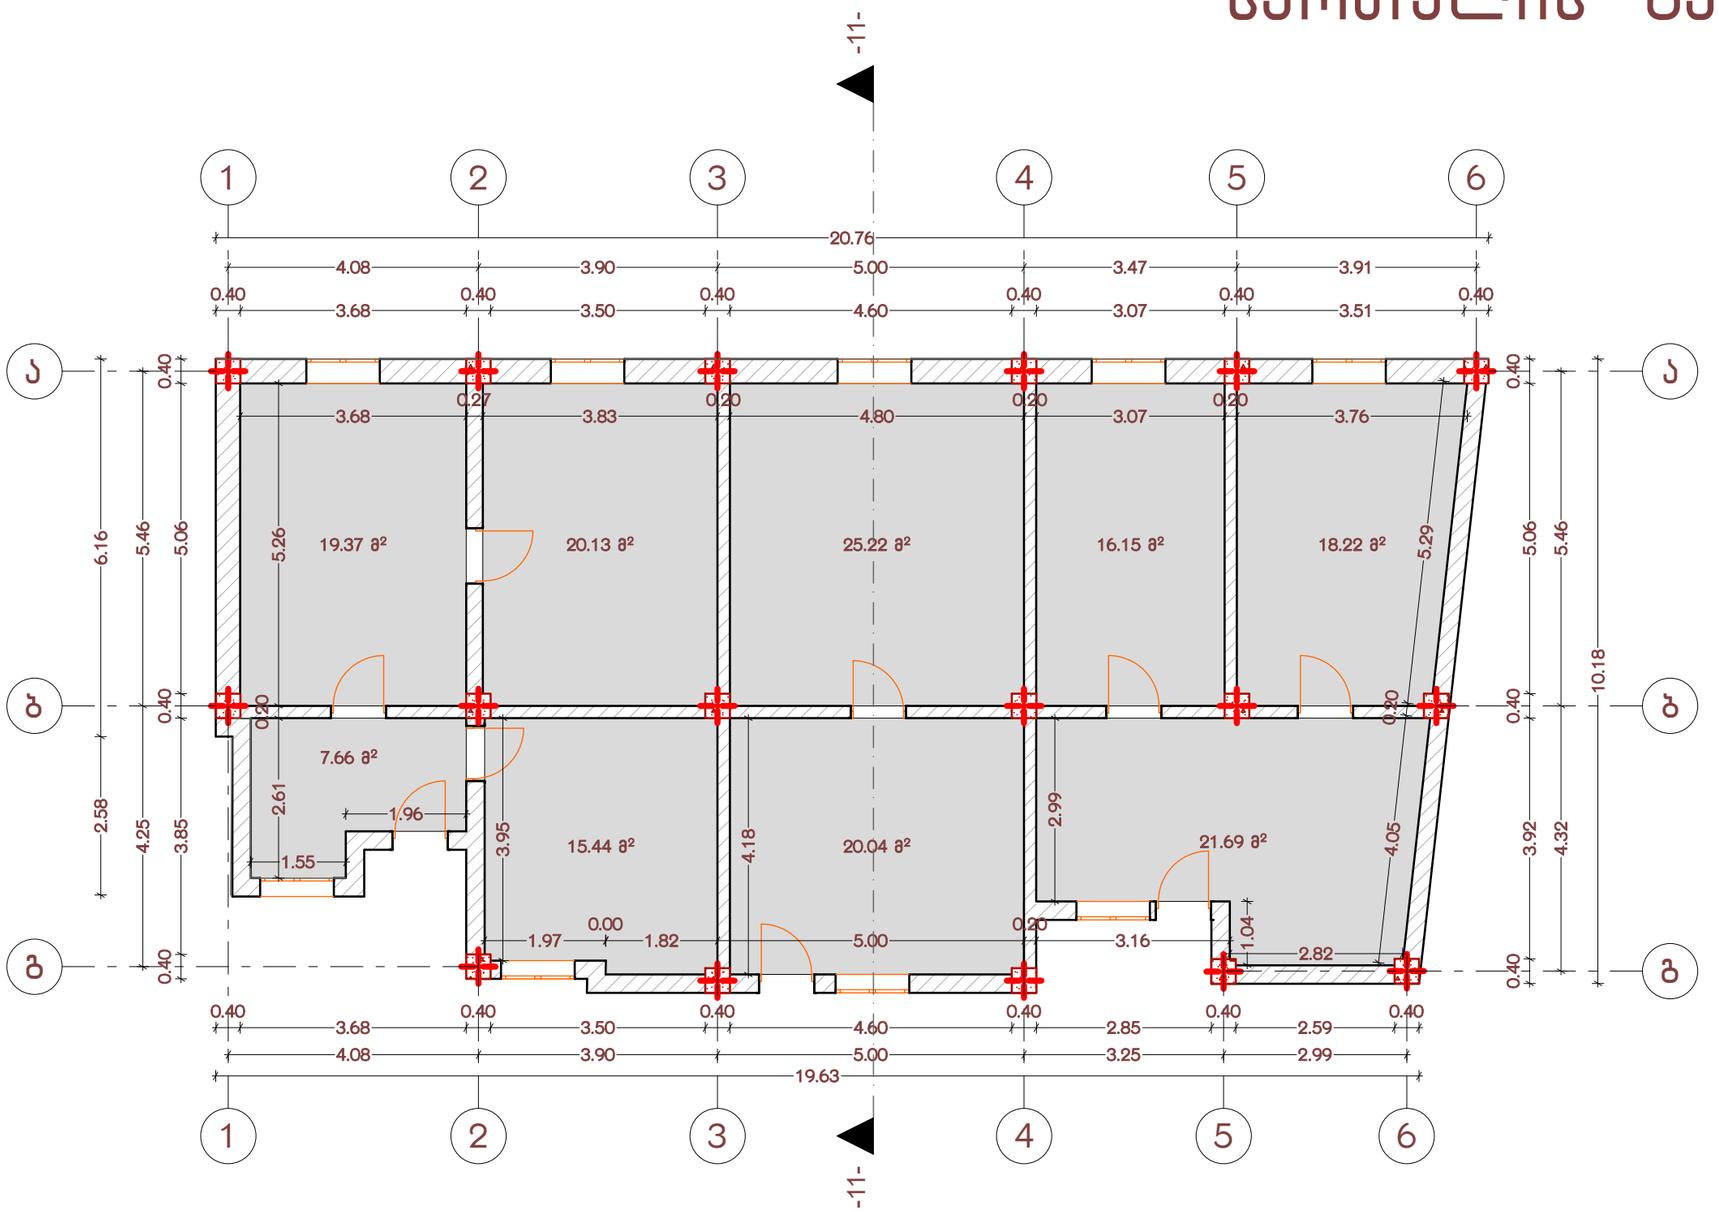

შენობა №1/1
საერთო ფართი 163.95 მ²


შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 1/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №1/1
ფასადი „1-6“ ღ-ში მ. 1:100




შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 1/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომგაძე	ფასადი „1-6“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №1/1
ფასადი „6-1“ ღ-ში მ. 1:100

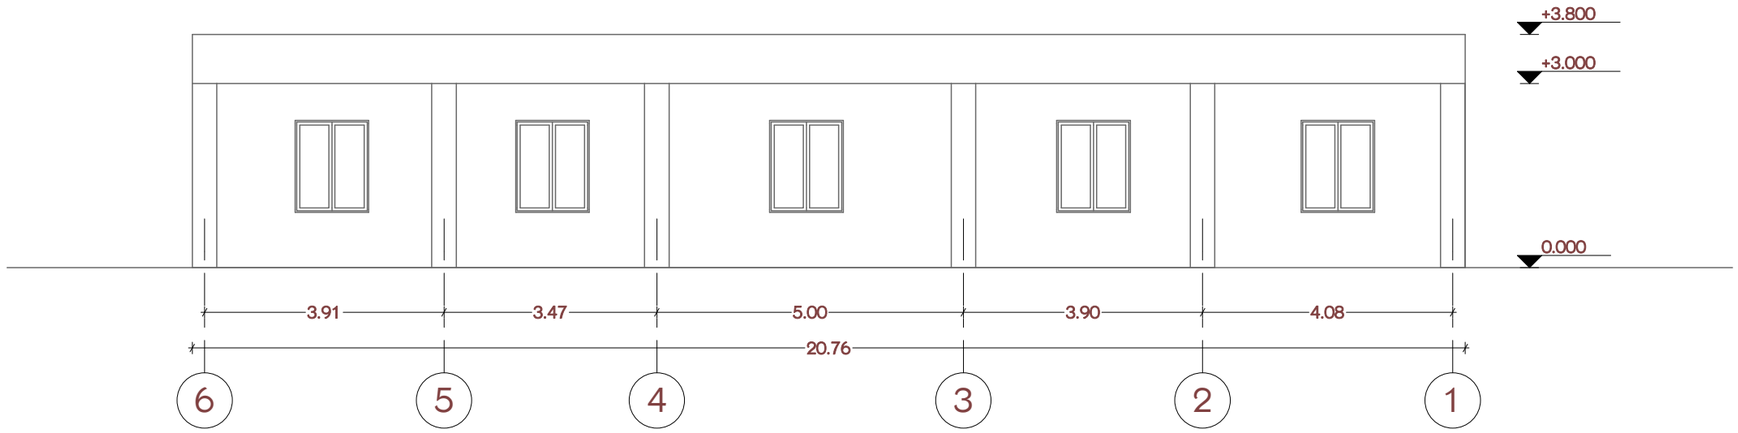


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 1/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „6-1“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №1/1
ჭრილი „11-11“ მ. 1:100

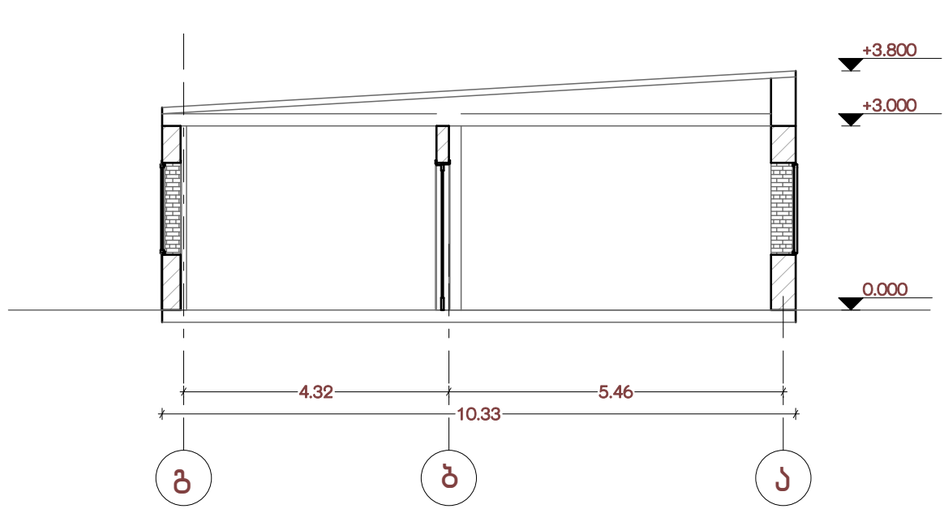

შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 1/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ჭრილი „11-11“			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №2/3
სარდაფის გეგმა მ. 1:100

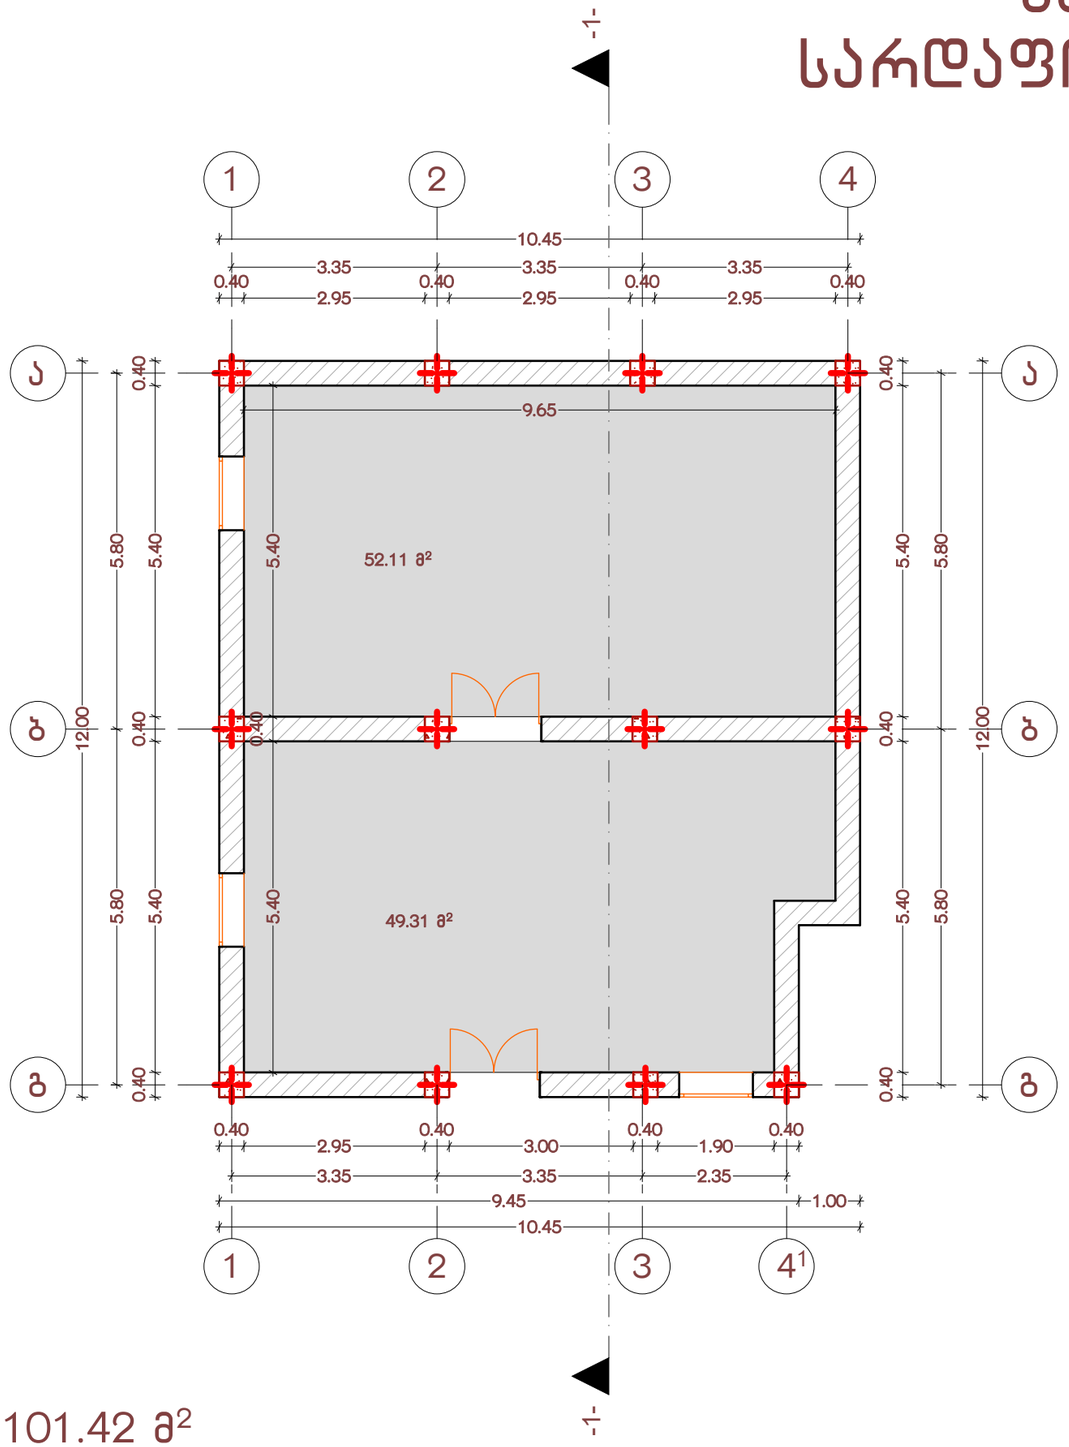

შენობა №2/3
საერთო ფართი 392.59 მ²
აქედან: სარდაფის ფართი – 101.42 მ²
I სართულის ფართი – 98.91 მ²
II სართულის ფართი – 86.86 მ²
მანსარდის ფართი – 105.40 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 2/3 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	სარდაფის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №2/3
I სართულის გეგმა მ. 1:100

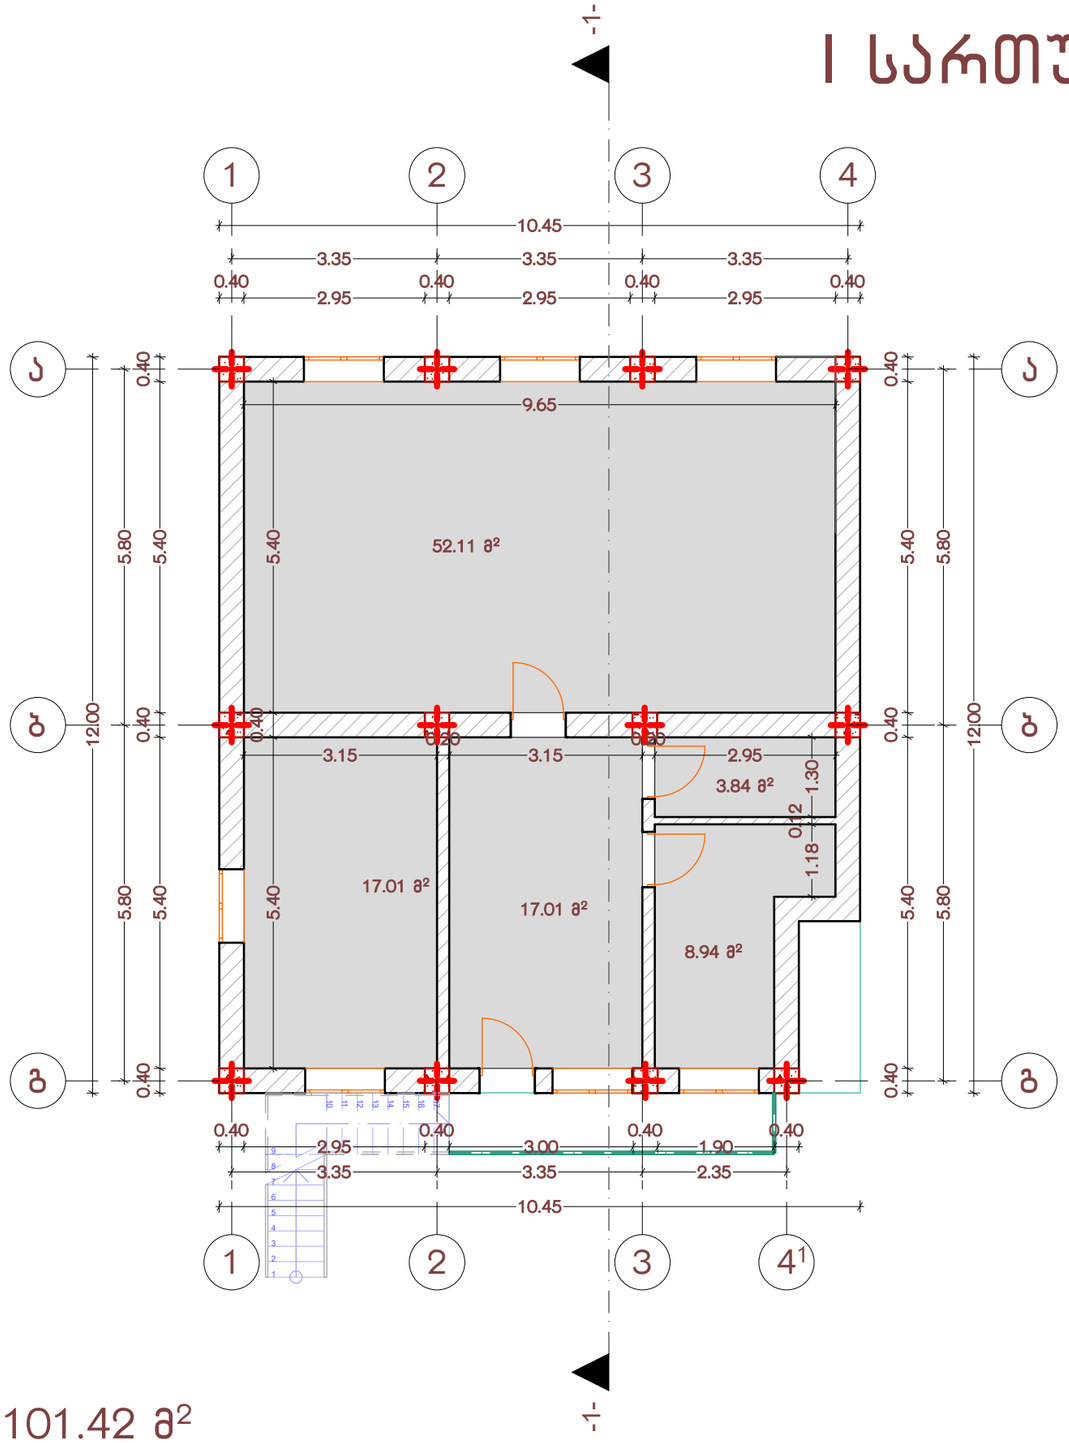

შენობა №2/3
საერთო ფართი 392.59 მ²
აქედან: სარდაფის ფართი – 101.42 მ²
I სართულის ფართი – 98.91 მ²
II სართულის ფართი – 86.86 მ²
მანსარდის ფართი – 105.40 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 2/3 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	I სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №2/3
II სართულის გეგმა მ. 1:100

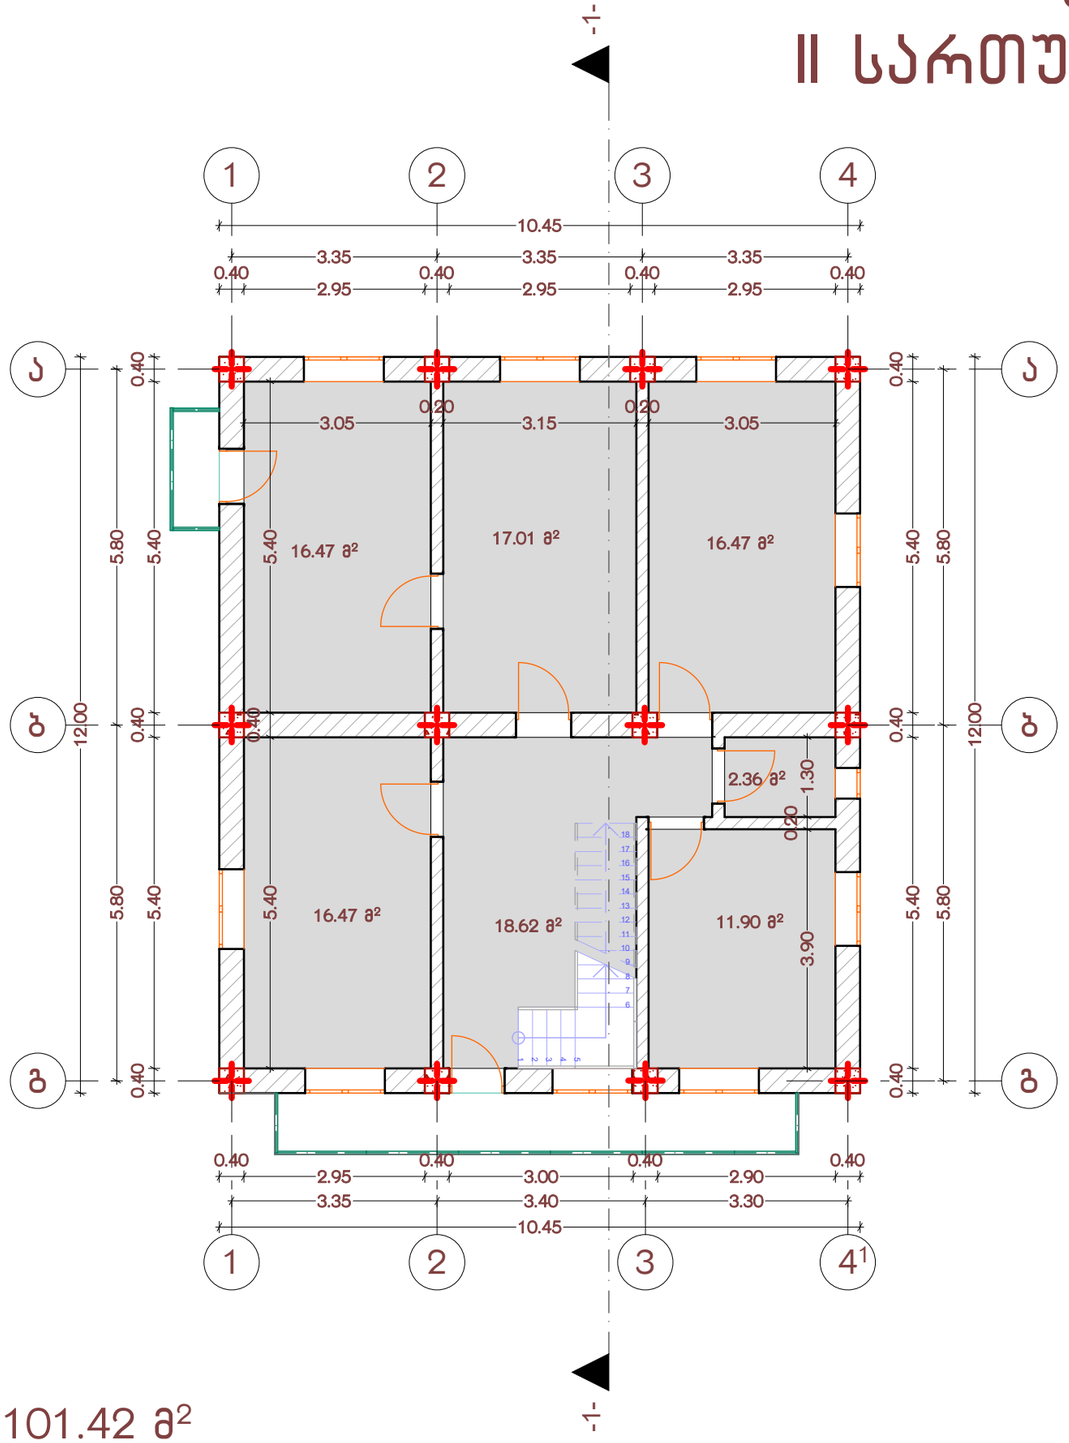

შენობა №2/3
საერთო ფართი 392.59 მ²
აქედან: სარდაფის ფართი – 101.42 მ²
I სართულის ფართი – 98.91 მ²
II სართულის ფართი – 86.86 მ²
მანსარდის ფართი – 105.40 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 2/3 აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომაძე	II სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №2/3
მანსარდის გეგმა მ. 1:100

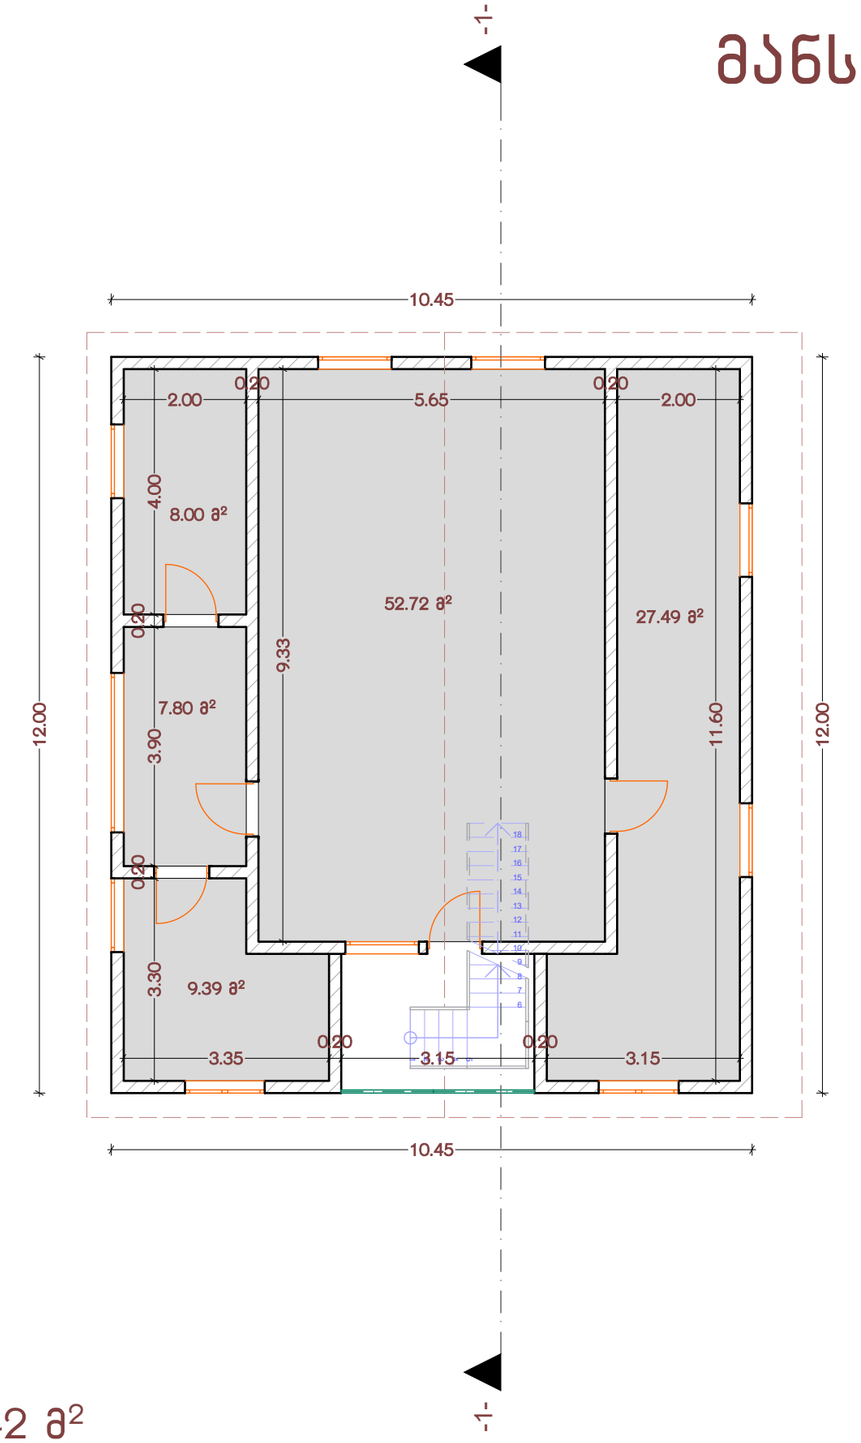

შენობა №2/3
საერთო ფართი 392.59 მ²
აქედან: სარდაფის ფართი – 101.42 მ²
I სართულის ფართი – 98.91 მ²
II სართულის ფართი – 86.86 მ²
მანსარდის ფართი – 105.40 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 2/3 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	მანსარდის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №3/2
I სართულის გეგმა მ. 1:100

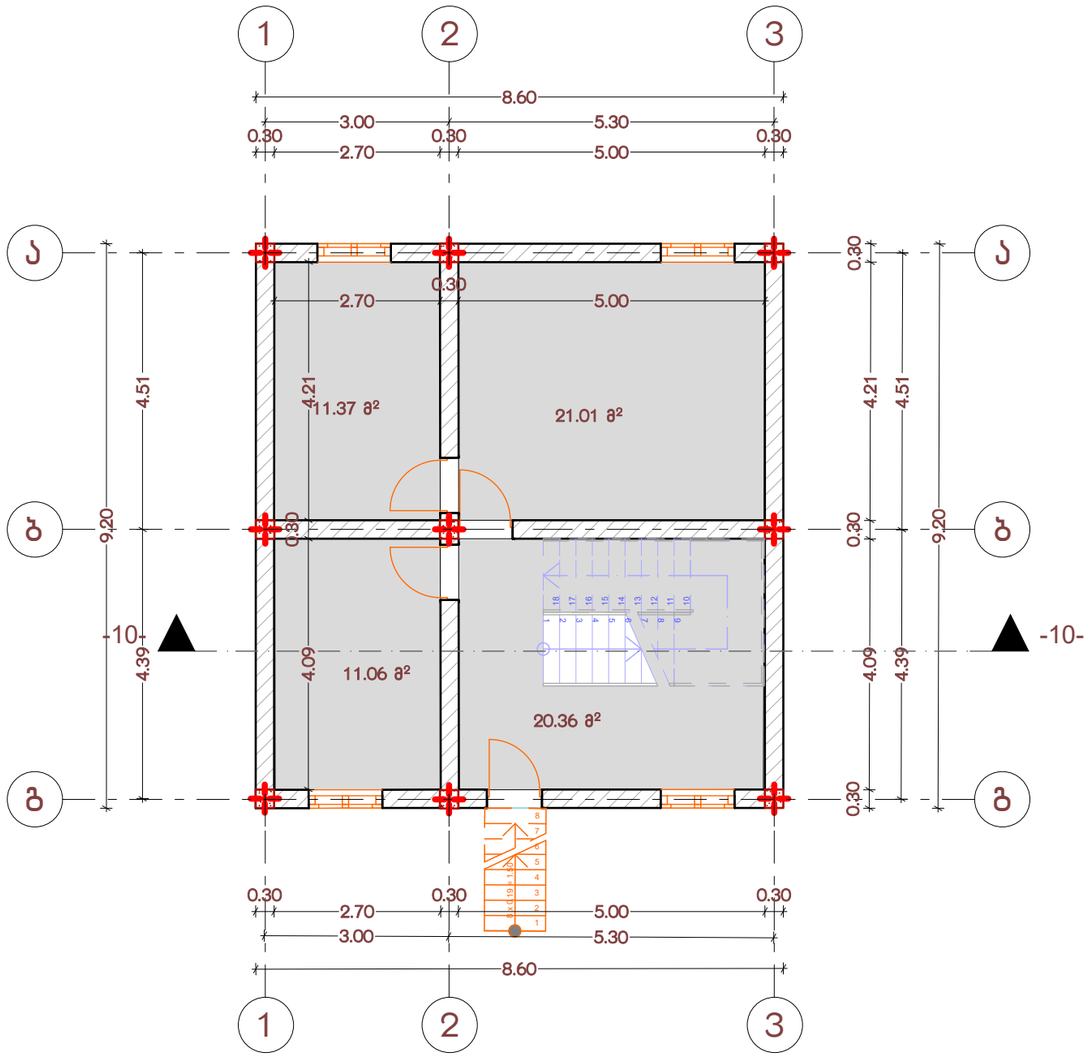

შენობა №3/2
საერთო ფართი 118.96 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 3/2 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	I სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №3/2
II სართულის გეგმა მ. 1:100

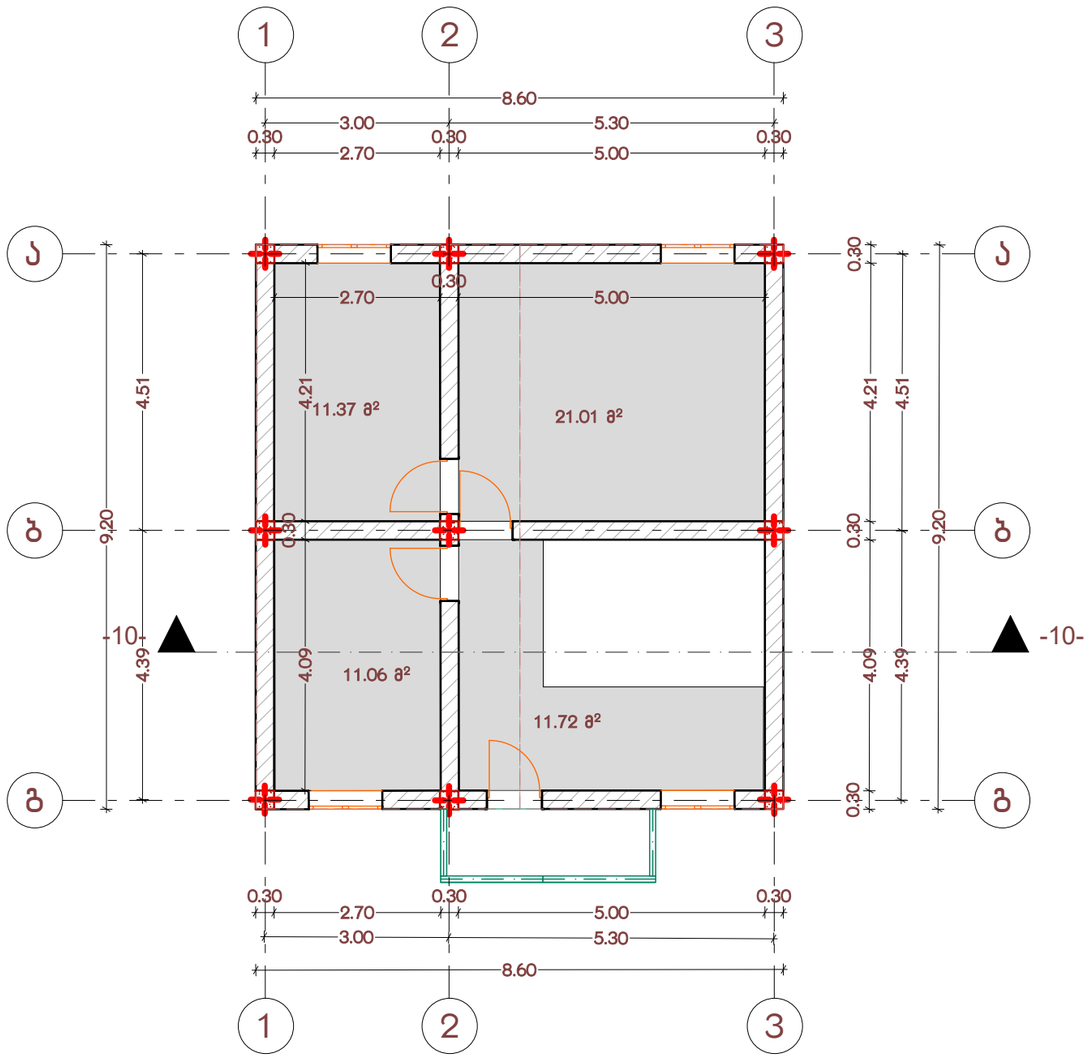

შენობა №3/2
საერთო ფართი 118.96 მ²


შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 3/2 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	II სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №3/2
ფასადი „1-3“ ღ-ში მ. 1:100




შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 3/2 აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „1-3“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №3/2
ფასადი „1-3“ ღ-ში მ. 1:100

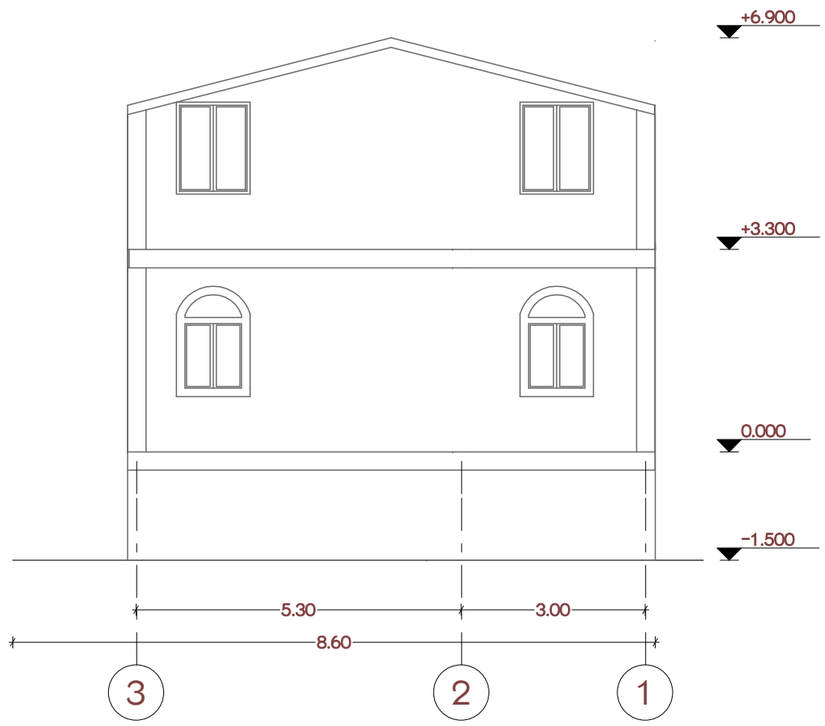


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 3/2 აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „1-3“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №3/2
ჭრილი „10-10“ მ. 1:100

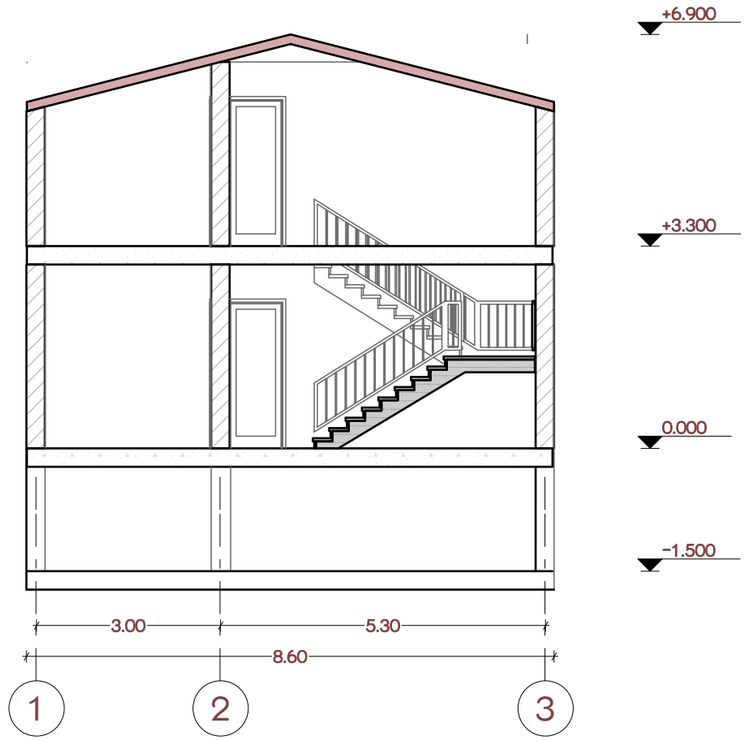

შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 3/2 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ჭრილი „10-10“			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №4/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

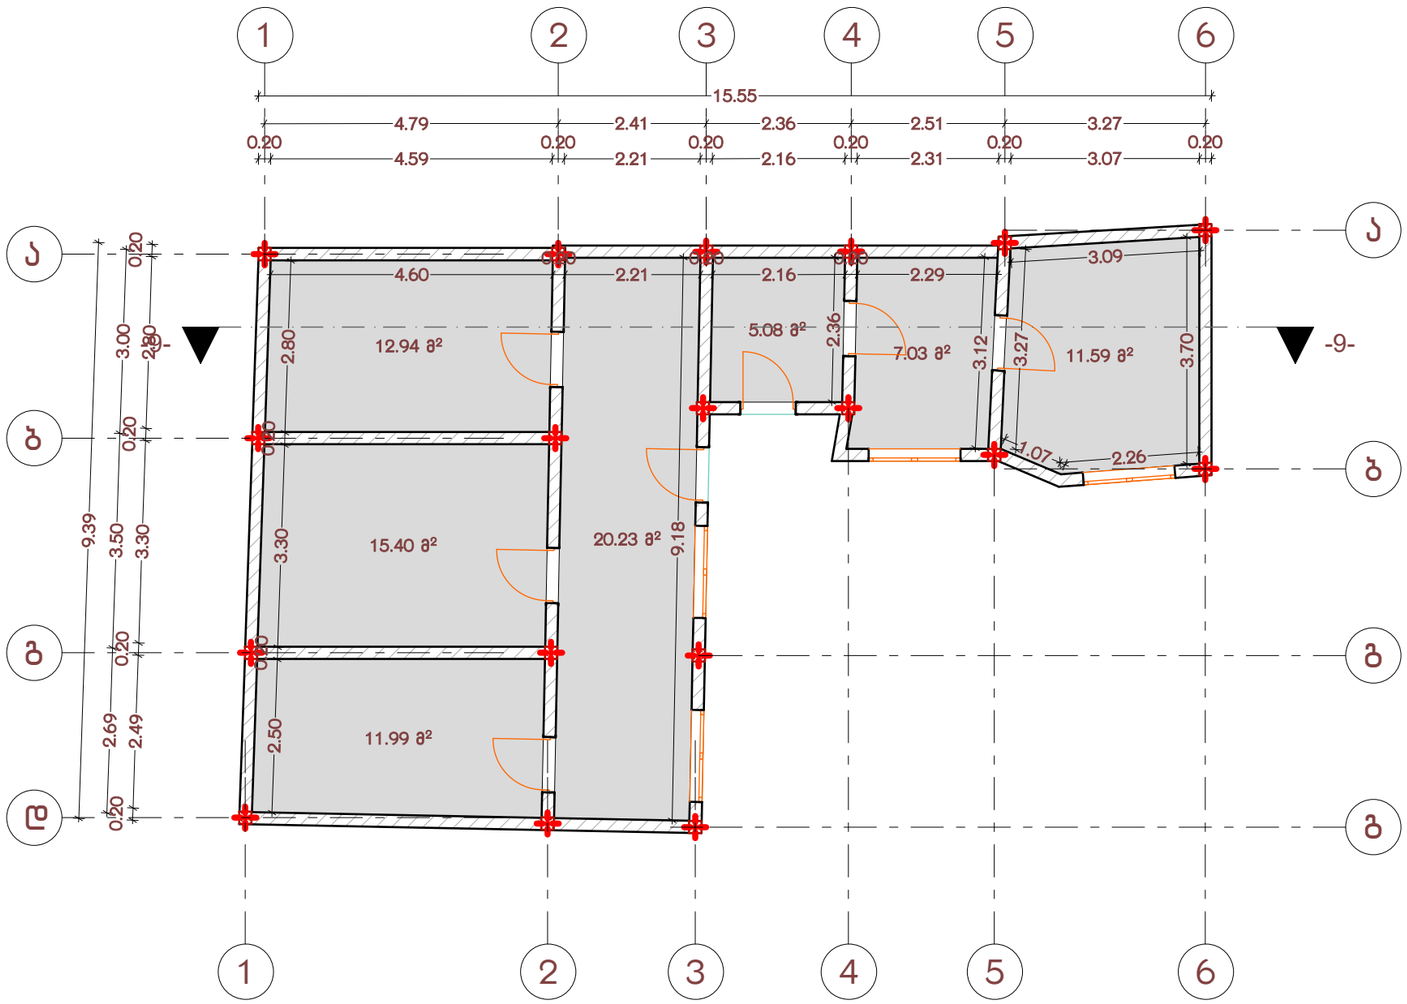

შენობა №4/1
საერთო ფართი 84.26 მ²


შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 19/1 აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №4/1
ფასადი „1-6“ ღ-ში მ. 1:100

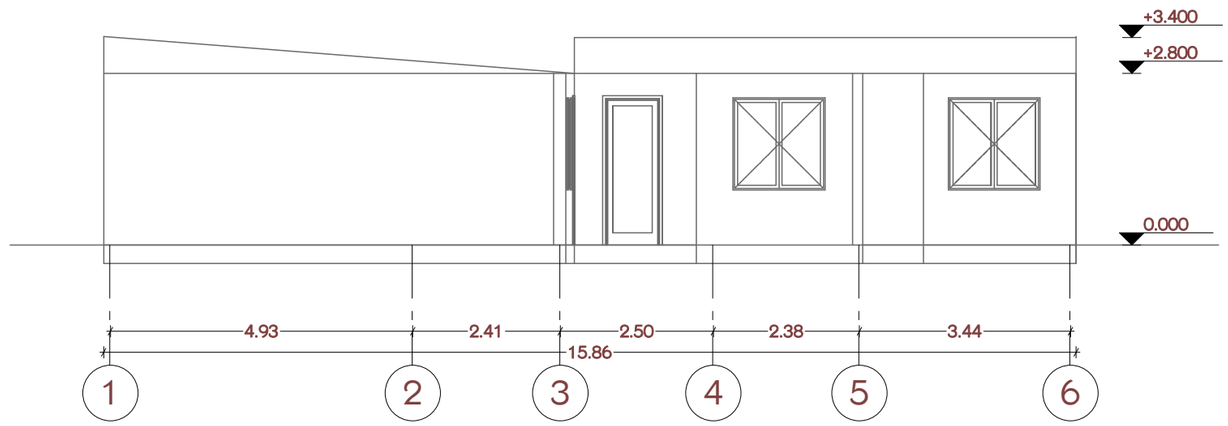


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 4/1 აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „1-6“ ღ-ში			
ღამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №4/1
ფასადი „ა-დ“ ღ-ში მ. 1:100

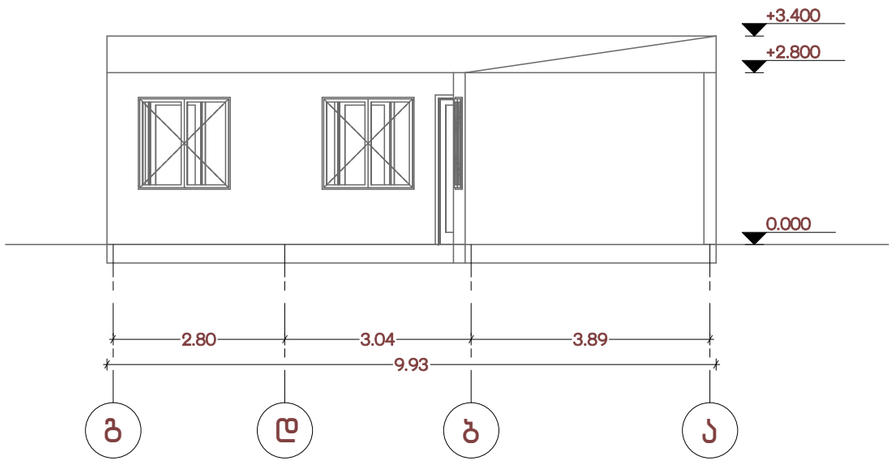


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 4/1 აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „ა-დ“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №4/1
ჭრილი „9-9“ მ. 1:100

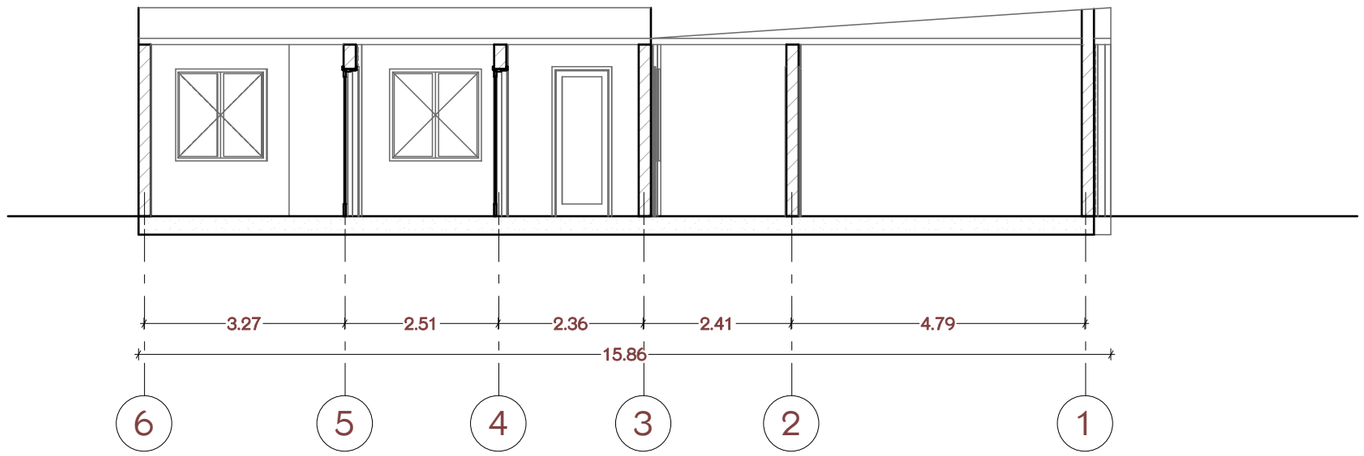

შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 4/1 აზომვითი ნახაზი			
შესასრულა		ე.ლომაძე	ჭრილი „9-9“			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №5/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

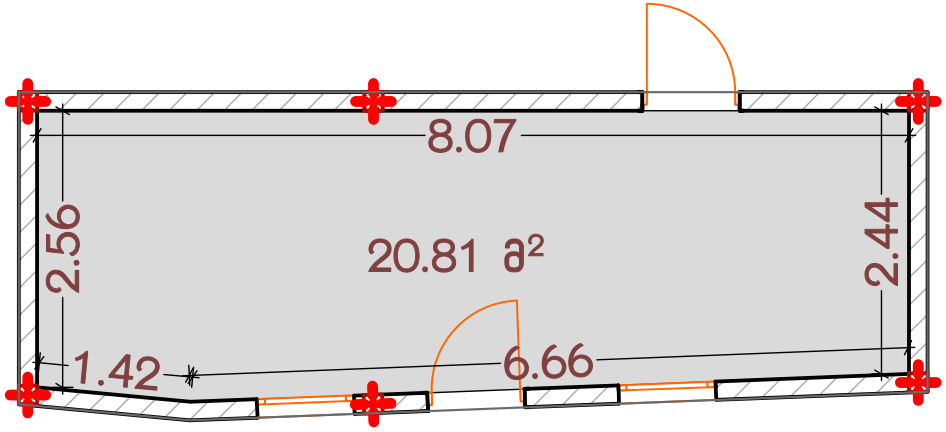

შენობა №5/1
საერთო ფართი 20.81 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 5/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №6/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

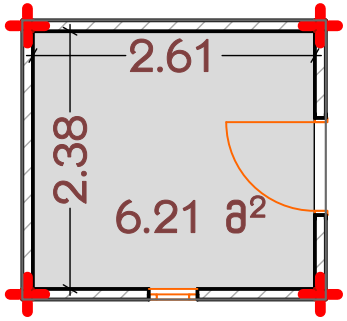

შენობა №6/1
საერთო ფართი 6.21 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 6/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №7/1
სართულის გეგმა მ. 1:100



შენობა №7/1
საერთო ფართი 1.85 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 7/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომჯაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №8/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

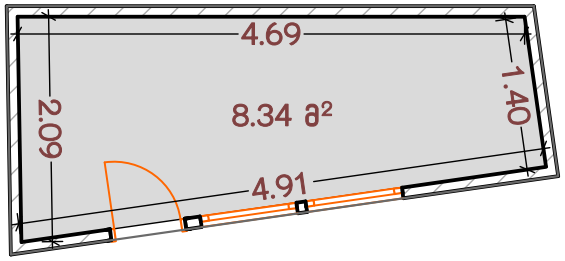

შენობა №8/1
საერთო ფართი 8.34 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 8/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №9/1
სართულის გეგმა მ. 1:100



შენობა №9/1
საერთო ფართი 4.14 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 9/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომჯაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №10/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

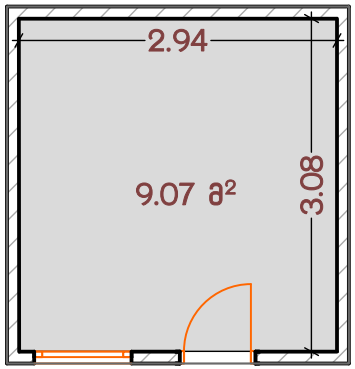

შენობა №10/1
საერთო ფართი 9.07 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 10/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №11/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

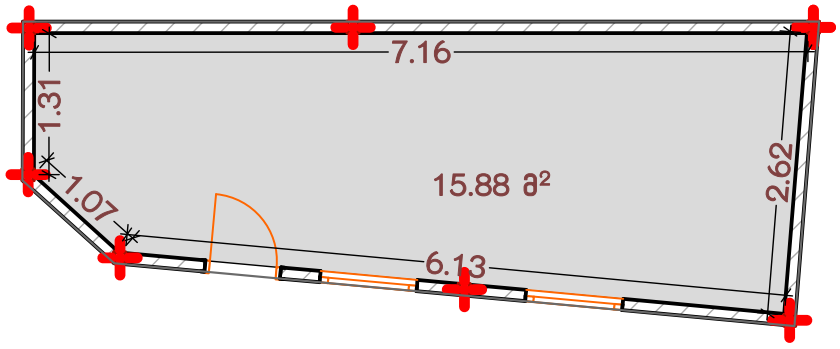

შენობა №11/1
საერთო ფართი 15,88 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუარია	შენობა 11/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №12/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

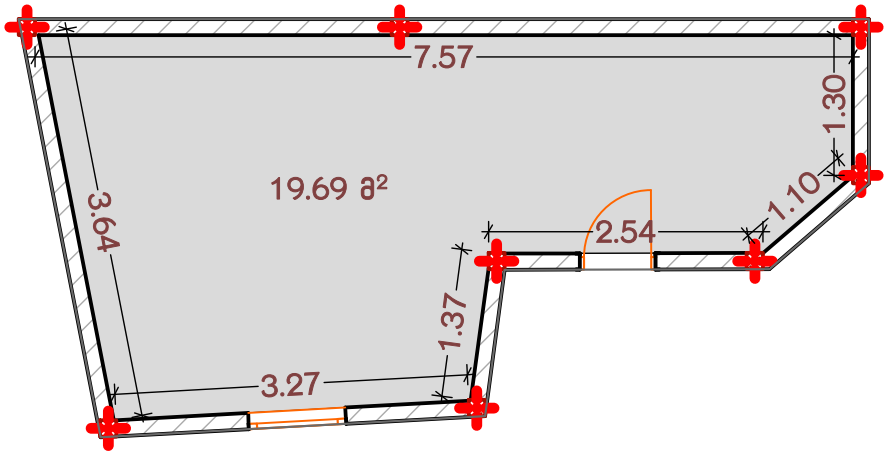

შენობა №12/1
საერთო ფართი 19.69 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 12/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომჯაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №13/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

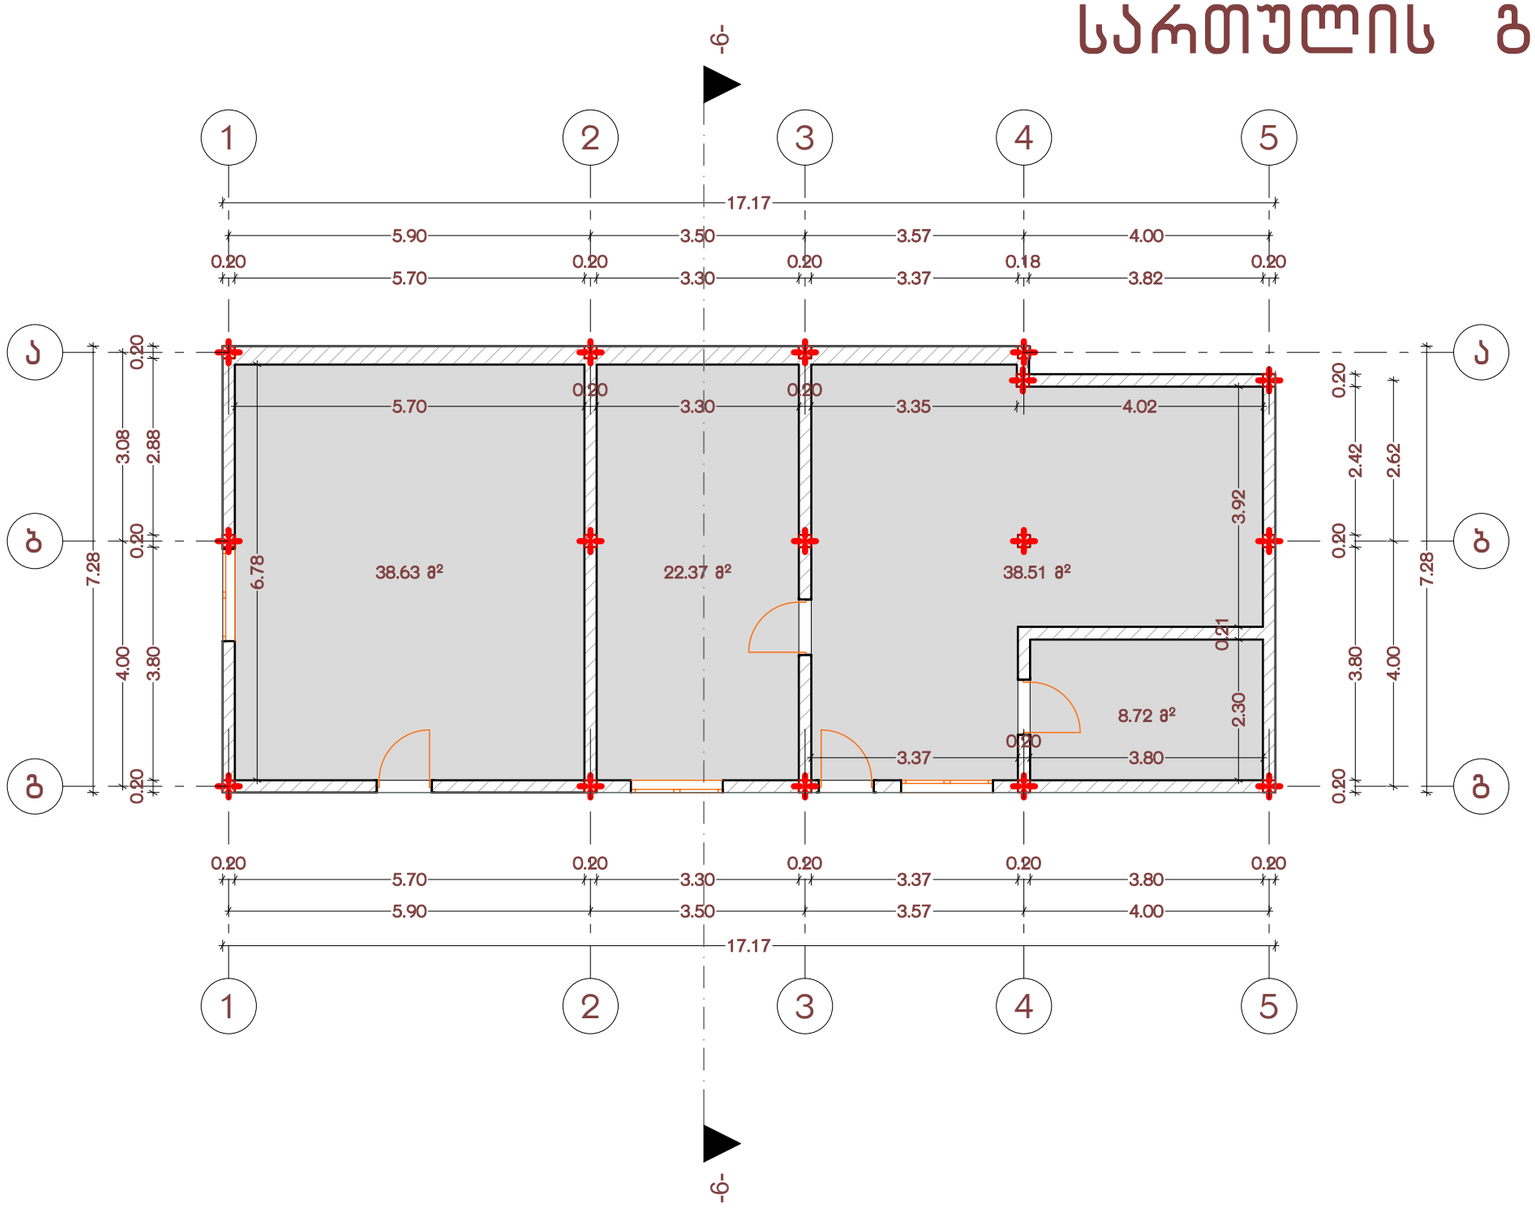

შენობა №13/1
საერთო ფართი 108.23 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 13/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №13/1
ფასადი „ა-გ“ ღ-ში მ. 1:100

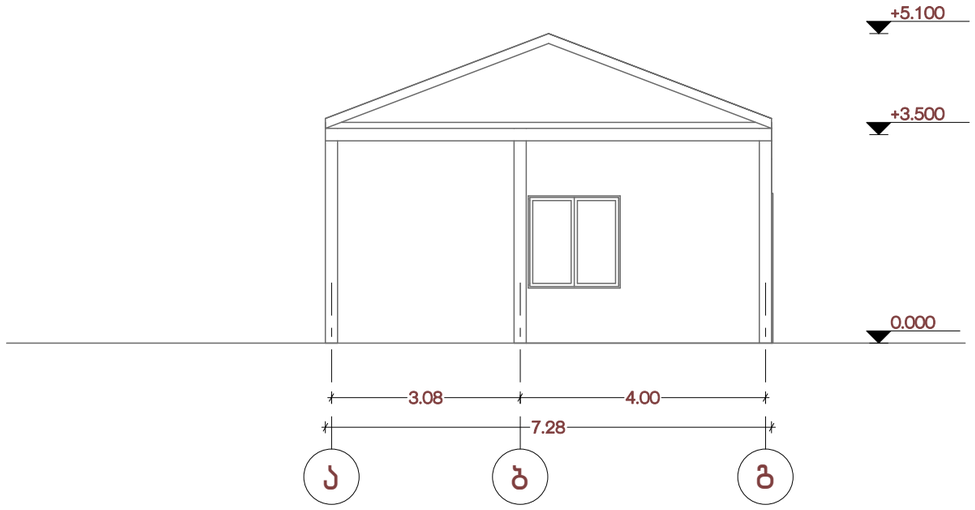


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 13/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „ა-გ“ ღ-ში			
ღამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №13/1
ფასადი „1-5“ ღ-ში მ. 1:100




შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 13/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „1-5“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №13/1
ჭრილი „6-6“ ღ-ში მ. 1:100

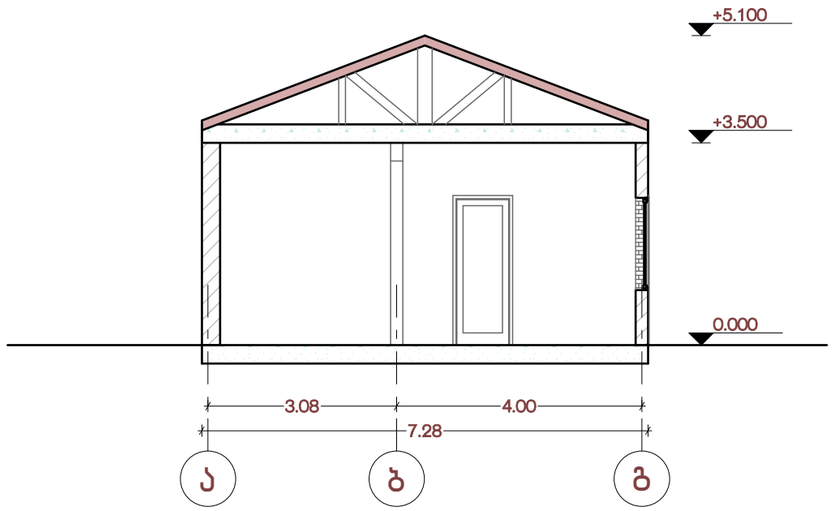

შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 13/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ჭრილი „6-6“			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №14/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

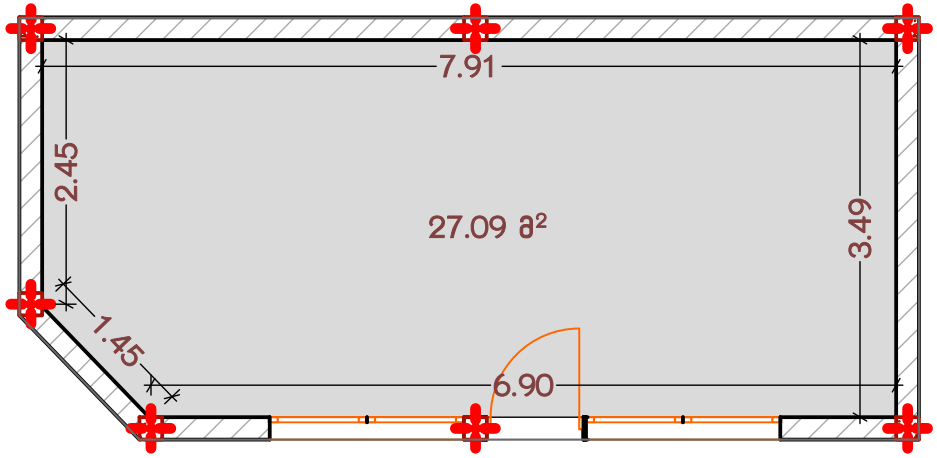

შენობა №14/1
საერთო ფართი 27.09 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 14/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №15/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

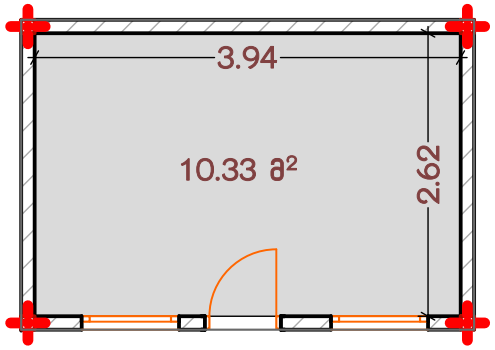

შენობა №15/1
საერთო ფართი 10.33 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 15/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №16/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

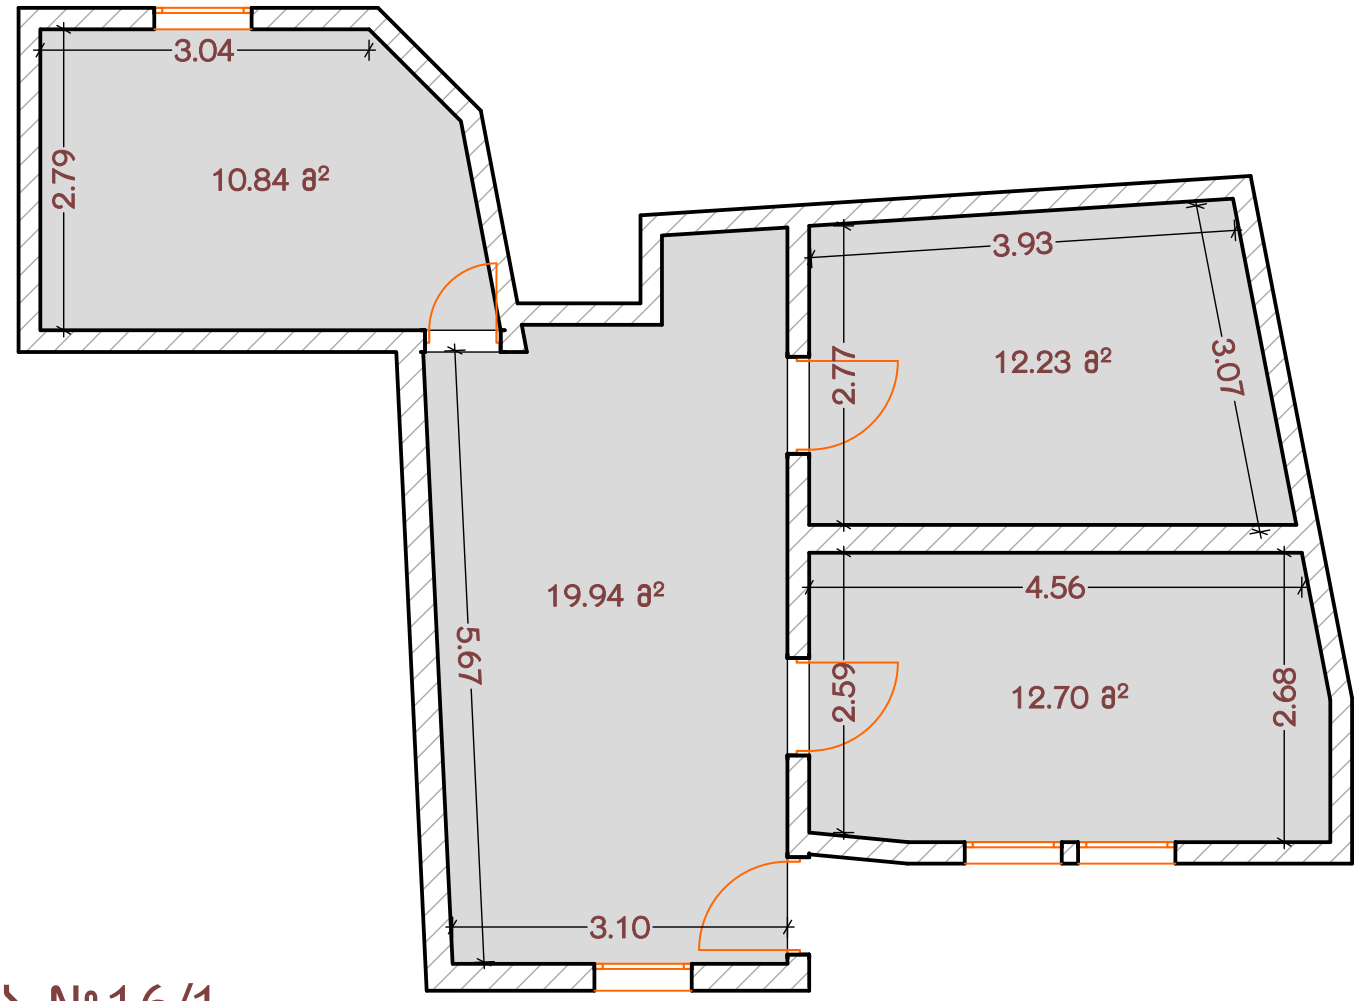

შენობა №16/1
საერთო ფართი 55.71 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუხია	შენობა 16/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომჯაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №17/1
სართულის გეგმა მ. 1:100



შენობა №17/1
საერთო ფართი 5.98 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 17/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №18/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

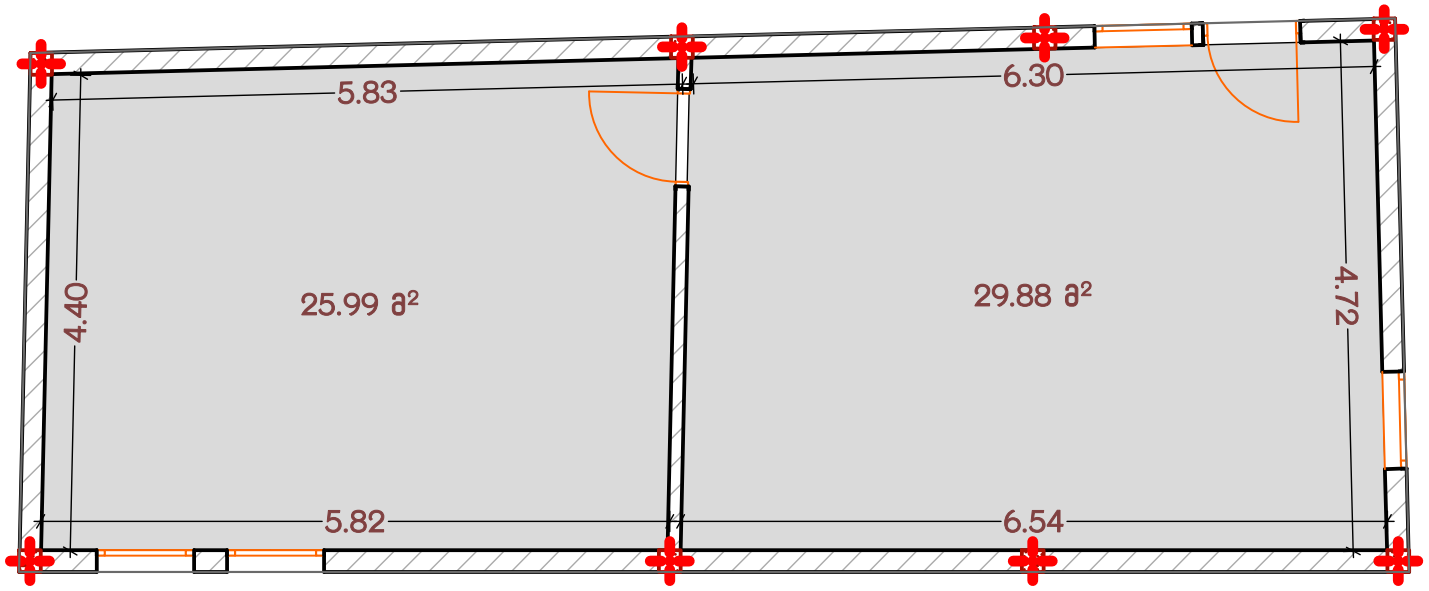

შენობა №18/1
საერთო ფართი 55.87 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 18/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომჯაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №19/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

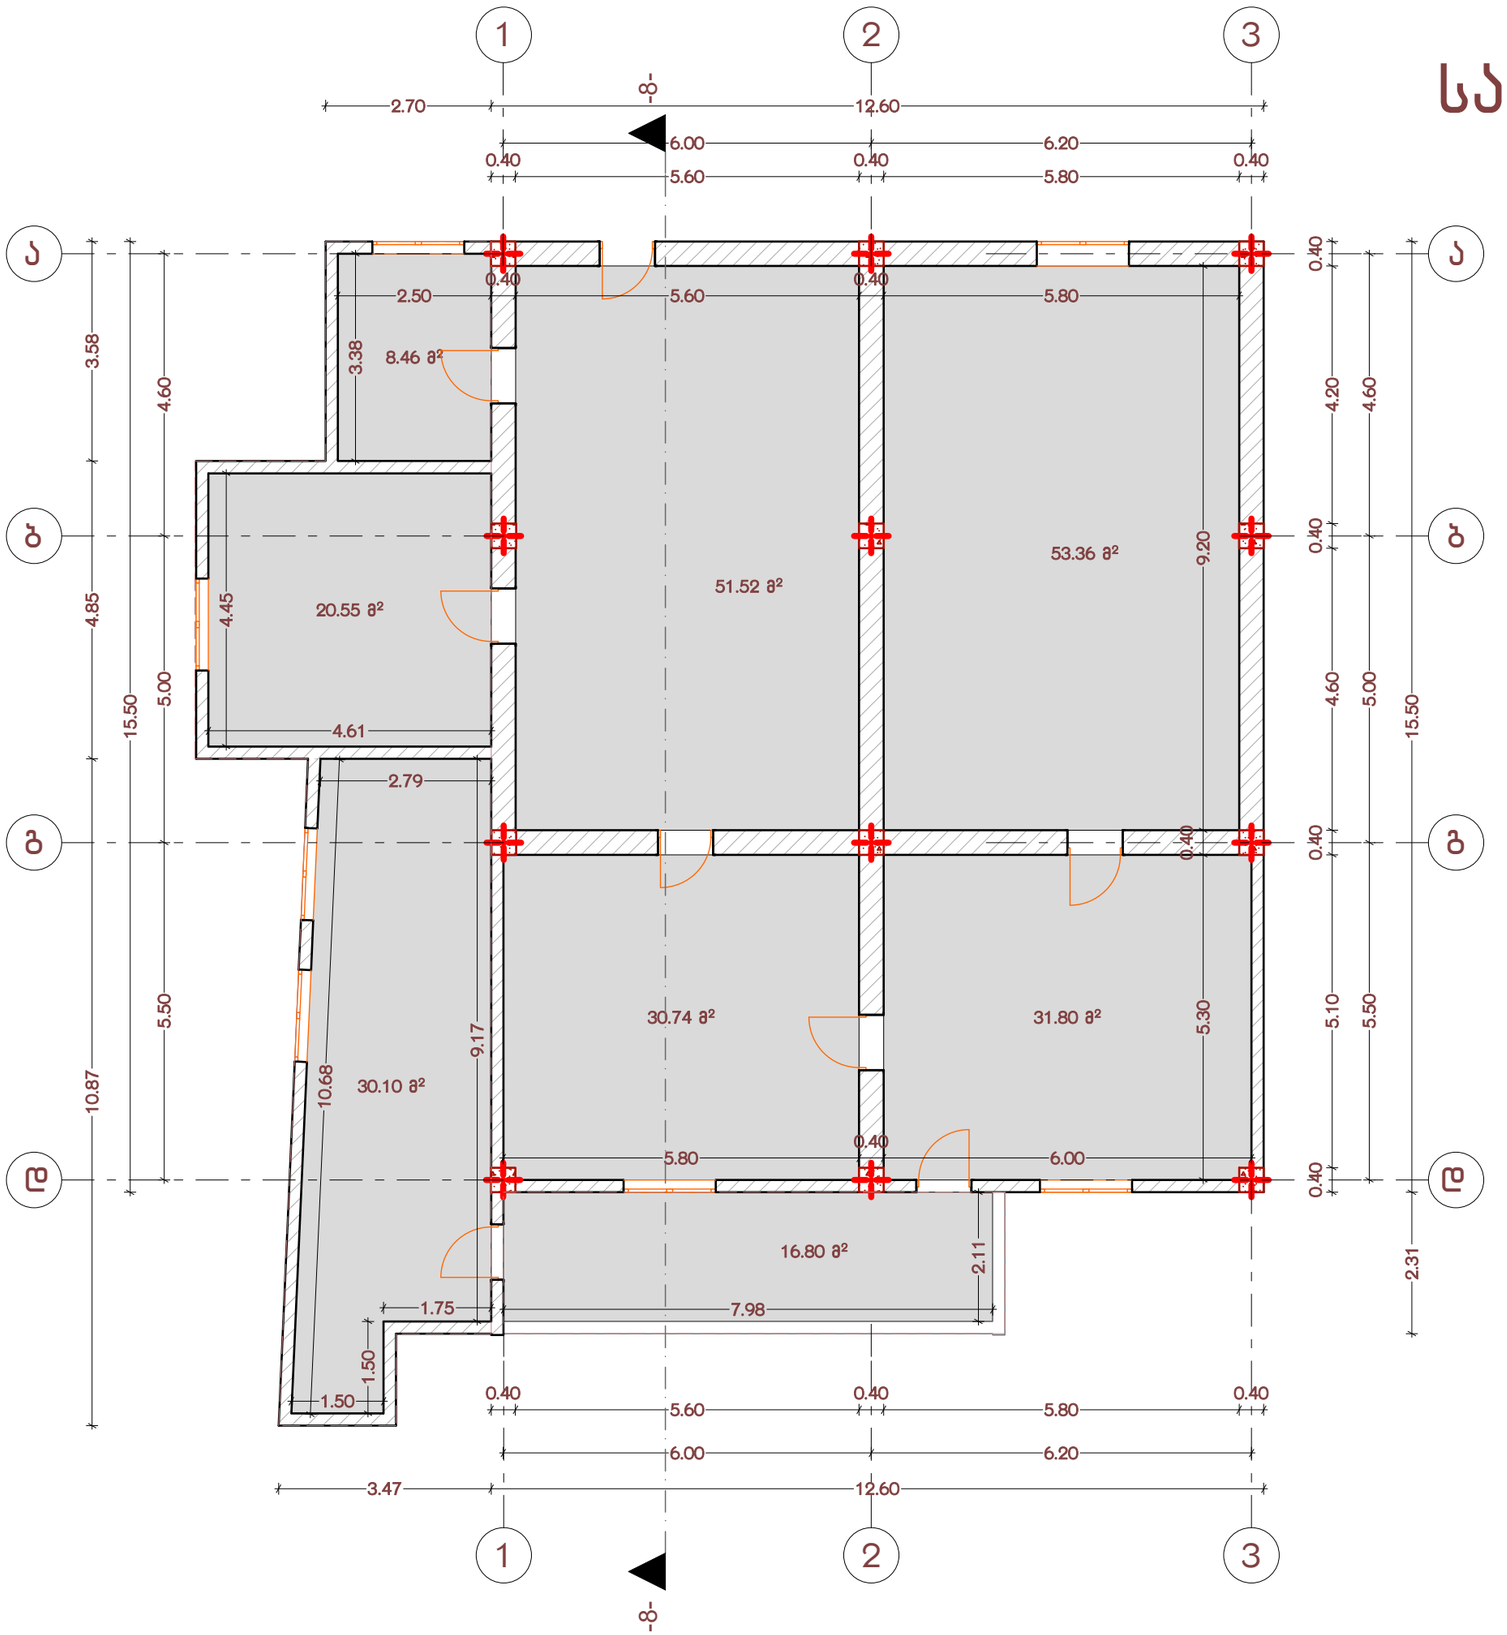

შენობა №19/1
საერთო ფართი 243.33 მ²


შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 19/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.6.		1:100

შენობა №19/1
ფასადი „1-3“ ღ-ში მ. 1:100

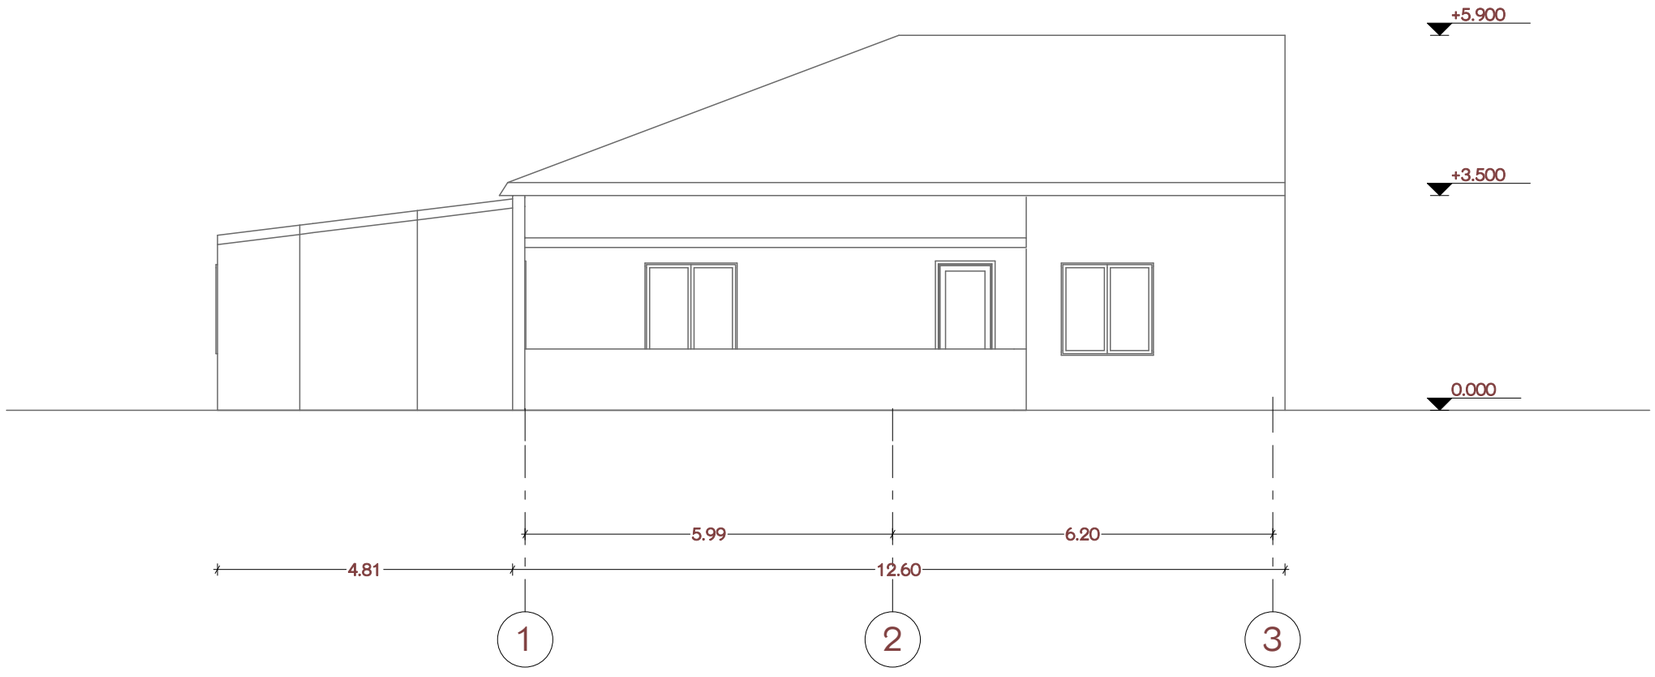


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 19/1 აზომვითი ნახაზი			
შემსრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „1-3“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №19/1
ფასადი „დ–ა“ ღ–ში მ. 1:100

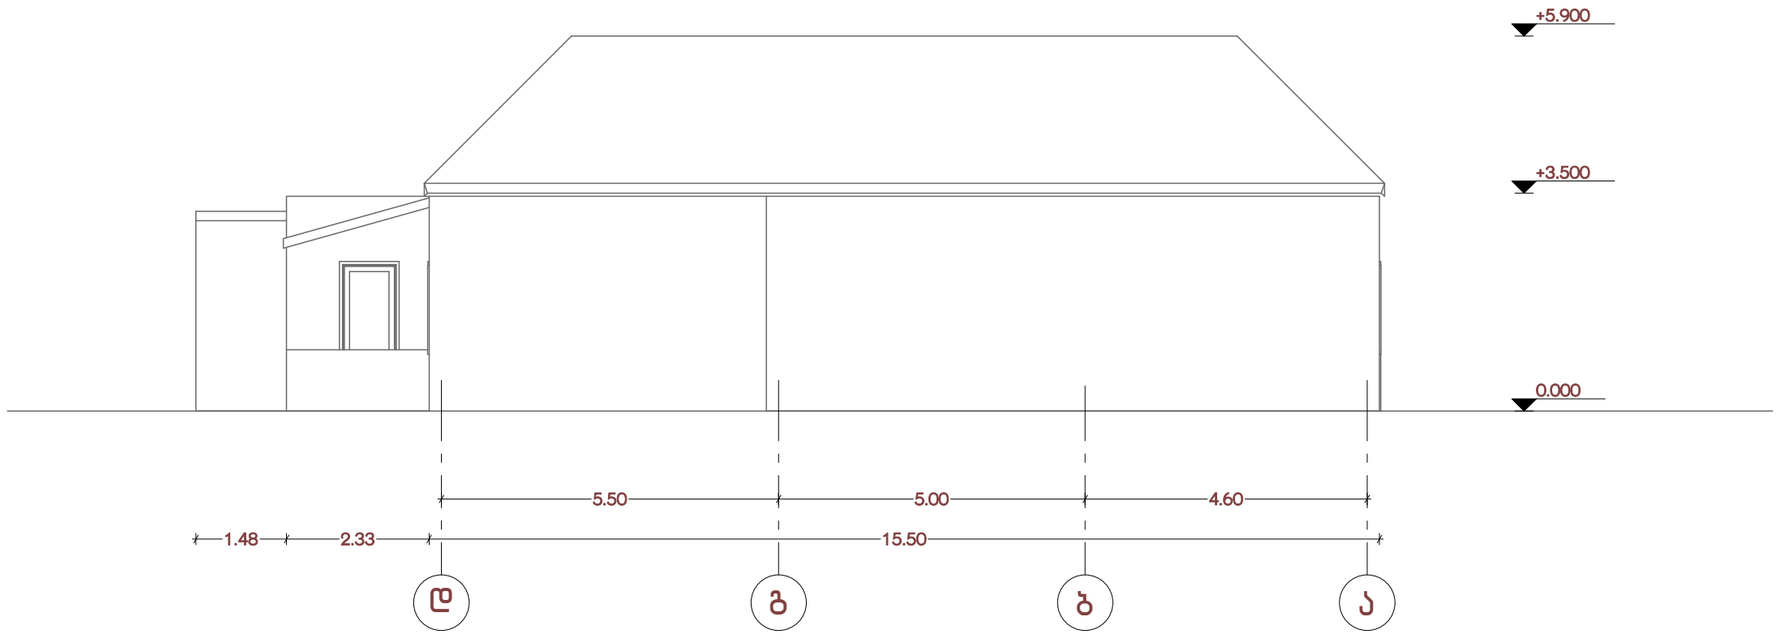


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 19/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „დ–ა“ ღ–ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №19/1
ფასადი „ა-დ“ ღ-ში მ. 1:100

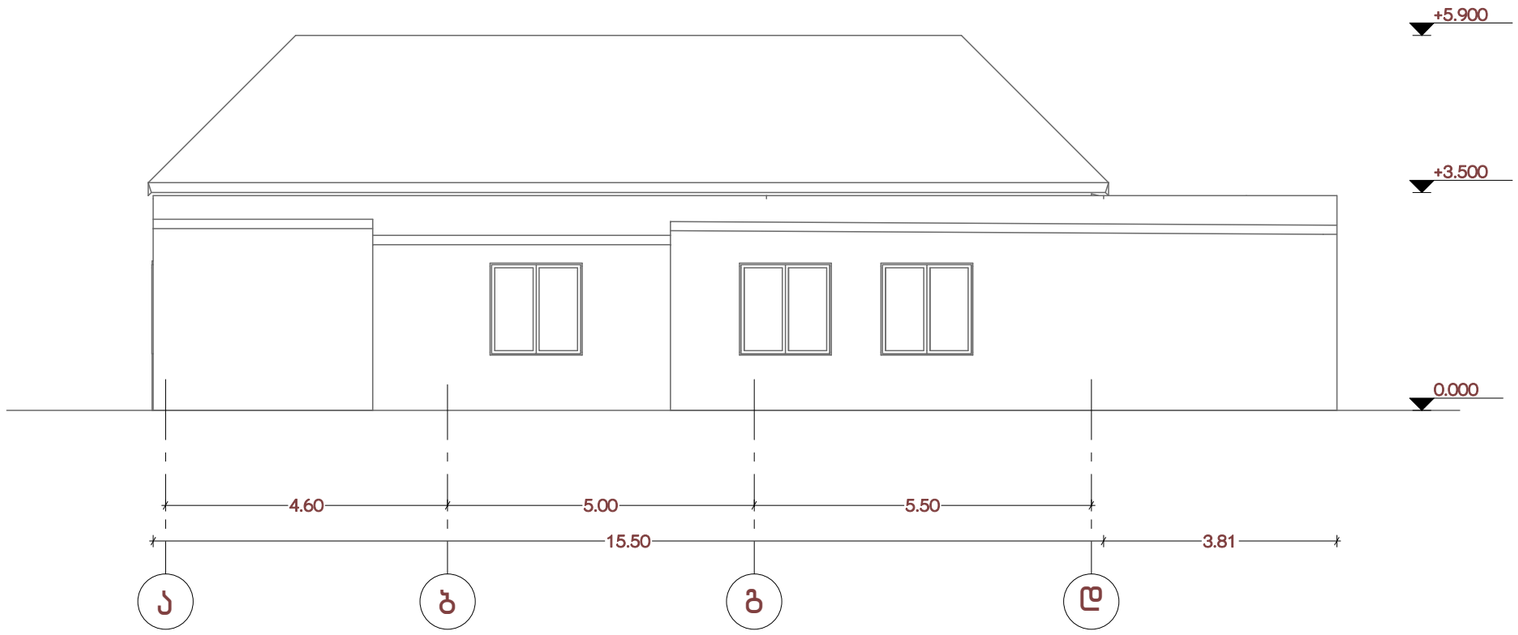


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 19/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „ა-დ“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №19/1
ფასადი „3-1“ ღ-ში მ. 1:100

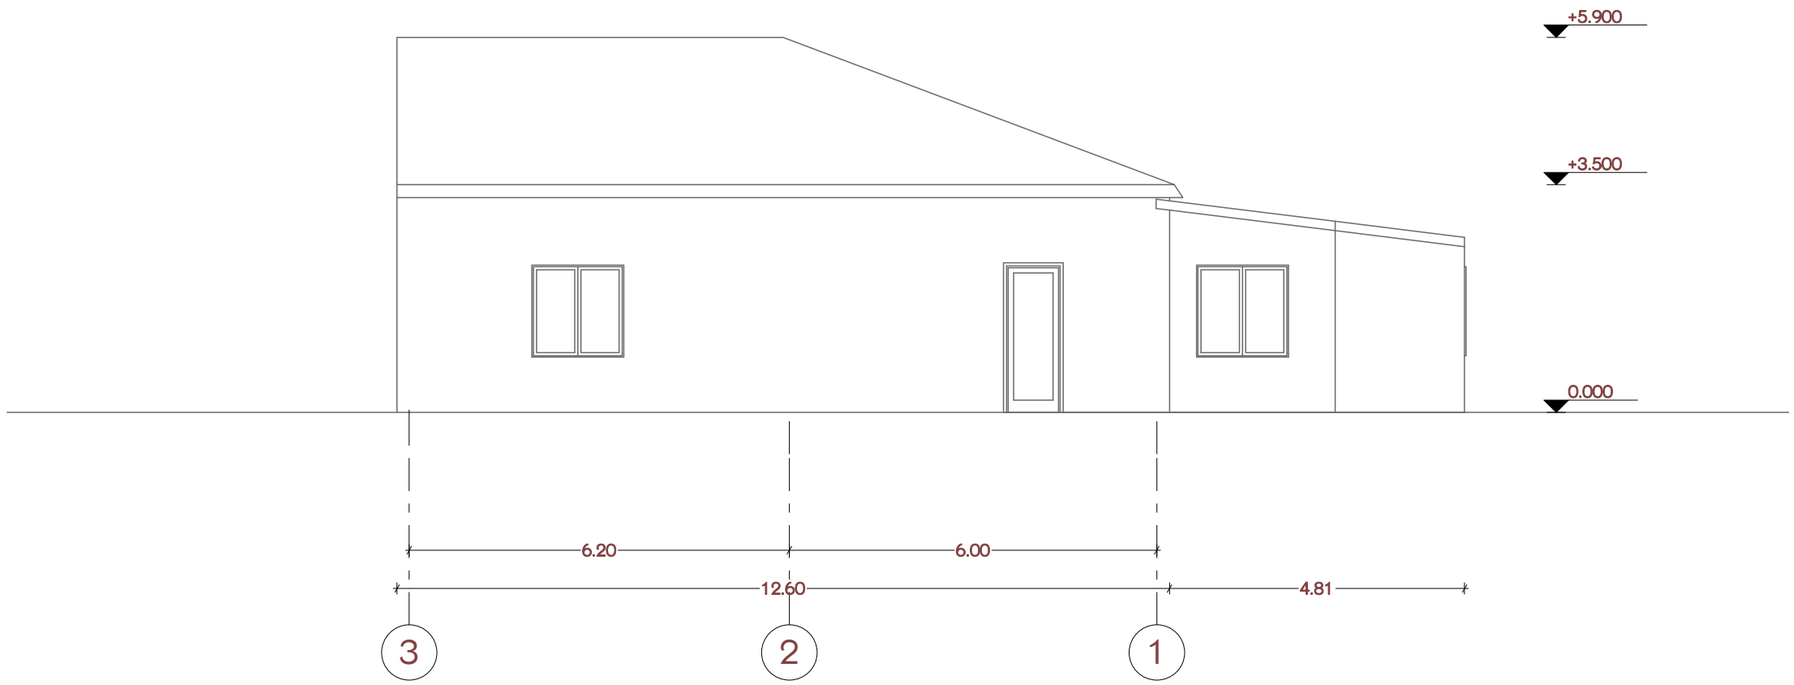


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 19/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „3-1“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №19/1
ჭრილი „8-8“ მ. 1:100

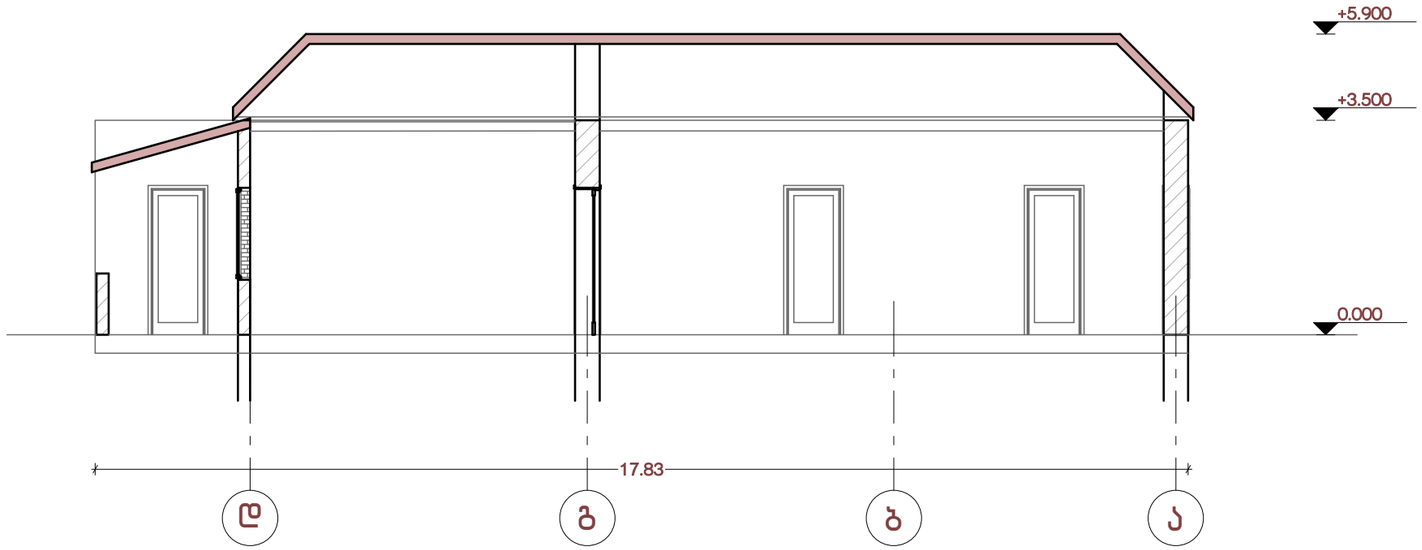


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 19/1 აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომაძე	ჭრილი „8-8“			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №20/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

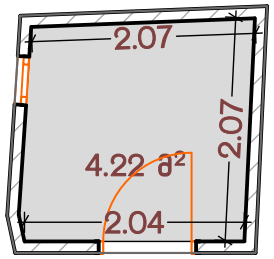

შენობა №21/1
სართულის გეგმა მ. 1:100




შენობა №20/1
საერთო ფართი 4.22 მ²

შენობა №21/1
საერთო ფართი 2.35 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 20/1 და 21/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომჯაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №22/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

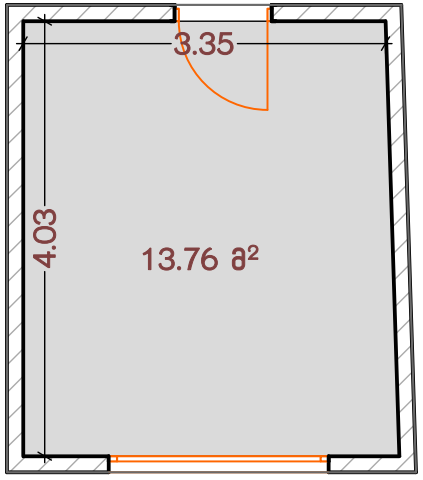

შენობა №22/1
საერთო ფართი 13.76 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 22/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №23/1
სართულის გეგმა მ. 1:100



შენობა №23/1
საერთო ფართი 6.59 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 23/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №24/1
სართულის გეგმა მ. 1:100



შენობა №24/1
საერთო ფართი 3.76 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 24/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №25/1
სართულის გეგმა მ. 1:100



შენობა №25/1
საერთო ფართი 9.01 მ²


შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 25/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №26/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

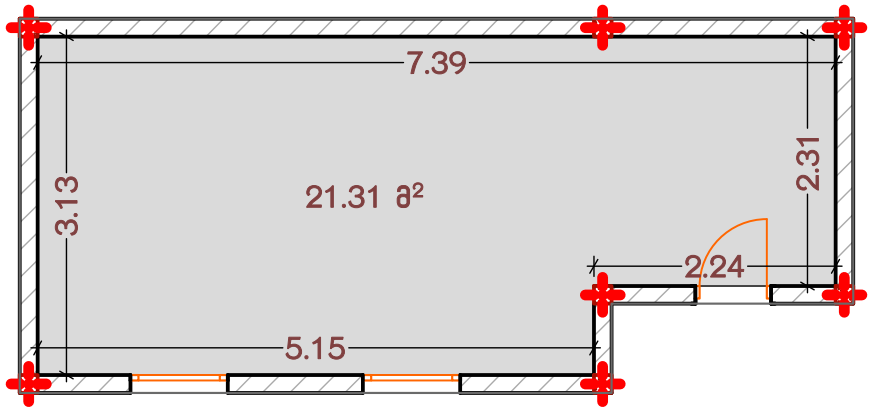

შენობა №26/1
საერთო ფართი 21.31 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 26/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

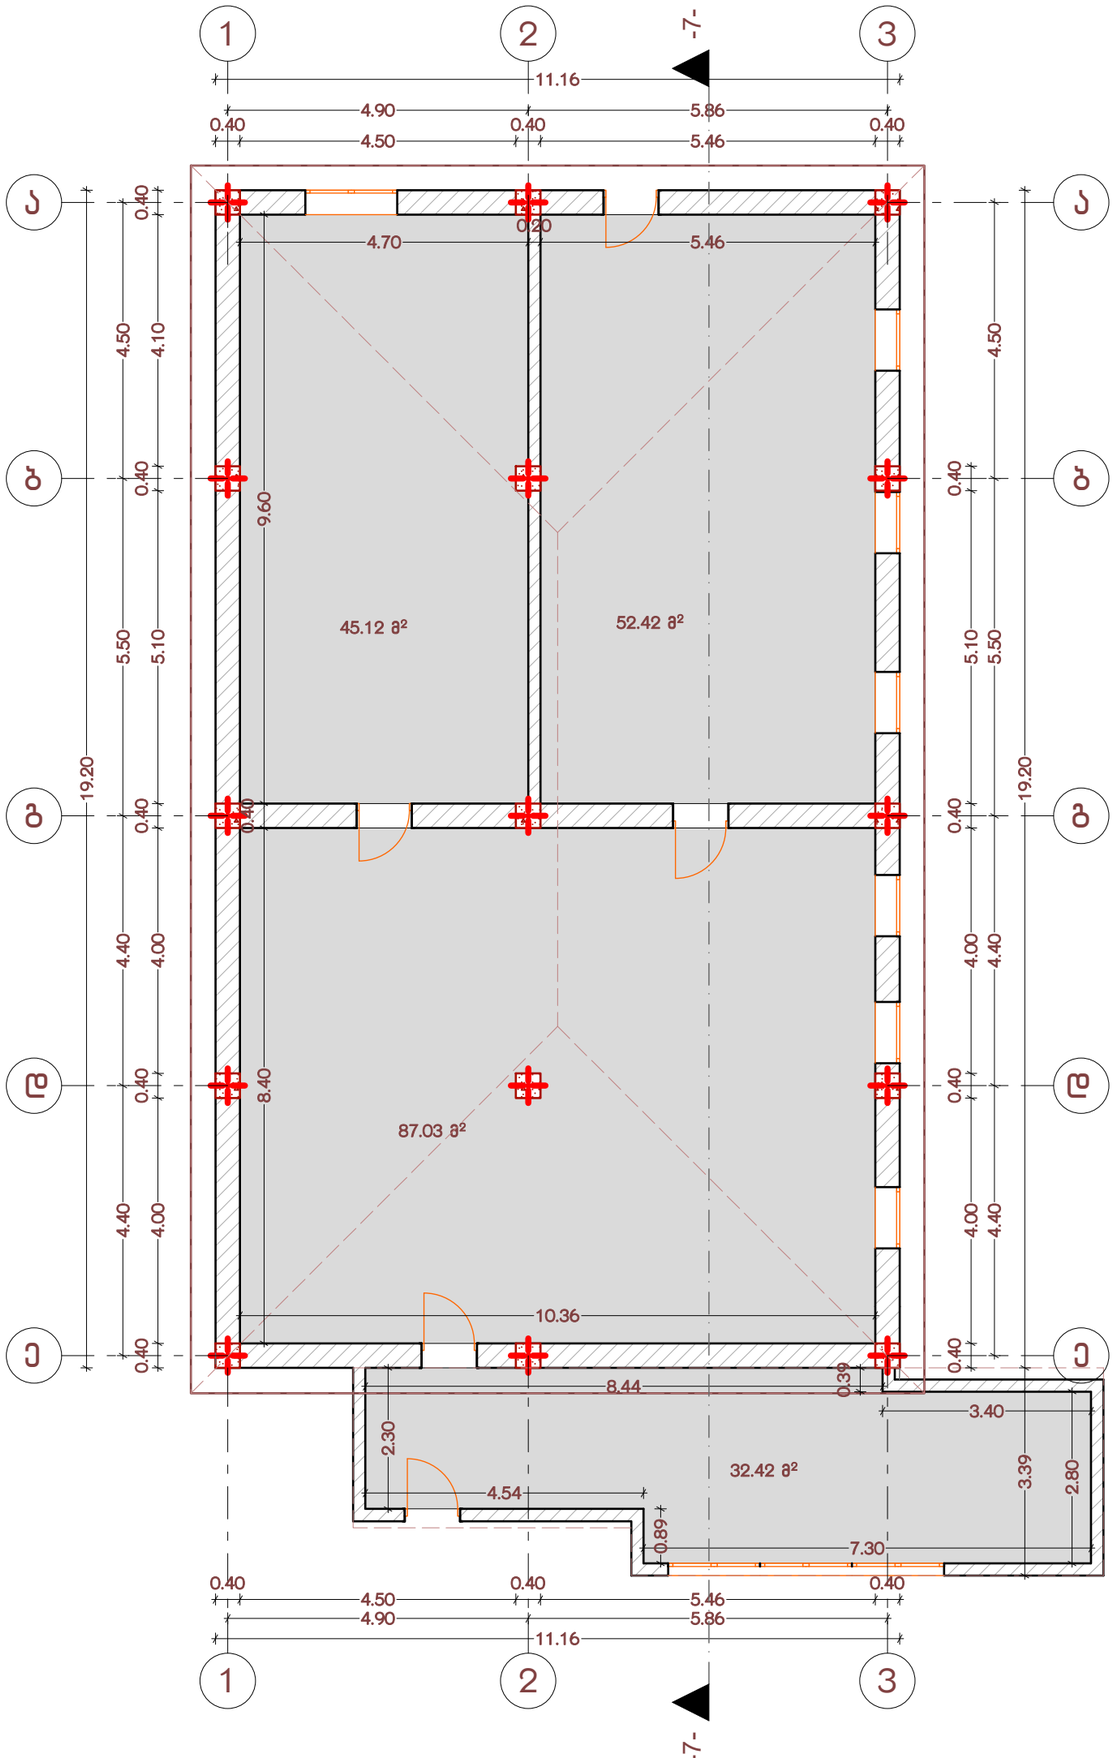


შენობა №27/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

შენობა №27/1
საერთო ფართი 216.99 მ²


შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 27/1 აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №27/1
ფასადი „ა-ე“ ღ-ში მ. 1:100

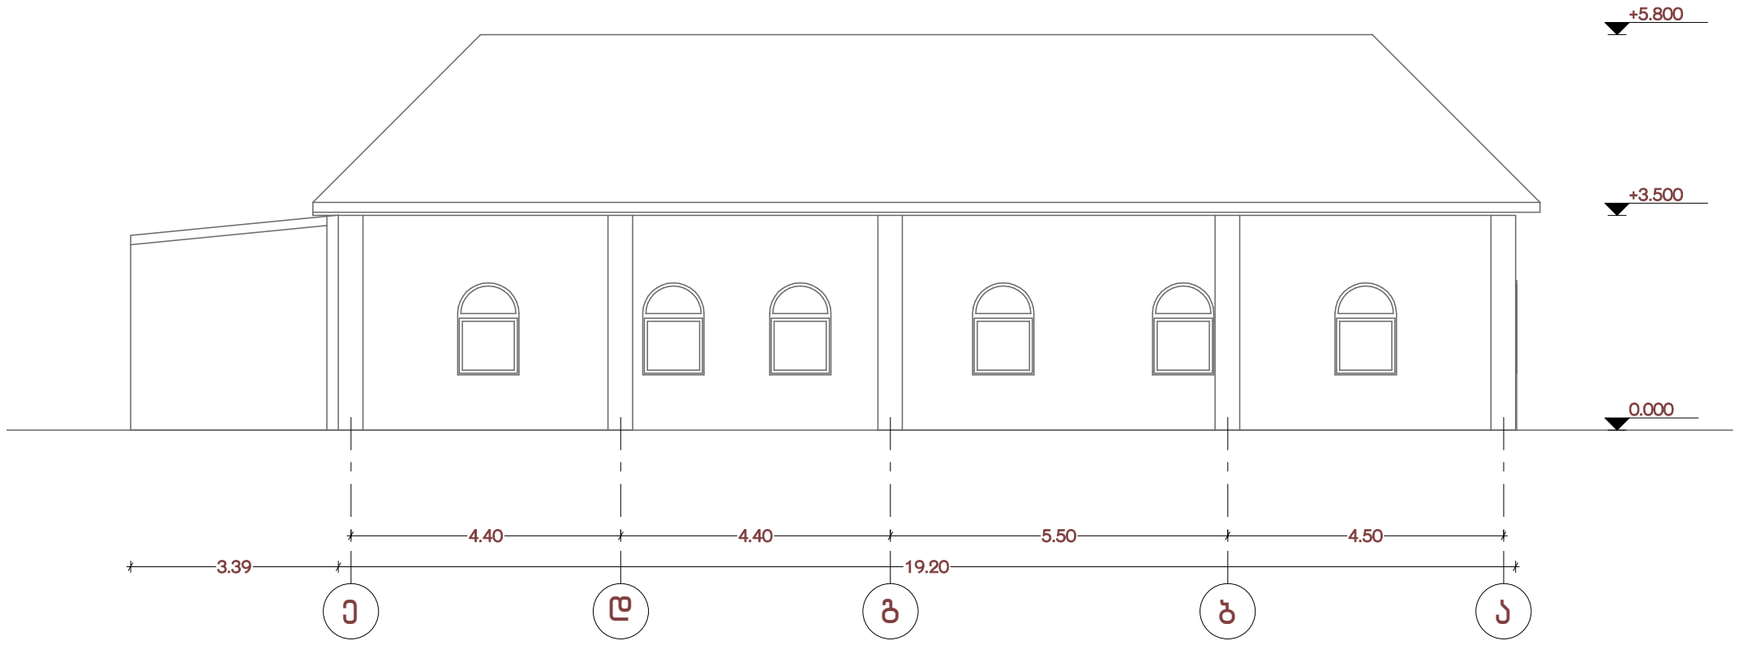


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 27/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „ა-ე“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №27/1
ფასადი „1-3“ ღ-ში მ. 1:100

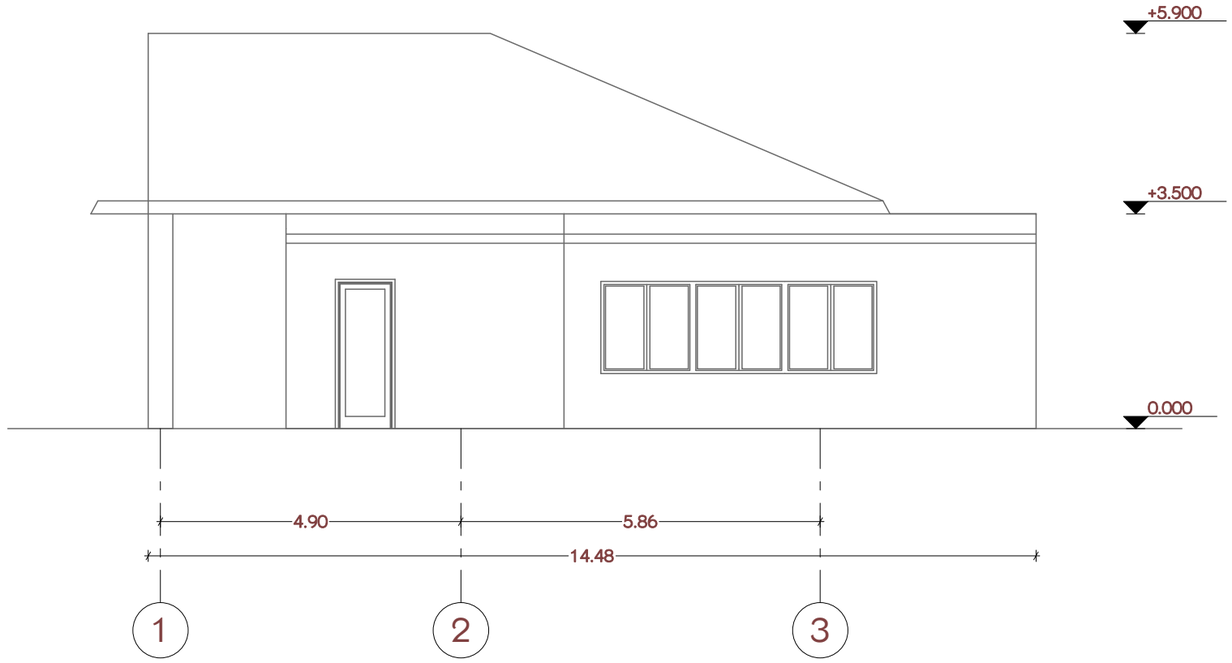


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 27/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „1-3“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №27/1
ჭრილი „7-7“ მ. 1:100

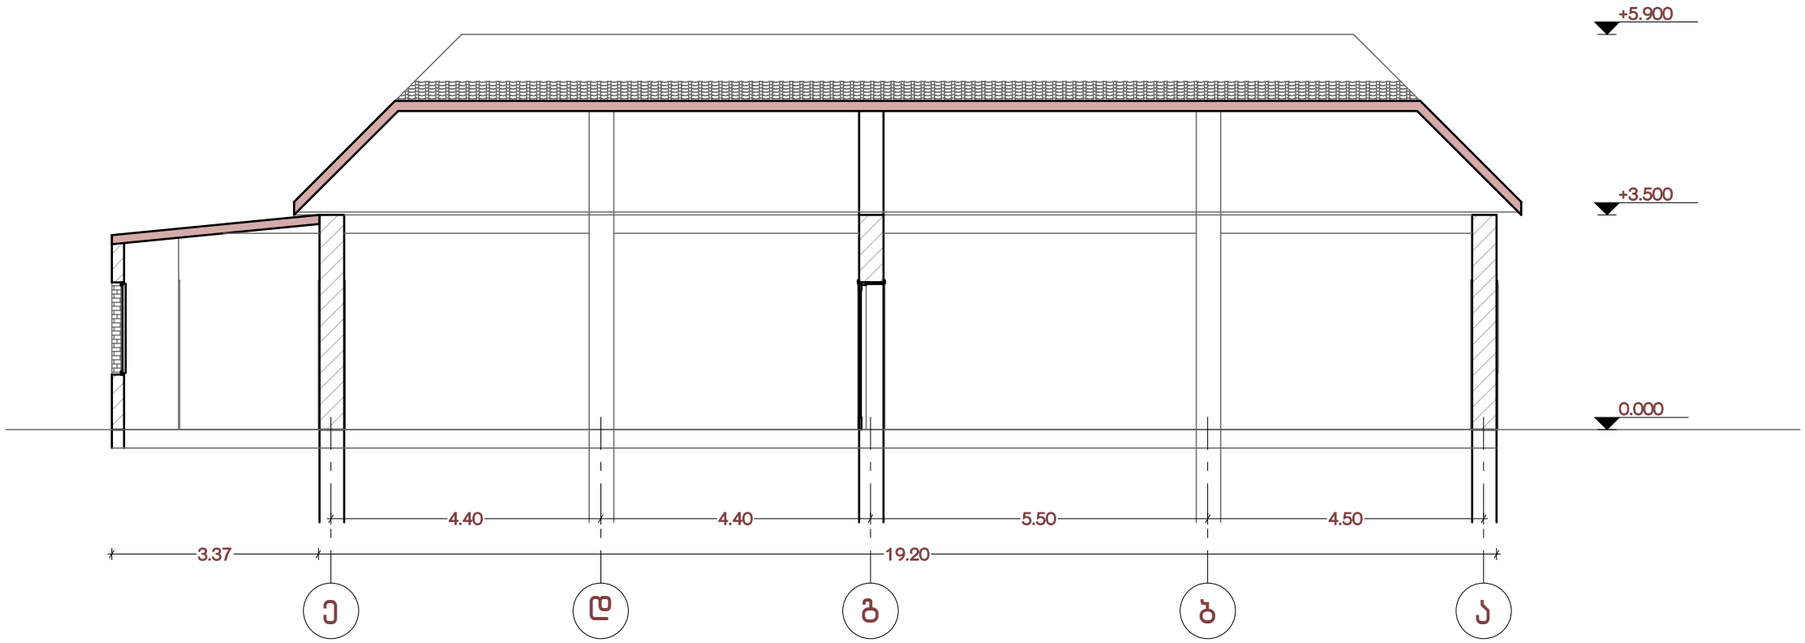

შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 27/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ჭრილი „7-7“			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №28/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

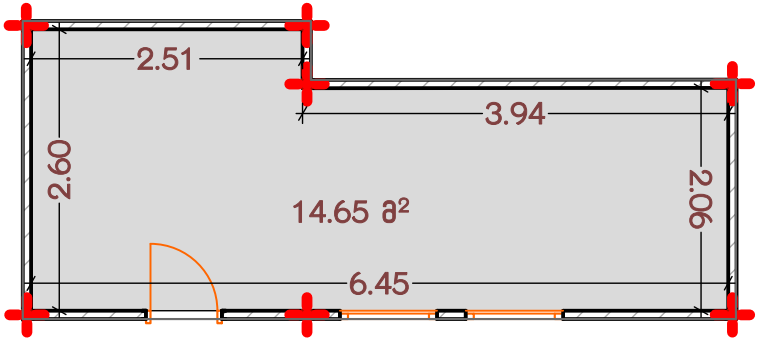

შენობა №28/1
საერთო ფართი 14.65 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 28/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №29/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

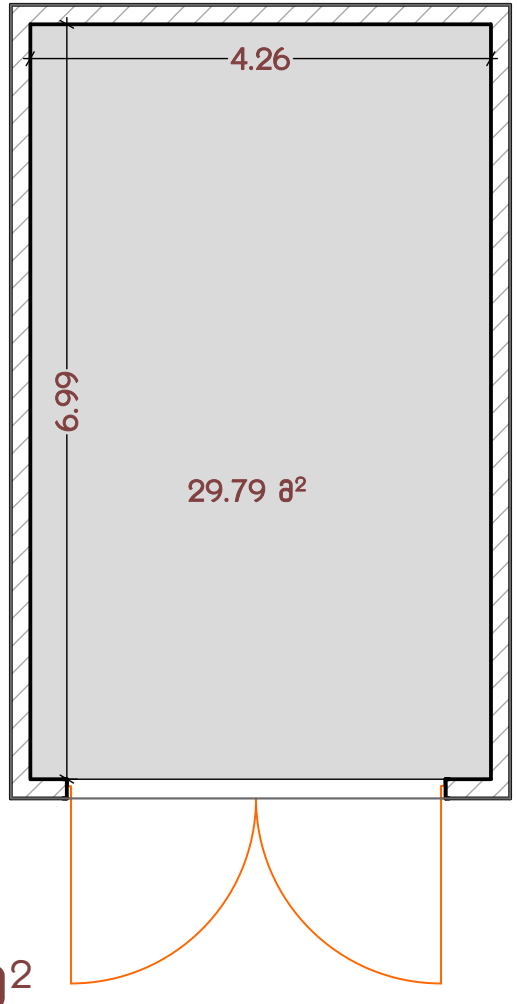

შენობა №29/1
საერთო ფართი 29.79 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 29/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №30/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

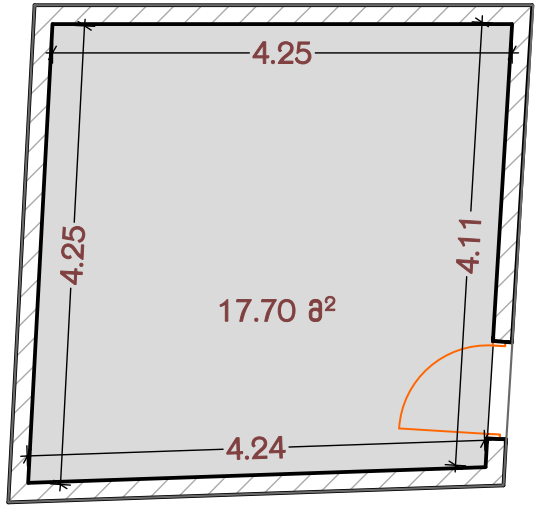

შენობა №30/1
საერთო ფართი 17.70 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 30/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №31/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

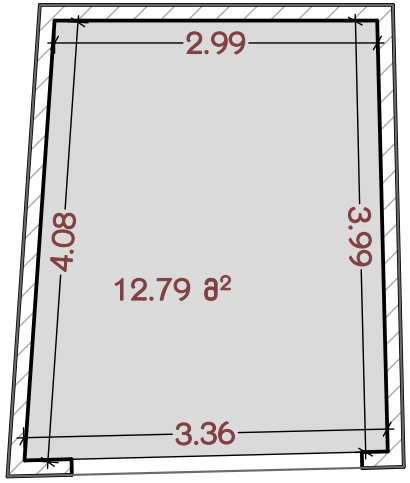

შენობა №31/1
საერთო ფართი 12.79 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 31/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №32/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

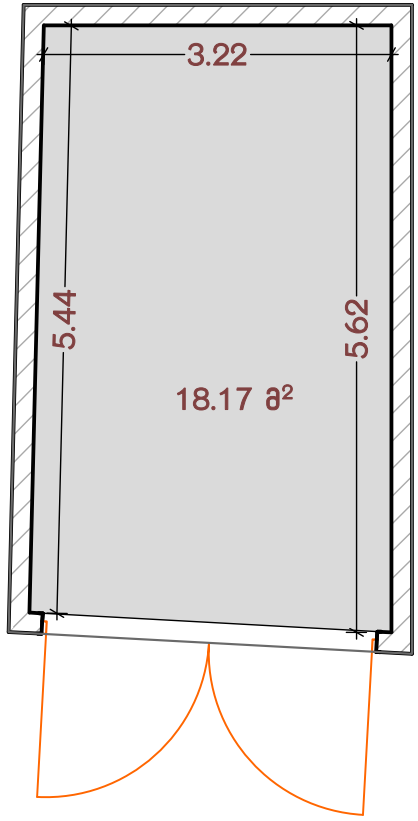

შენობა №32/1
საერთო ფართი 18.17 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 32/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №33/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

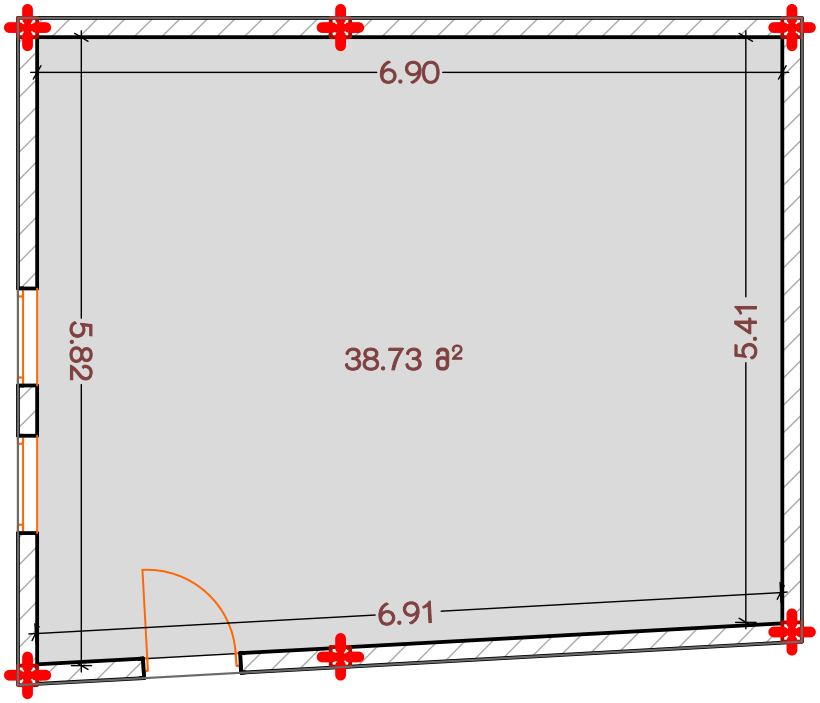

შენობა №33/1
საერთო ფართი 38.73 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალათურია	შენობა 33/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომჯაქე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №34/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

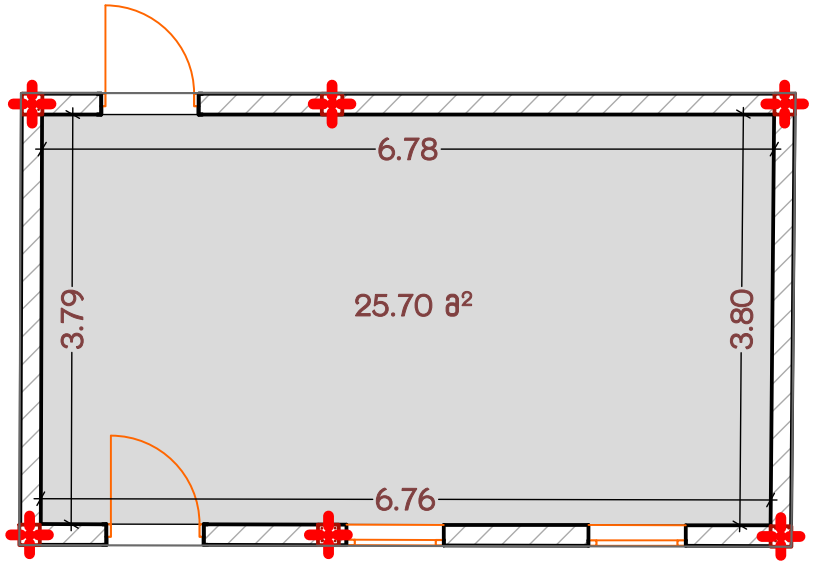

შენობა №34/1
საერთო ფართი 25.70 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 34/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №35/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

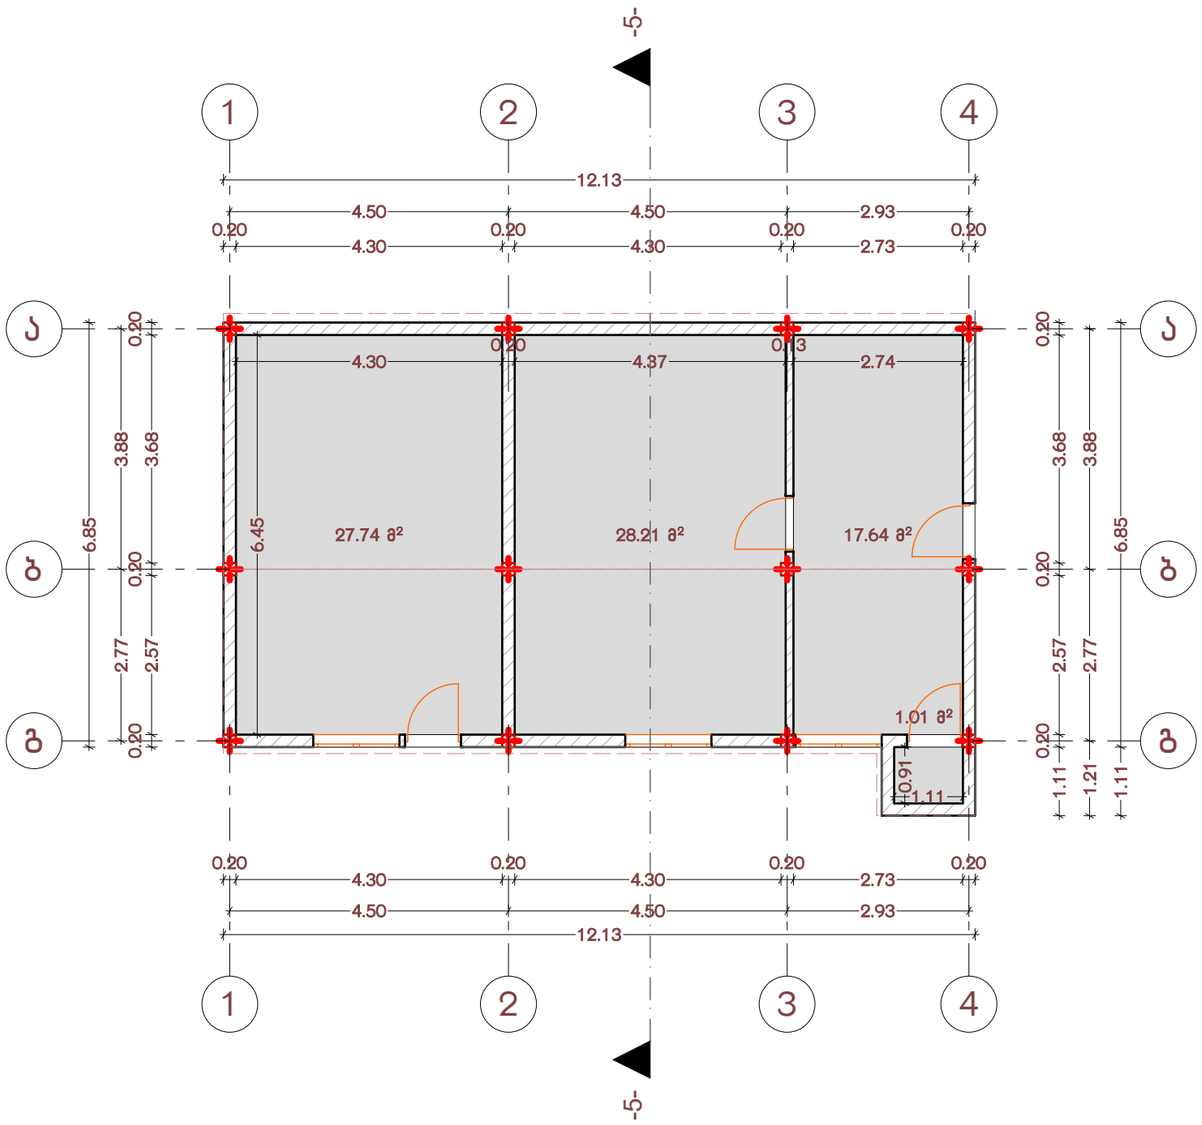

შენობა №35/1
საერთო ფართი 74.60 მ²


შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალათურია	შენობა 40/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №35/1
ფასადი „1-4“ ღ-ში მ. 1:100

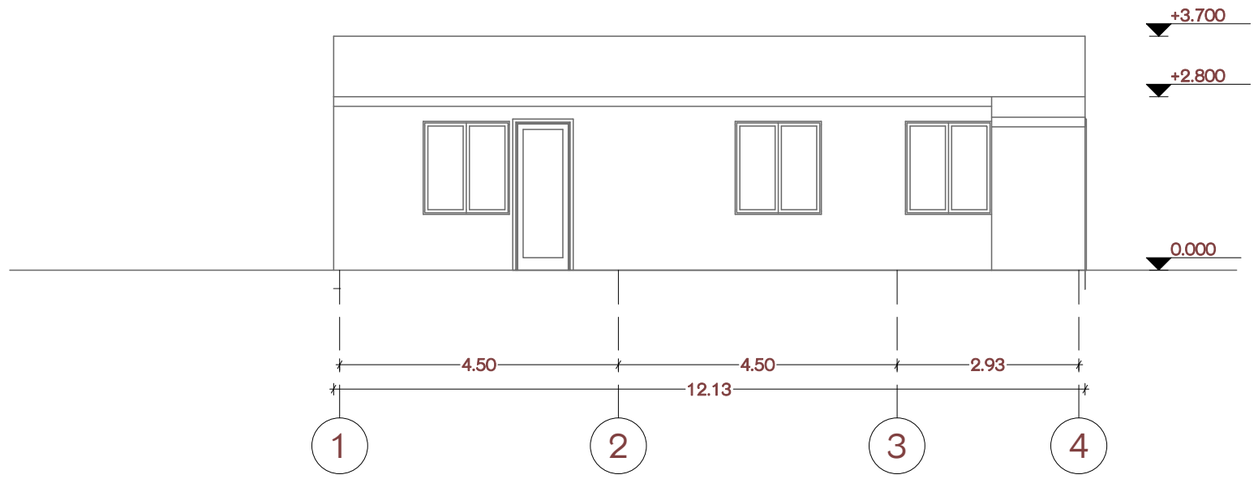


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 35/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „1-4“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №35/1
ფასადი „გ-ა“ ღ-ში მ. 1:100

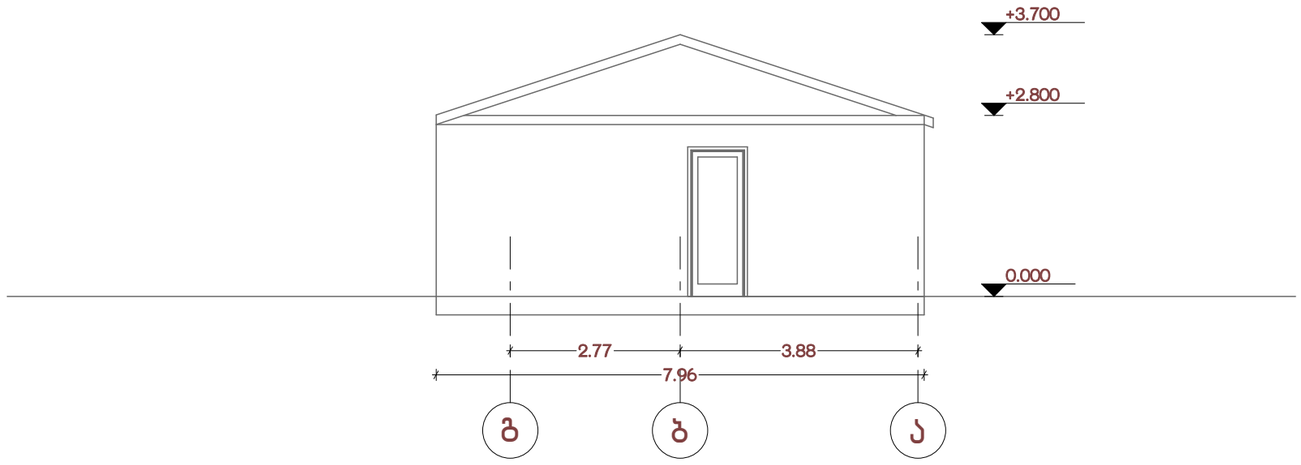


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 35/1 აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „გ-ა“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №35/1
ჭრილი „5-5“ ლ-ში მ. 1:100

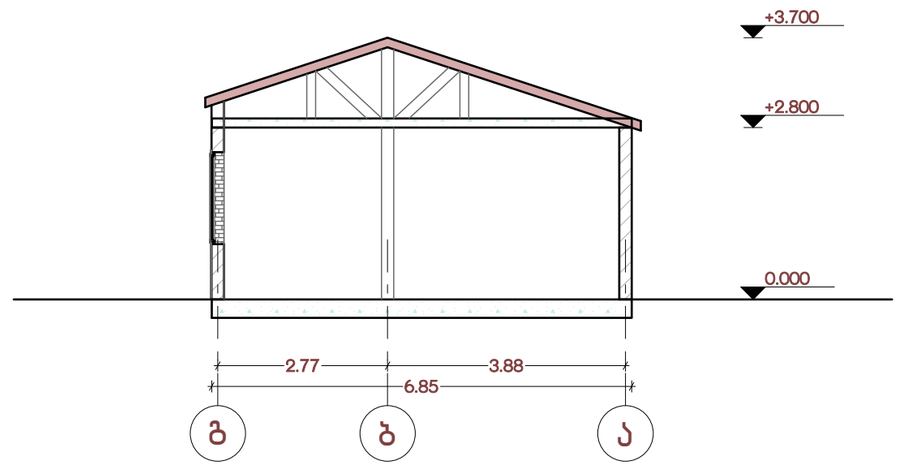

შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 35/1 აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომაძე	ჭრილი „5-5“			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №36/1
სართულის გეგმა მ. 1:100



შენობა №36/1
საერთო ფართი 2.32 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 36/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №37/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

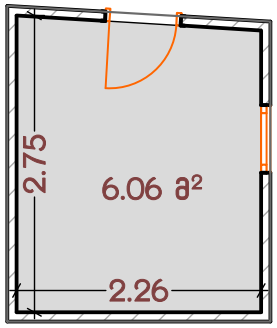

შენობა №37/1
საერთო ფართი 6.06 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 37/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №38/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

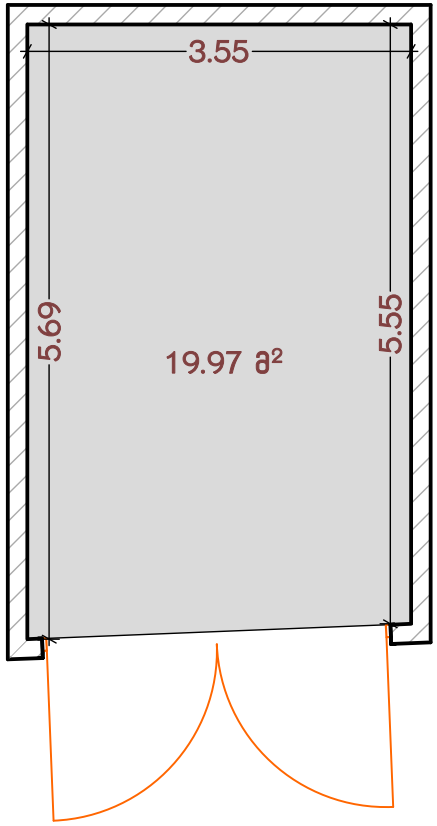

შენობა №38/1
საერთო ფართი 19.97 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 38/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №39/1
სართულის გეგმა მ. 1:100



შენობა №39/1
საერთო ფართი 3.99 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 37/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №40/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

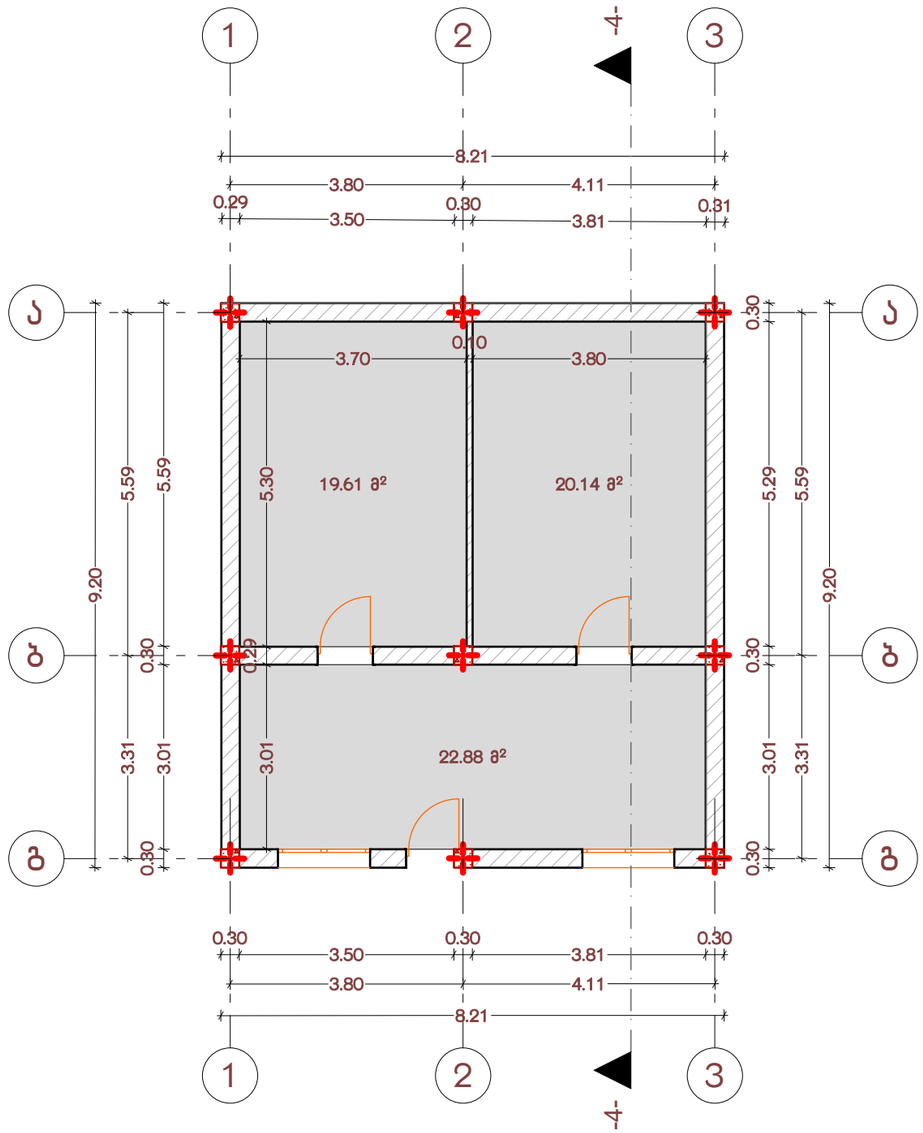

შენობა №40/1
საერთო ფართი 62.63 მ²


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 40/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №40/1
ფასადი „1-3“ ღ-ში მ. 1:100

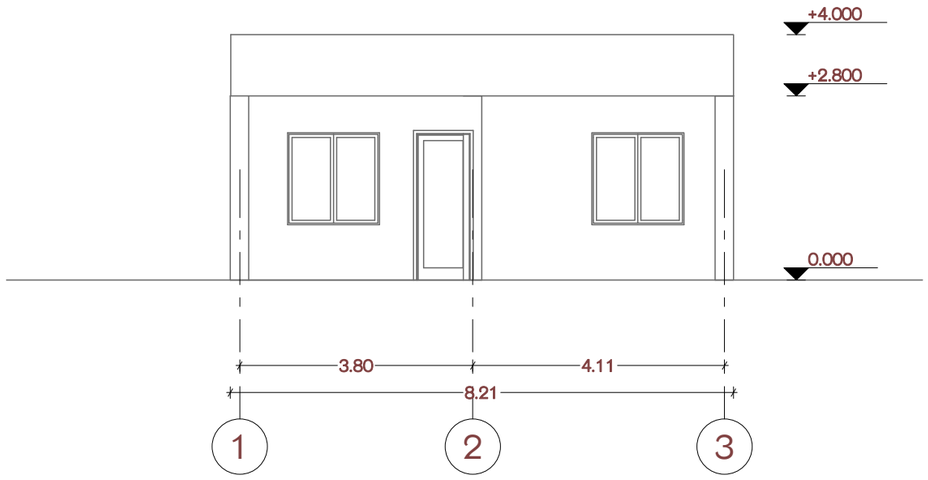


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 40/1 აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „1-3“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №40/1
ჭრილი „4-4“ ღ-ში მ. 1:100

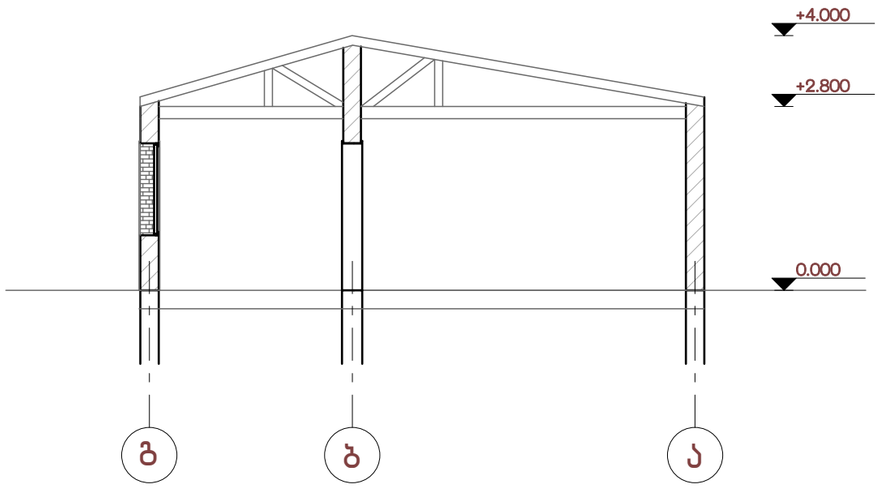

შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 40/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ჭრილი „4-4“			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №41/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

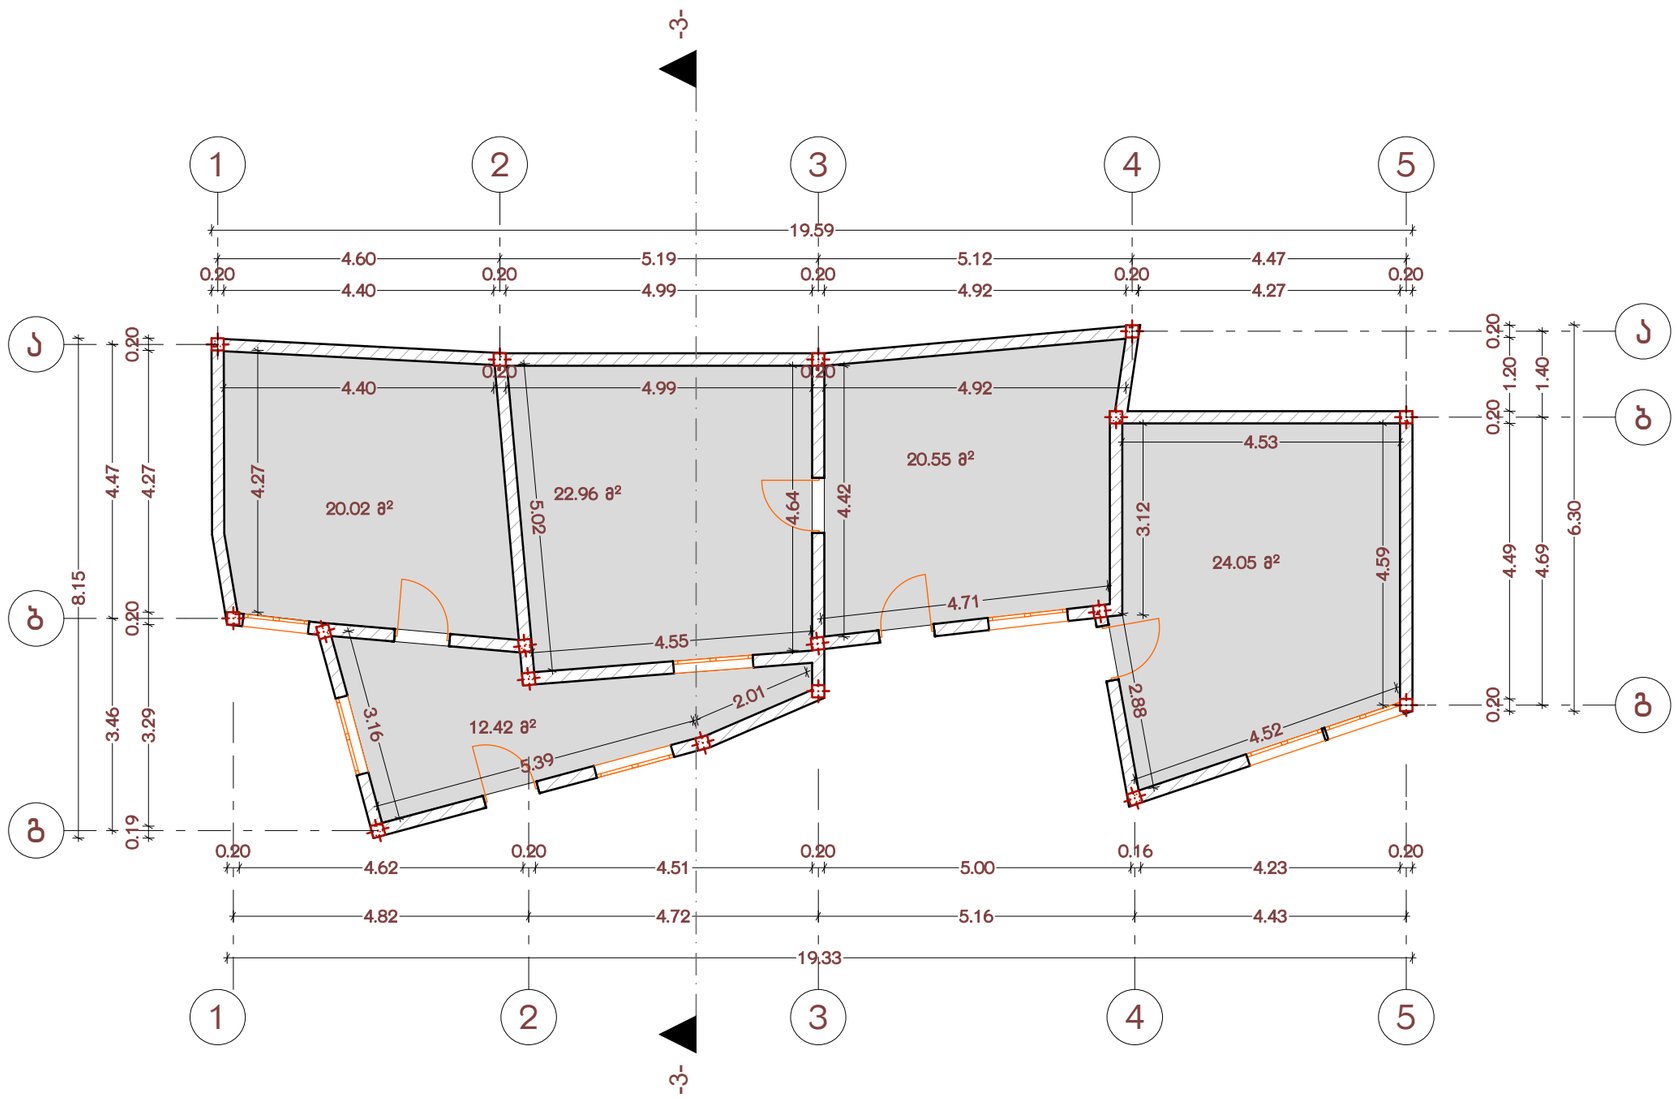

შენობა №41/1
საერთო ფართი 100.00 მ²


შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 41/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №41/1
ფასადი „1-5“ ღ-ში მ. 1:100

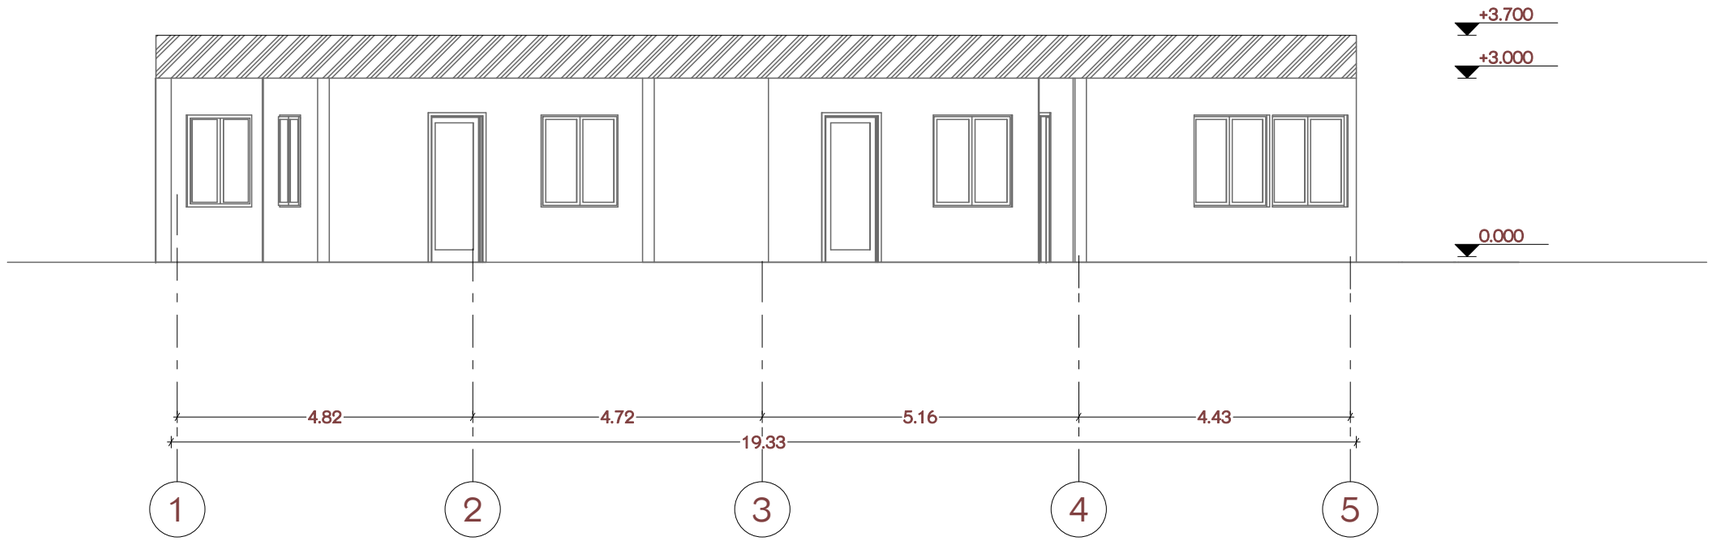


შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 41/1 აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „1-5“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №41/1
ფასადი „1-5“ ღ-ში მ. 1:100

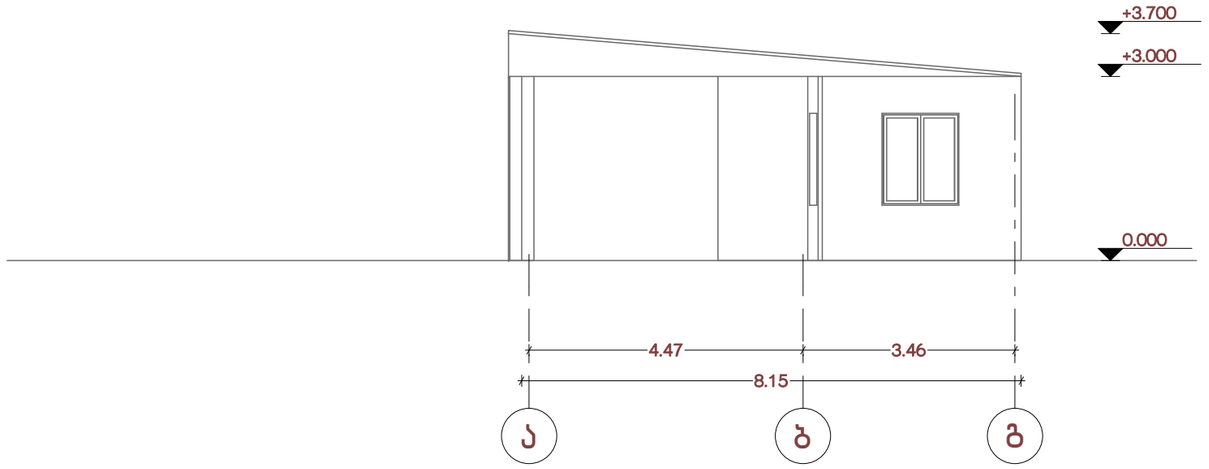


შ.პ.ს. “ქოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 41/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „1-5“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №41/1
ჭრილი „3-3“ ღ-ში მ. 1:100

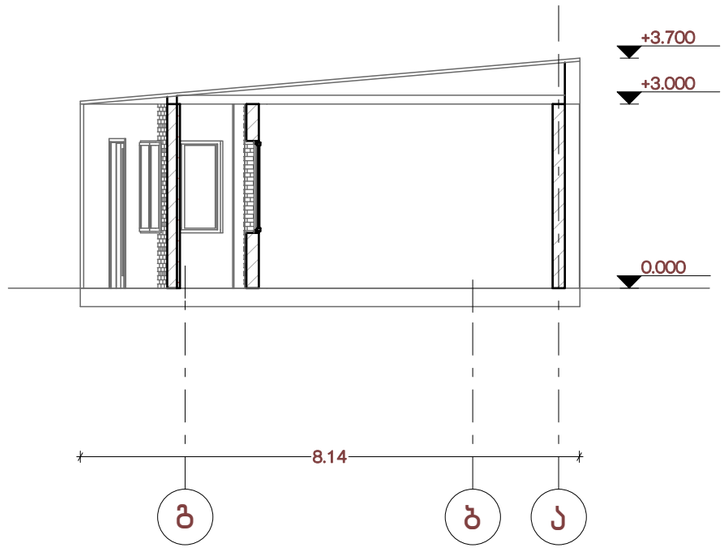

შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 41/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ჭრილი „3-3“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №42/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

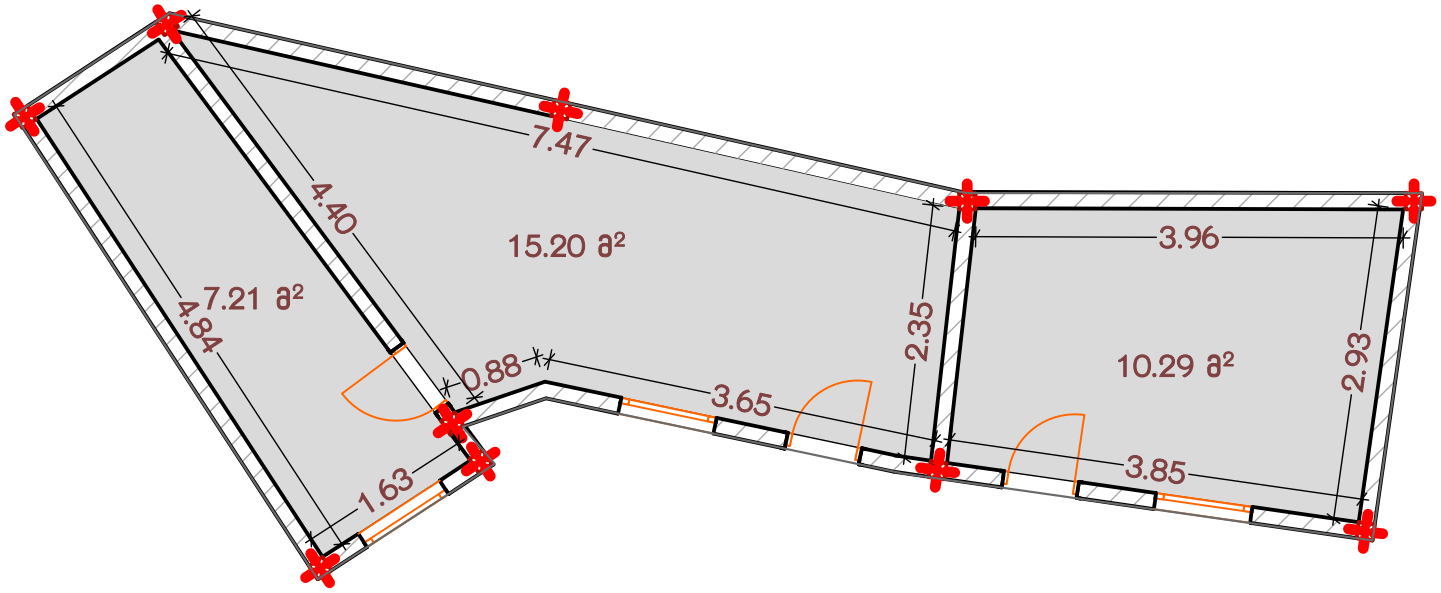

შენობა №42/1
საერთო ფართი 32.70 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუხია	შენობა 42/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №43/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

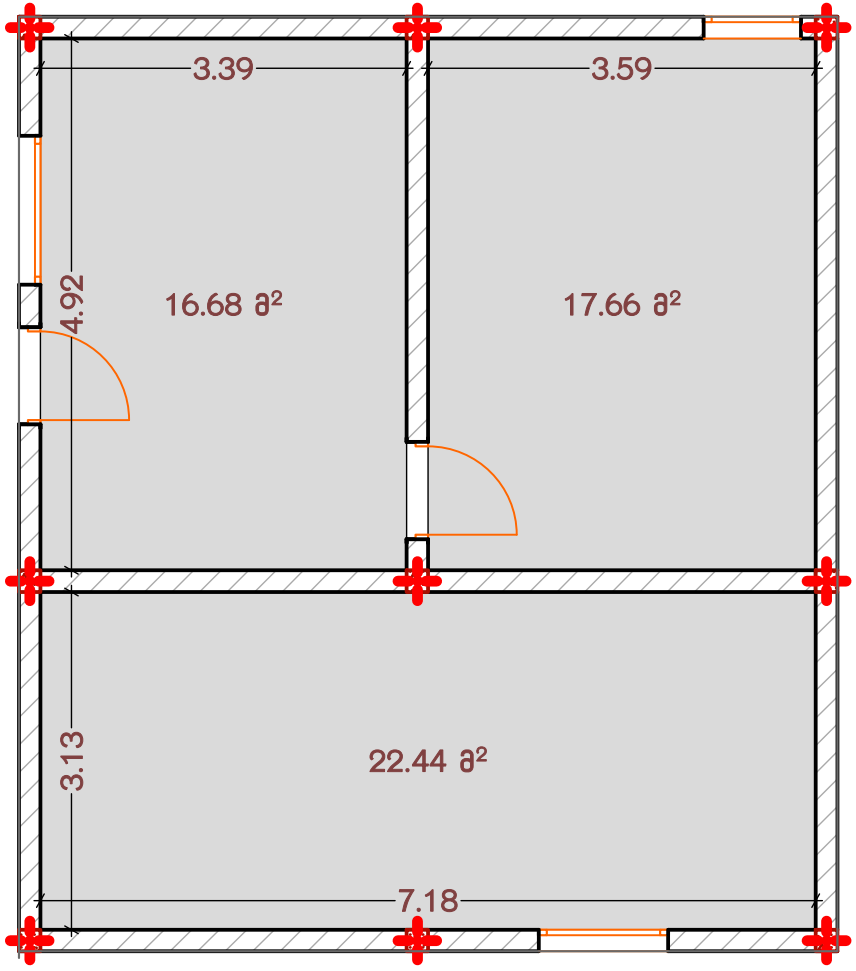

შენობა №43/1
საერთო ფართი 56.78 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 43/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №44/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

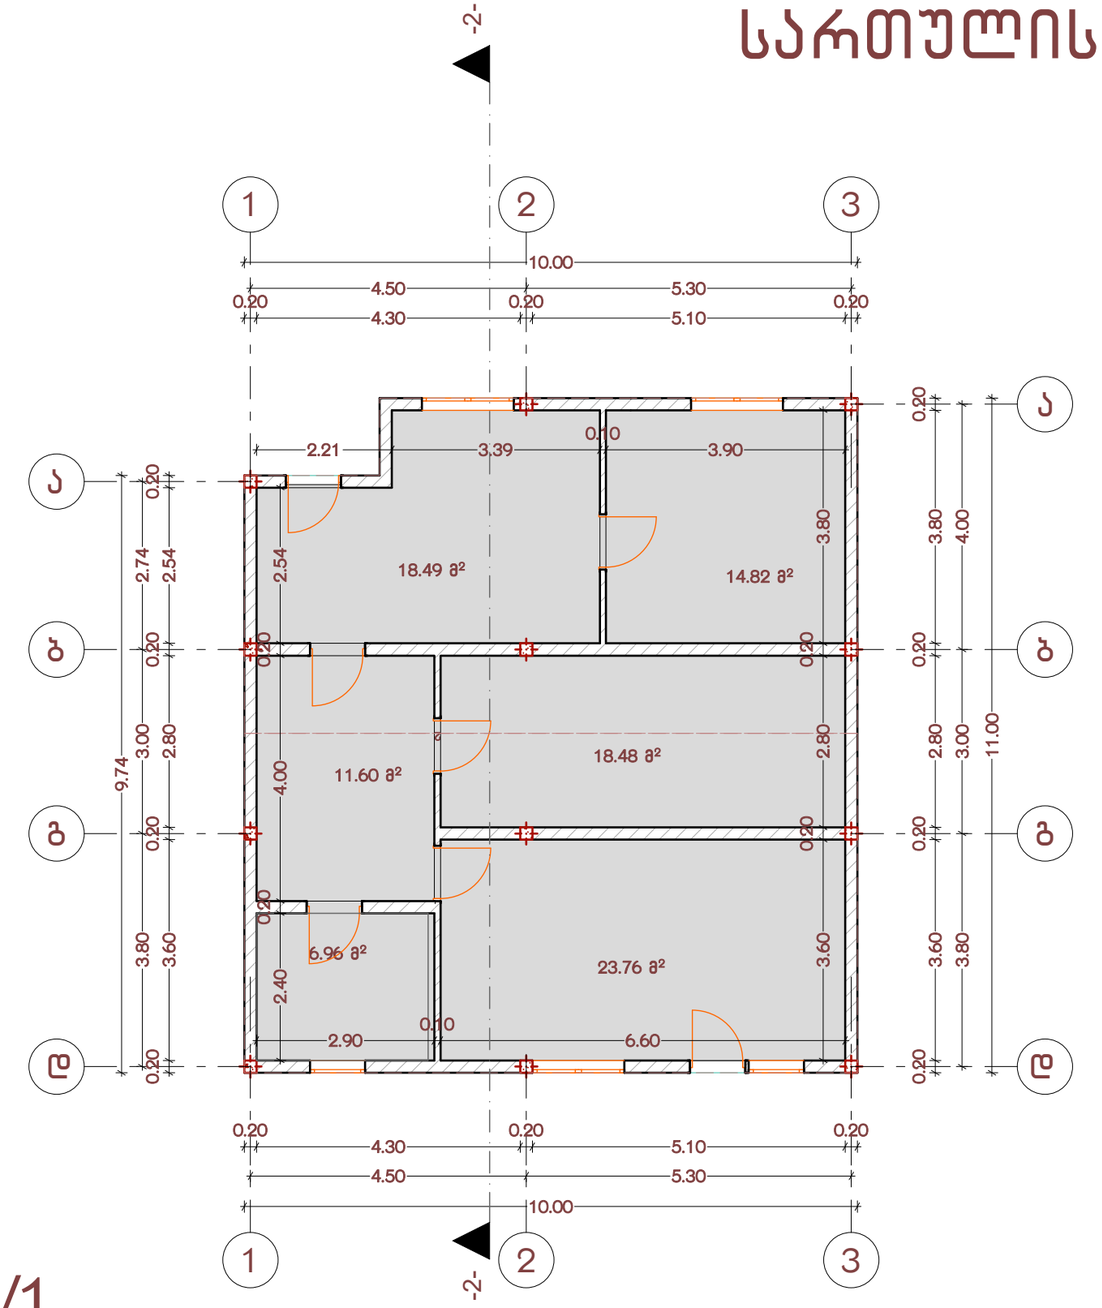

შენობა №44/1
საერთო ფართი 94.11 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 44/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.6.		1:100

შენობა №44/1
ფასადი „1-3“ ღ-ში მ. 1:100




შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 44/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „1-3“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №44/1
ფასადი „3-1“ ღ-ში მ. 1:100




შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 44/1 აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „3-1“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №44/1
ჭრილი „2-2“ ღ-ში მ. 1:100

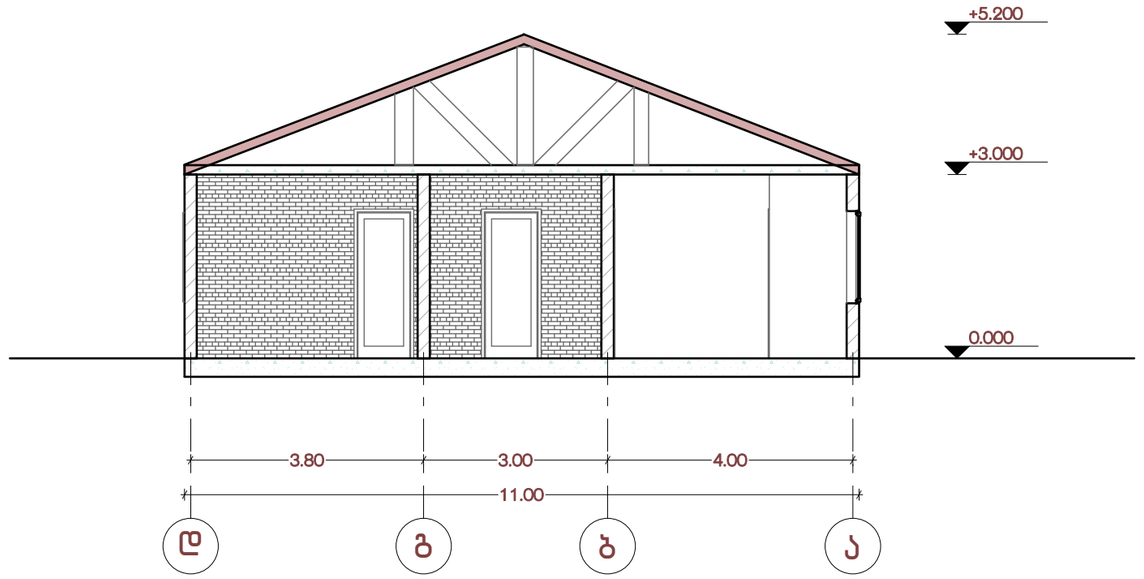

შ.პ.ს. “კოლხა 07“			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	შენობა 44/1 აზომვითი ნახაზი			
შეასრულა		ე.ლომაძე	ფასადი „3-1“ ღ-ში			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №45/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

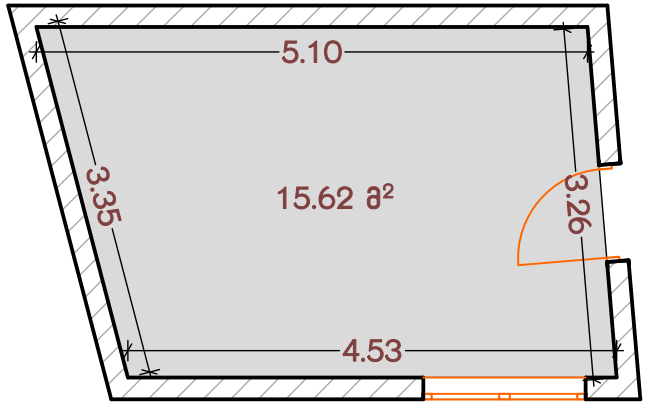

შენობა №46/1
საერთო ფართი 15.62 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 45/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


შენობა №46/1
სართულის გეგმა მ. 1:100

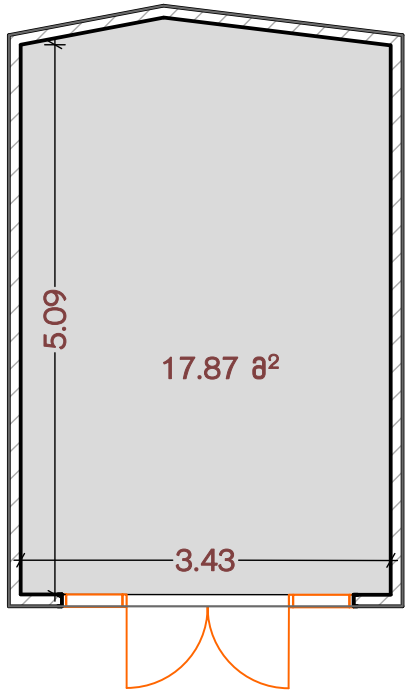

შენობა №46/1
საერთო ფართი 17.87 მ²

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 46/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომჯაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100

შენობა №47/1
სართულის გეგმა მ. 1:100



შენობა №47/1
საერთო ფართი 3.99 მ²


შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი, ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბალთუსრია	შენობა 47/1 შიდა აზომვითი ნახაზი			
შესრულა		ე.ლომგაძე	სართულის გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ	ა.ნ.		1:100


21/10/2018


21/10/2018


MANN FILTER
LIQUI MOLY
21/10/2018

გენ. გეგმა მ 1:500

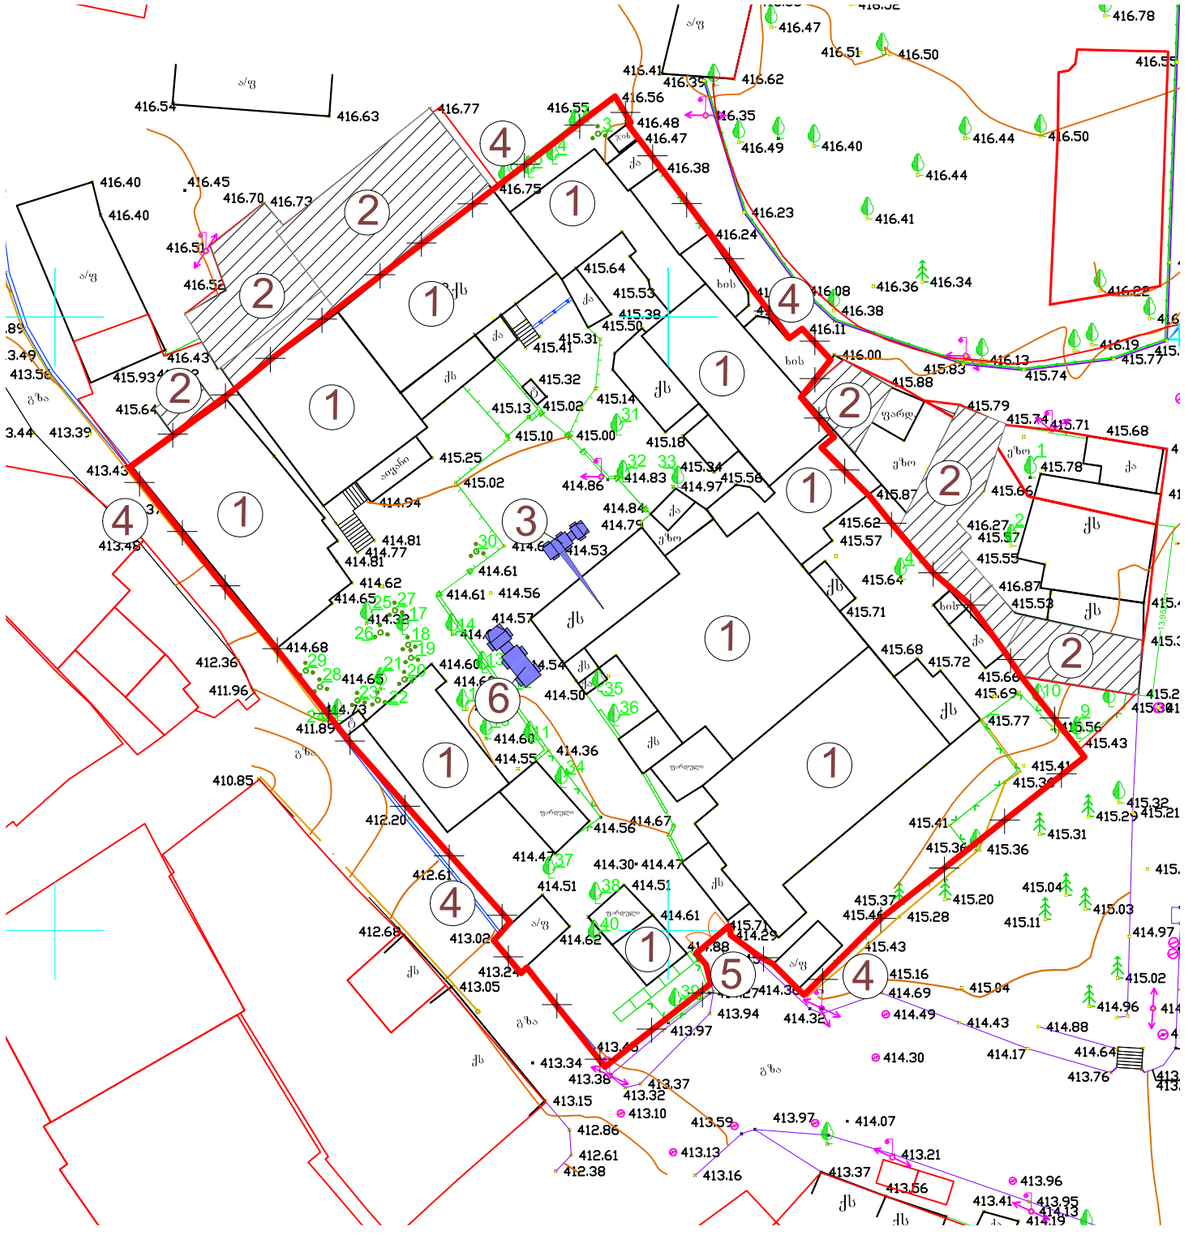

პირობითი აღნიშვნები

- სადემონტაჟო შენობა
- არსებული შენობა
- ღობე

ექსპლიკაცია

1. საპროექტო შენობა
2. არსებული შენობა
3. საავტომობილო ამწე
4. ღობე
5. ჭიშკარი
6. თვითმცლელი ავტო მანქანა

ტექნიკური მონაცემები

1. ტერიტორიის ფართი - - - - 3520.00 მ^2
2. დემონტაჟის ფართი- - - - - - 2278.45 მ^2
3. დემონტაჟის მოცულობა - - - - 6060.15 მ^3
4. შენობის კონსტ.სიმაღლე- - - - 11.20 მ

შ.პ.ს. "კოლხა 07"			ქ.თბილისი,ჭრელაშვილის №1			
დირექტორი		თ.ბაღათურია	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი			
შეასრულა		ა.მაისაშვილი	გენ. გეგმა			
დამკვეთი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მაშტაბი
			პ			1:100

მშენებლობის კალენდარული გარაფიკი

	ჩასატარებელი სამუშაოები	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე						X თვე						XI თვე						XII თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	**ტერიტორიის გარშემო ღობის მოწყობა**			20																																																																			
2	სახურავების დაშლა																								180																																														
3	კარ-ფანჯრების მოხსნა																												180																																									
4	კედლების დემონტაჟი																																190																																								
5	იატაკის დემონტაჟი																												185																																								
6	საძირკვლების დემონტაჟი																																																																								
7	შენობა 2/3 და 27/1 დემონტაჟი																																																																								
8	ტერიტორიიდან ნაგვის გატანა																																																																							
9	ეზოს ტერიტორიის მოწესრიგება																																																																							

შენიშვნა: სადემონტაჟო სამუშაოებისთვის განსაზღვრულია 12 თვე,
დემონტაჟი უტარდება საკადასტრო რუკაზე აღნიშნულ შემდეგ შენობებს: 1/1; 2/3; 3/2; 4/1; 5/1; 6/1; 7/1; 8/1; 9/1; 10/1; 11/1;
12/1; 13/1; 14/1; 15/1; 16/1; 17/1; 18/1; 19/1; 20/1; 21/1; 22/1; 23/1; 24/1; 25/1; 26/1; 27/1; 28/1; 29/1; 30/1; 31/1; 32/1; 33/1; 34/1; 35/1; 36/1; 37/1;
38/1; 39/1; 40/1; 41/; 42/1; 43/1; 44/1; 45/1; 46/1; 47/1.

შ.პ.ს.„კოლხა 07“			ქ.თბილისში, ჭრელაშვილის №1
დირექტორი		თ.ბაღათურია	მშენებლობის ორგანიზაცია
შეასრულა		ა. მაისაშვილი	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი
