ქ. თბილისში, დავით გურამიშვილის გამზირზე №64-ში, მიწის ნაკვეთზე ს.კ. 01.12.01.005.100 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 36 თვე ანუ 1080 სამუშაო დღე

ეტაპები	მშენებლობის ეტაპები ხანგრძლივობა დღეებში	დღეები	წლები, თვეები და სამუშაო დღეები																							
			I წელი						II წელი						III წელი						IV წელი					
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48
			60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080	1140	1200	1260	1320	1380	1440
1	მიწაში ჩაღრმავებული „5-9“ და „ა-გ“ ღერძებში დაჩენილი ორი სართულის (ნიშ. მინუს 6,60 დან 0,00 მ-მდე) მზიდი კონსტრუქციების და კონტურული კედლების ამოყვანა მონოლითური რკინა-ბეტონით.	60	60																							
2	მიწისზედა 5-6 სართულის მზიდი კონსტრუქციების, დიაფრაგმული კედლების, კიბის ბაქნებისა და მარშების ამოყვანა.	60		60																						
3	იგივე სამუშაოები 7-8 სართულებზე	60			60																					
4	იგივე სამუშაოები 9-10 სართულებზე	60				60																				
5	იგივე სამუშაოები 11-12 სართულებზე	60					60																			
6	იგივე სამუშაოები 13-14 სართულებზე	60						60																		
7	იგივე სამუშაოები 15-16 სართულებზე, ასევე მე-15 სართულის ბლოკის თავზე ლიფტის სამანქანო ნაწილის ამოყვანა	60							60																	
8	17-18 სართულების მზიდი კონსტრუქციების, დიაფრაგმული კედლების, კიბის ბაქნებისა და მარშების ამოყვანა.	60								60																
9	იგივე სამუშაოები 19-20 სართულებზე	60									60															
10	იგივე სამუშაოები 21-22 სართულებზე, ლიფტის სამანქანო ნაწილის ამოყვანა	60										60														
11	სახურავის მოწყობა 15 და 22 სართულიან ბლოკებზე	60											60													

12	ფასადის შემომზღუდავი და ბინების გამყოფი კედლების ამოყვანა, აგრეთვე ტიხრების მოწყობა	300													300											
13	ლითონის კარების, მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩაყენება	240															240									
14	საბათქაშე სამუშაოები	240																240								
15	იატაკებს მოსაწყობი სამუშაოები	540																480								
16	ლიფტების დამონტაჟება	60																			60					
17	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები	540																		540						
18	შიდა საინჟინრო ქსელების და კომუნიკაციების მოწყობა,	360																		360						
19	შიდა საინჟინრო ქსელების და კომუნიკაციების გარესთან მიერთება	180																						180		
20	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	120																							120	

მითითება: 1. სამუშაოები სრულდება თეთრი კარკასის დონეზე;

2. ნულოვანი ციკლის სამუშაოების დასრულება გათვალისწინებულია მშენებლობის პირველი წლის პერიოდშივე.

3. მშენებლობის დასრულება უნდა მოხდეს 4 წლის ანუ 1440 სამუშაო დღის პერიოდში;

4. თვეში 30 სამუშაო დღეა, კალენდარულ გრაფიკში სასურველია აღნიშნული 1-2 თვე შეცვალოს სამუშაოთა დამტკიცებული დაწყება-დასრულების თვეების მინიშნებით.

5. კალენდარულ გრაფიკში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას. მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნების გათვალისწინებით.

6. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით თანახმად მოქმედი საქარველოს კანონმდებლობისა.

შეადგინა ინჟ. ნუგზარი მურჯიკნელი

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

DIPLOMA

STU № 003477

This is to certify that Mr./Ms. Nugzar
Name, Surname
Murjikneli

was enrolled in 2000 in Georgian Technical University and in 2005

completed the requirements of Faculty of

Tbilisi External Studies

Bachelor's Degree of the University

with major in Construction Management

By the decision of the State Qualification Commission September
Month, Day, Year
25, 2005 Mr. Nugzar Murjikneli
Name, Surname
was awarded the Academic Degree of

Bachelor of Economics and Management

Seal

Rector

Dean

City: Tbilisi

Registration # 03856

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დიპლომი

STU № 003477

ეძლევა ნუგზარ მურჯიკნელს

მასზედ, რომ იგი 2000 წელს ჩაირიცხა და 2005

წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

თბილისის დაუსწრებელი სწავლების

ფაკულტეტის

ბაკალავრიატის სრული კურსი მშენებლობის მენეჯმენტის

სპეციალობით

საკვალიფიკაციო კომისიის 2005 25. 9 გადაწყვეტილებით
(წელი, რიცხვი, თვე)

ნუგზარ მურჯიკნელს მიენიჭა

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და ეკონომისტ – მენეჯერის

კვალიფიკაცია

ბ.ა.

რექტორი

დეკანი

ქალაქი თბილისი

სარეგისტრაციო ნომერი 03856

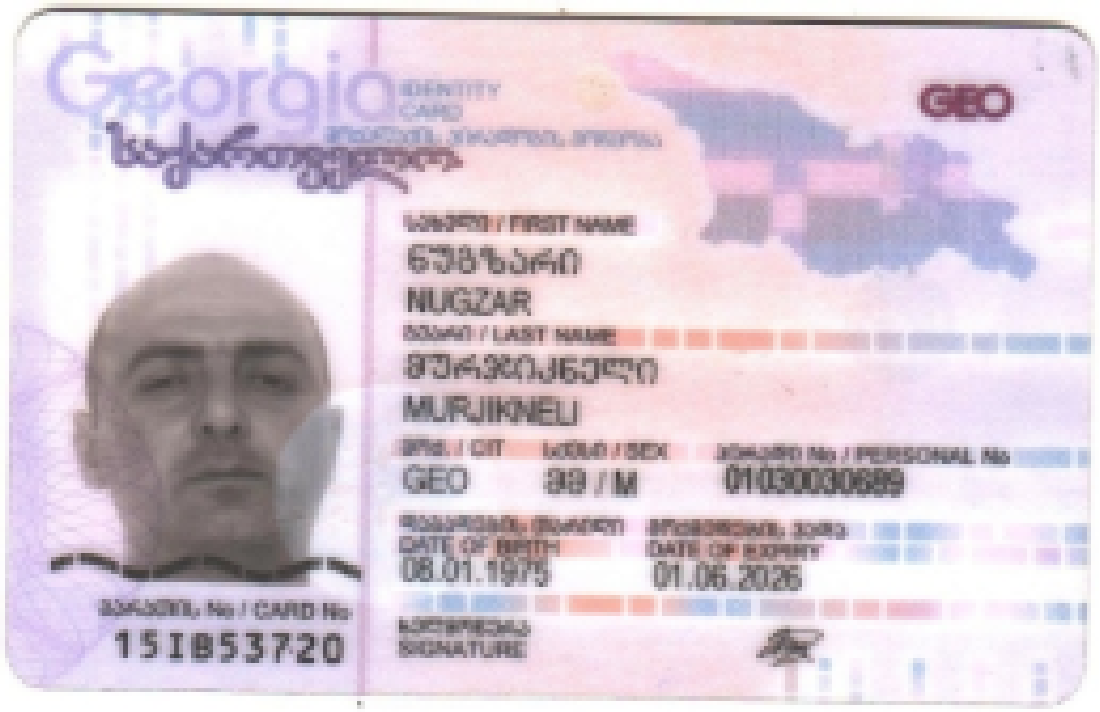
Georgia
IDENTITY CARD
GEO
NUGZAR
MURJIKNELI
GEO
39 / M
01030030689
DATE OF BIRTH
08.01.1975
DATE OF EXPIRY
01.06.2026
CARD No
15IB53720

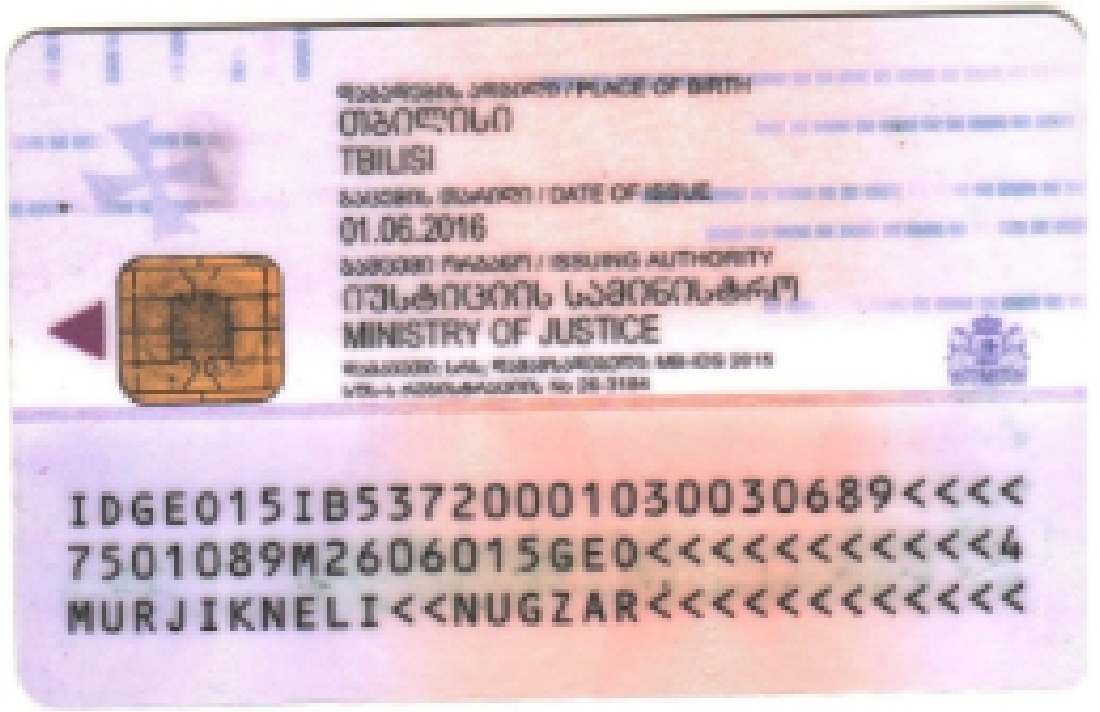
TBILISI
01.06.2016
MINISTRY OF JUSTICE
IDGE015IB53720001030030689<<<<
7501089M2606015GE0<<<<<<<<<<<4
MURJIKNELI<<NUGZAR<<<<<<<<<<<
