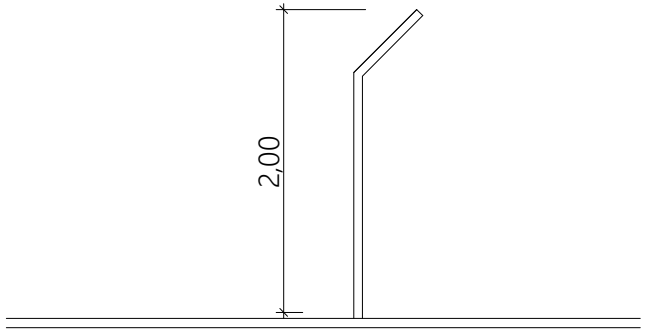

2,00

სამუშაოთა ჩამონათვალი

10 20 30 10 20 30

1 წელი 2 წელი
№ დღე

I მშენებლობის პირველი რიგი

მოსამზადებელი სამუშაოების პერიოდი

1et. 110

2et. 40

II მშენებლობის მეორე რიგი

ძირითადი სამუშაოების პერიოდი

1et.

2et.

3et.

130

140

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ღობე

4et.

110

90

120

1:100

შეასრულა

p

სტადია ფურცელი ფურცლები მაშტაბი

მშენებლობის ორგანიზაცია
ე. ლომაძე მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ქ.თბილისი, zahesis დასახლება, ალ yazbeqis ქ. #30

72.12.02.507

5et.

შენობა-ნაგებობის შიგა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;

მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები;

შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები; ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის

მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე.

შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები სამუშაოები;

შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები.

შესრულებულია

შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის

(არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.

შენობა-ნაგებობის სახურავის კონსრტუქციის და გადახურვის მოწყობა.

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა;შენობა-ნაგებობისლოკალური საერთო

სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა.

შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება

შესრულებულია

მოსამზადებელი სამუშაოები რომელიც დაკავშირებულია ღია სამშენებლო მოედნის

მოწესრიგებასთან მათ შორის არსებული ნაგებობების დაშლასთან და სამშენებლო

ნარჩენების გატანასთან,შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა და მიწისქვეშა

საინჟინრო კომუნიკაციების გადატანასთან.

შესრულებულია
