
	სამუშაოს დასახელება	თვე
	სამუშაოების წარმოების ზოგადი განრიგი ობიექტზე: თბილისი, ამაღლების ქ. 47_რეკონსტრუქცია	24
1	მოსამზადებელი სამუშაოები / მობილიზაცია / დემობილიზაცია	5
	სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა	
	ამწე მექანიზმების მონტაჟი	
	სასაწყობო სივრცის ორგანიზება	
	შტაბის ორგანიზება	
	დროებითი ელექტრო მომარაგება და საინჟინრო უზრუნველყოფა	
	საწყობისა და დასატვირთი ადგილების ორგანიზება	
2	ფაზა 1.1_საერთო სამშენებლო სამუშაოები	8
	საპილოტე ოთახის მოწყობა	
	სადემონტაჟო სამუშაოები	
	სამონტაჟო სამუშაოები _ ბრტყელი სახურავის მოწყობა	
	სამონტაჟო სამუშაოები _ტიხრების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით	
	საინჟინრო აღჭურვილობის მონტაჟი_საკანალიზაციო დგეარების მოწყობა	
	სამონტაჟო სამუშაოები - საქვაბის განთავსება	
	სამონტაჟო სამუშაოები - სავენტილაციო სისტემის განთავსება	
	სამონტაჟო სამუშაოები - ქარსაცავი შუშის ბარიერი	
3	ფაზა 1.2_საერთო სამშენებლო სამუშაოები	9
	სამონტაჟო სამუშაოები_მონოლითი	
	სამონტაჟო სამუშაოები_გამაგრება	
	სამონტაჟო სამუშაოები_ტიხრები	
	სამონტაჟო სამუშაოები_საინჟინრო აღჭურვლობა_მაგისტრალების მოწყობა	
	სამონტაჟო სამუშაოები_საინჟინრო აღჭურვლობა_ლიფტების მონტაჟი	
	სამონტაჟო სამუშაოები_ჭერის კონტრუქციის მონტაჟი	
	სამონტაჟო სამუშაოები_იატაკების მოწყობა	
	ქარსაცავი შუშის ბარიერი და პერგოლა	
4	ფაზა 2.1_მოსაპირკეთებელი სამუშაოები_შავი სამუშაოები	4
5	ფაზა 2.2_მოსაპირკეთებელი სამუშაოები_სუფთა სამუშაოები	5
6	ფაზა 2.3_მოსაპირკეთებელი სამუშაოები_სერვერისა და შიდა ქსელის მოწყობა	4
7	ფაზა 2.4_ავეჯისა და დეკორაციის მოწყობა	3
8	ფაზა 3_საინჟინრო სისტემის ტესტირება და ჩართვა	2
9	ფაზა 4_გარე ქსელის მოწყოობა	8
10	ფაზა 5_ფასადის განათების მოწყობა	6
11	ფაზა 6_ტერიტორიის გამწვანება	5
12	ფაზა 7_ობიექტის ექსპუატაციაში გაშვება	4

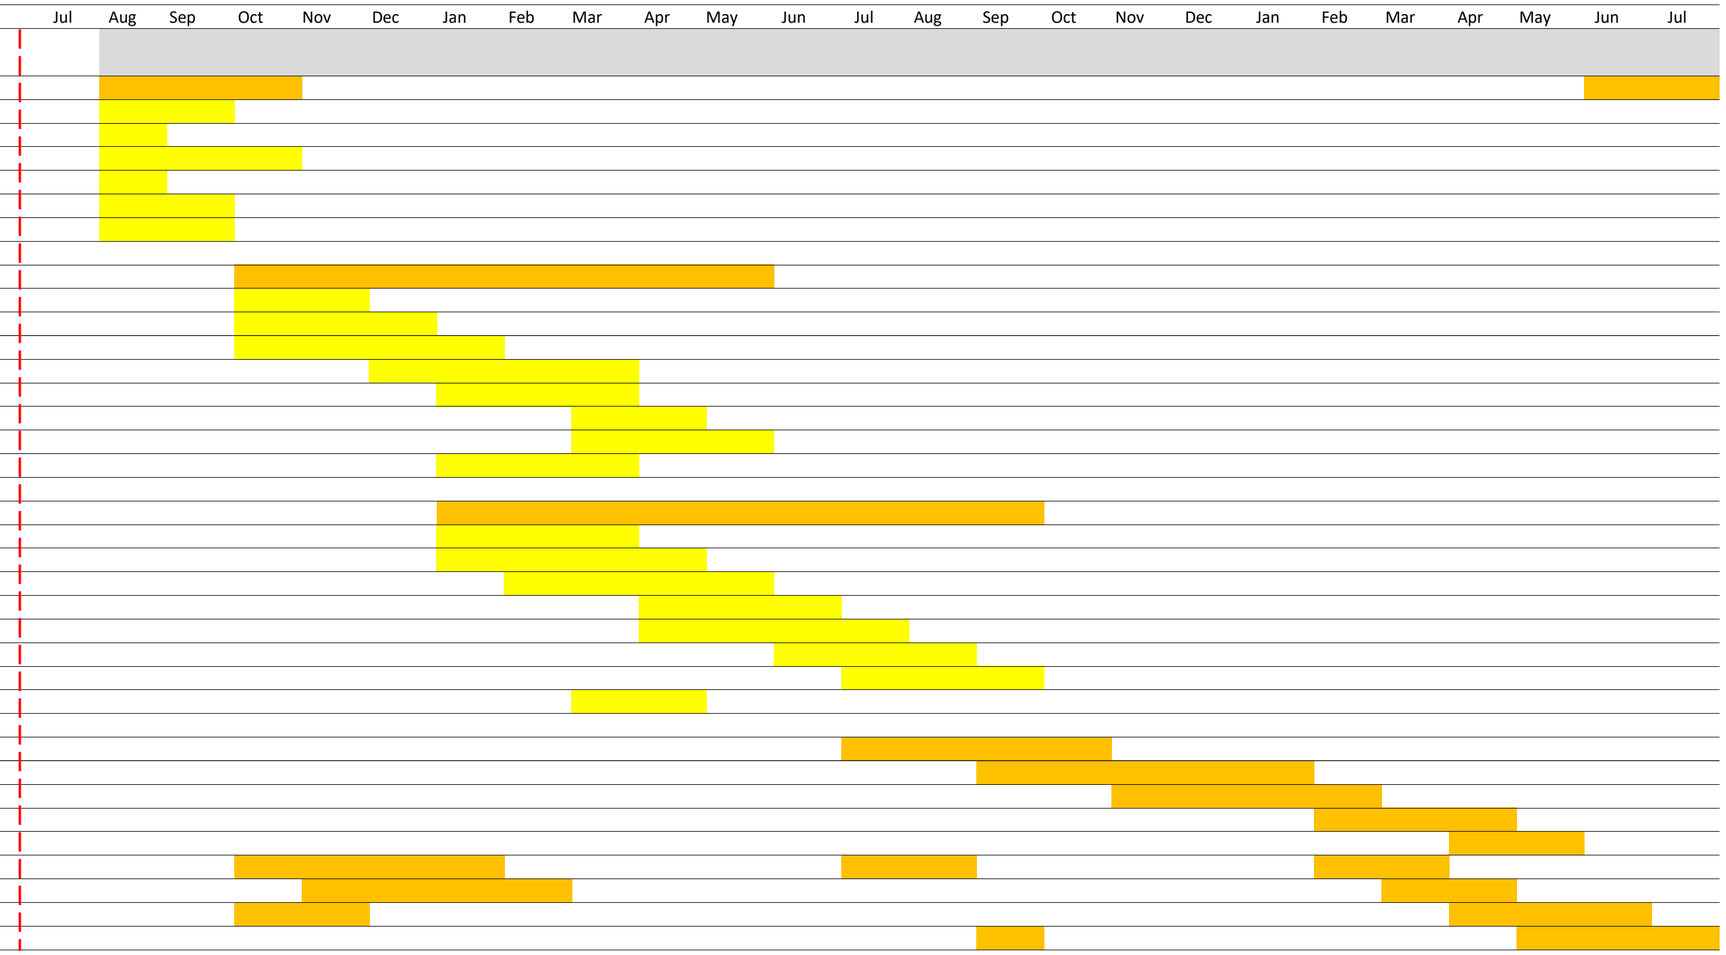

შემსრულებელი: თემო კალომძლეწავი
