მრავალფუნქციური კომპლექსი/ შენობა

ქ თბილის, გამზირი აკაკი წერეთლის#35#37#39

შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების
კალენდარული გრაფილი

24 თვე

შემსრულებელი
ალექსი მინევიჩი

2023

			თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ლევან სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს მოთხოვნები																										
	არსებულ შენობა ნაგებობებზე მონიტორინგი	-	24																								
	01.13.06.015.004 - ა. წერეთლის გამზ. №39 ერთსართულიანი შენობა ნაგებობა 01.13.06.015.010 - ვ. ბაგრატიონის ქ.№56 ორსართულიანი შენობა ნაგებობა 01.13.06.015.001 - ვ. ბაგრატიონის ქ.№54 ერთსართულიანი შენობა ნაგებობა 01.13.06.015.003 - ა. წერეთლის გამზ. №41;ევდოშვილის ქ.№27 განთავსებული №1-დან №28 ჩათვლით : ერთსართულიანი ორსართულიანი სამსართულიანი და ოთხსართულიანი შენობა ნაგებობა 01.13.06.015.012 - სოხუმის ქ.№4-6ა-ში ბლოკი №1 ბლოკი №2 ბლოკი №3																										
	გამაგრებითი სამუშაოებისთვის ხიმინჯების მოწყობა; პერიმეტრზე გრუნტის წყლების შესაკავებელი მონოლითური კედლების მოწყობა		10																								

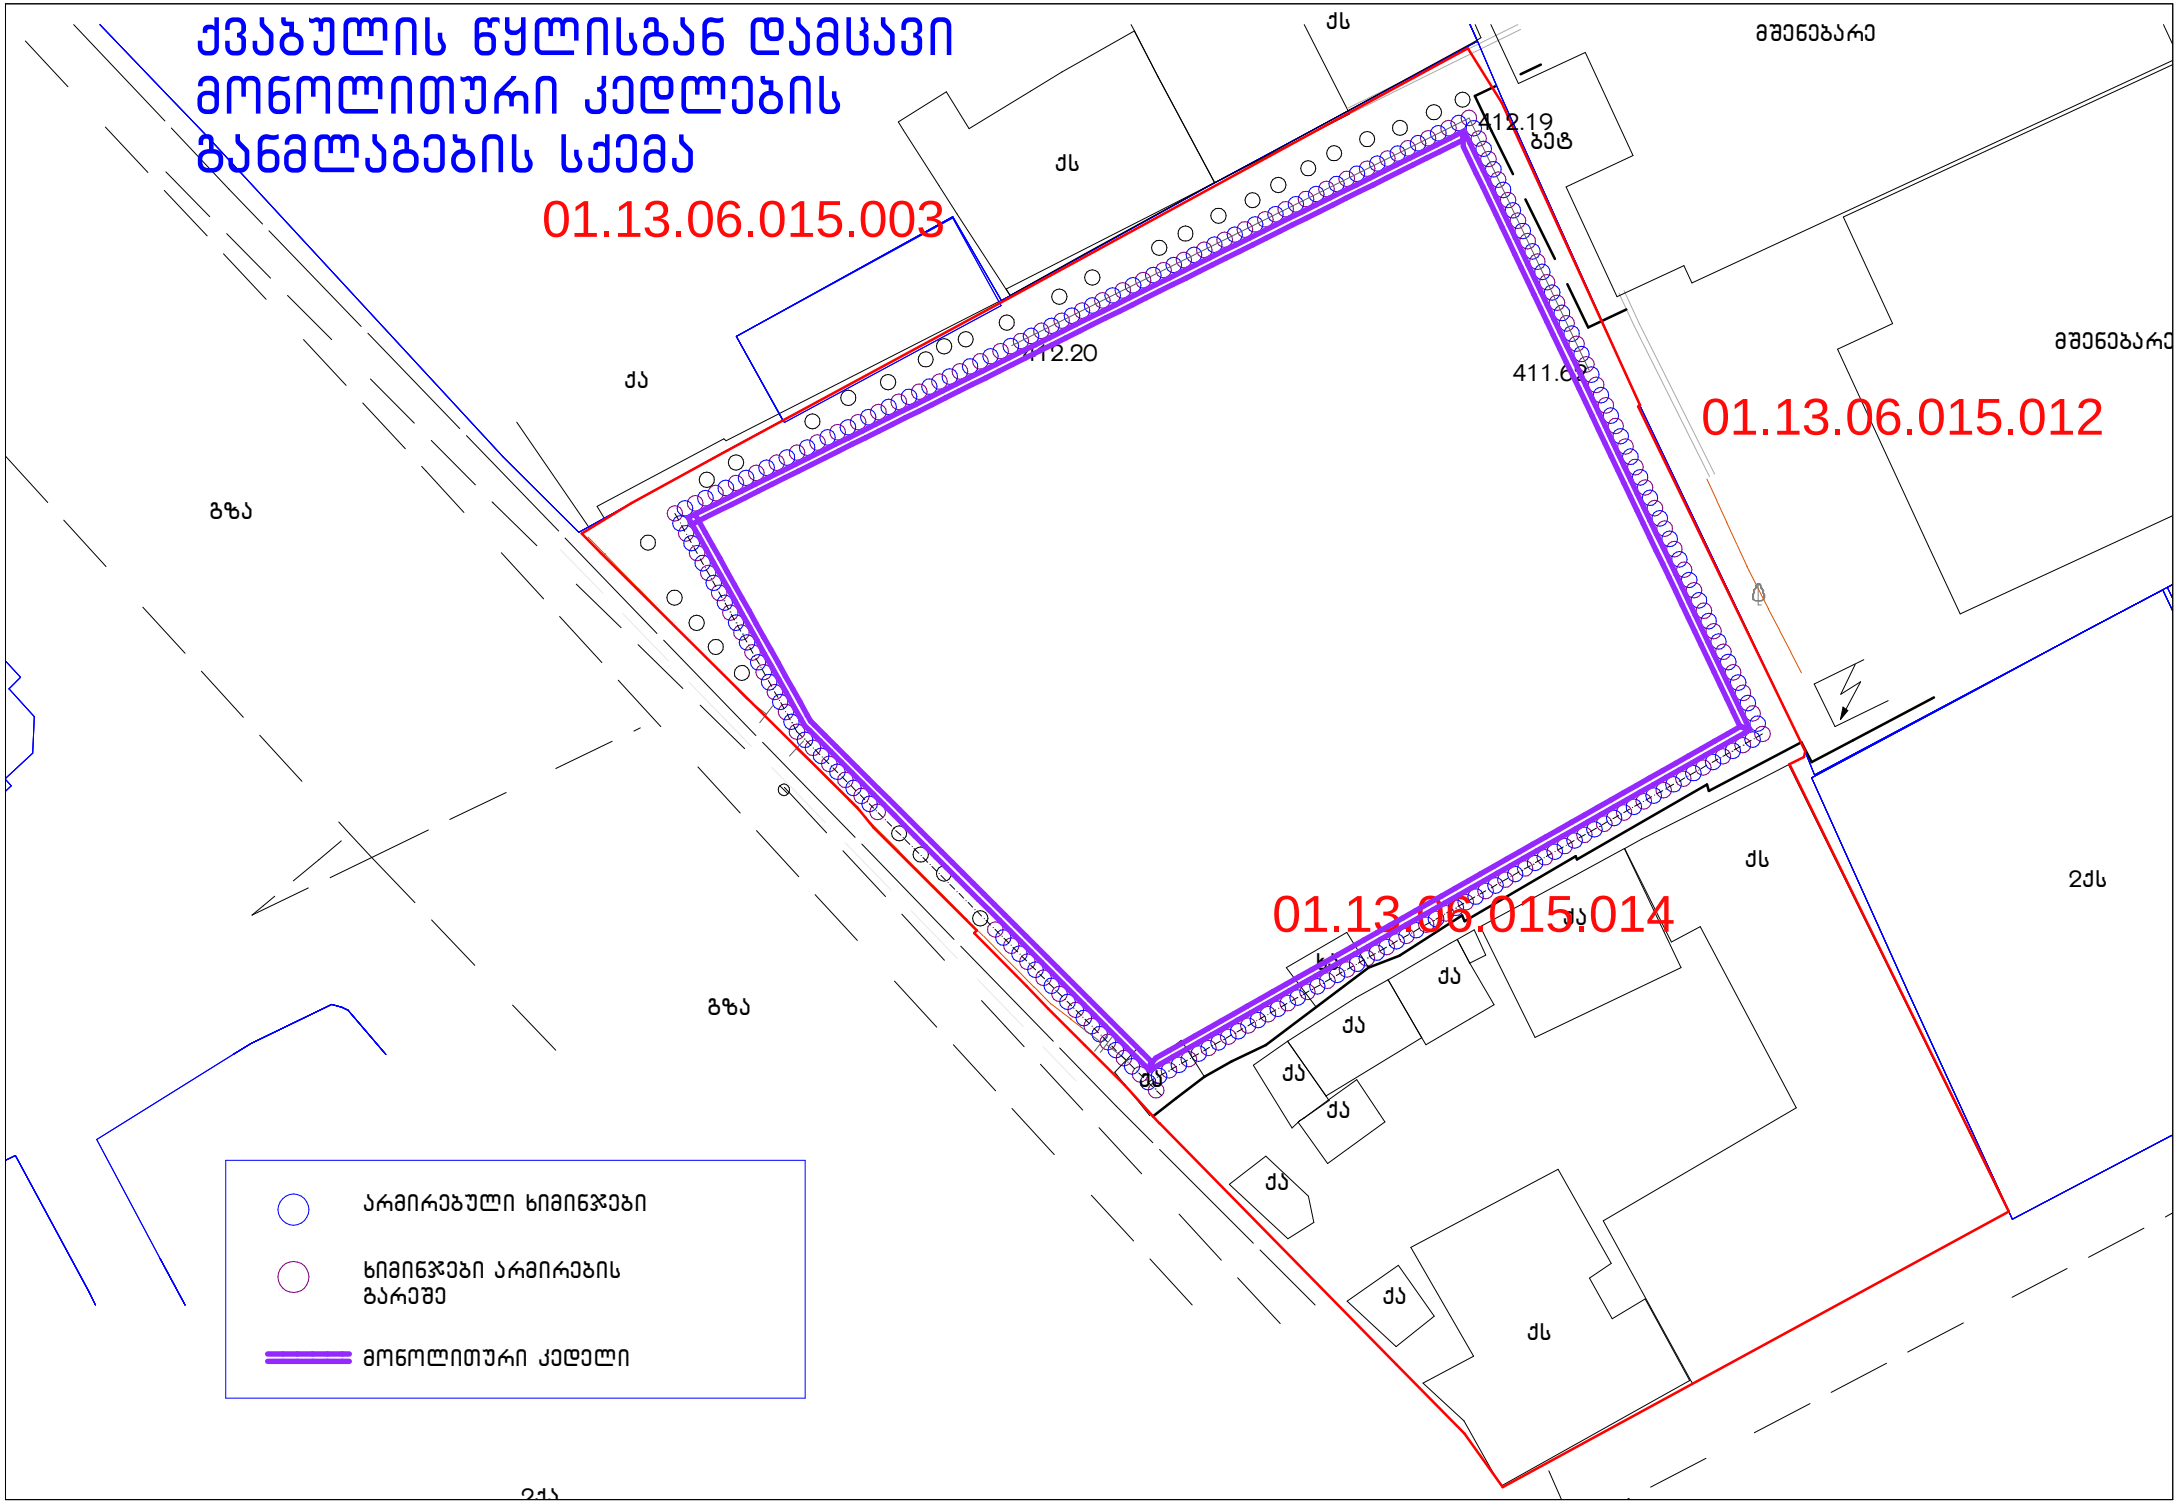
ქვაბულის წყლისგან დამცავი
მონოლითური კედლების
განმლაგების სქემა
01.13.06.015.003
01.13.06.015.012
01.13.06.015.014
412.19
412.20
411.63
ბეტ
ქს
მშენებარე
ქა
გზა
2ქს
არმირებული ხიმინჯები
ხიმინჯები არმირების
გარეშე
მონოლითური კედელი

დასასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების

კალენდარული გეგმა ---სრული თ = 24.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
№	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
7	გარე კედლების დეკორატიული პანელებით მოპირკეთება და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
10	სხვადასხვა სამუშაოები																			

	ლევან სამხარაულის ეროვნული ბიუროს გასათვალისწინებელი ღონისძიებები	-																		
	არსებულ მომიჯნავე შენობა-ნაგებობებზე მონიტორინგის განხორციელება	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
№	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
7	გარე კედლების დეკორატიული პანელებით მოპირკეთება და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
10	სხვადასხვა სამუშაოები																			

	ლევან სამხარაულის ეროვნული ბიუროს გასათვალისწინებელი ღონისძიებები	-																		
	არსებულ შენობა-ნაგებობებზე მომიჯნავე მონიტორინგის განხორციელება	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
№	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
7	გარე კედლების დეკორატიული პანელებით მოპირკეთება და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
10	სხვადასხვა სამუშაოები																			

	ლევან სამხარაულის ეროვნული ბიუროს გასათვალისწინებელი ღონისძიებები	-																		
	არსებულ მომიჯნავე შენობა-ნაგებობებზე მონიტორინგის განხორციელება	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
№	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
7	გარე კედლების დეკორატიული პანელებით მოპირკეთება და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
10	სხვადასხვა სამუშაოები																			

	ლევან სამხარაულის ეროვნული ბიუროს გასათვალისწინებელი ღონისძიებები	-																		
	არსებულ მომიჯნავე შენობა-ნაგებობებზე მონიტორინგის განხორციელება	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
№	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
7	გარე კედლების დეკორატიული პანელებით მოპირკეთება და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
10	სხვადასხვა სამუშაოები																			

	ლევან სამხარაულის ეროვნული ბიუროს გასათვალისწინებელი ღონისძიებები	-																		
	არსებულ შენობა-ნაგებობებზე მომიჯნავე მონიტორინგის განხორციელება	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
№	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
7	გარე კედლების დეკორატიული პანელებით მოპირკეთება და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
10	სხვადასხვა სამუშაოები																			

	ლევან სამხარაულის ეროვნული ბიუროს გასათვალისწინებელი ღონისძიებები	-																		
	არსებულ შენობა-ნაგებობებზე მომიჯნავე მონიტორინგის განხორციელება	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
№	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
7	გარე კედლების დეკორატიული პანელებით მოპირკეთება და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
10	სხვადასხვა სამუშაოები																			

	ლევან სამხარაულის ეროვნული ბიუროს გასათვალისწინებელი ღონისძიებები	-																		
	არსებულ შენობა-ნაგებობებზე მომიჯნავე მონიტორინგის განხორციელება	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
№	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
7	გარე კედლების დეკორატიული პანელებით მოპირკეთება და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
10	სხვადასხვა სამუშაოები																			

	ლევან სამხარაულის ეროვნული ბიუროს გასათვალისწინებელი ღონისძიებები	-																		
	არსებულ შენობა-ნაგებობებზე მომიჯნავე მონიტორინგის განხორციელება	-																		
