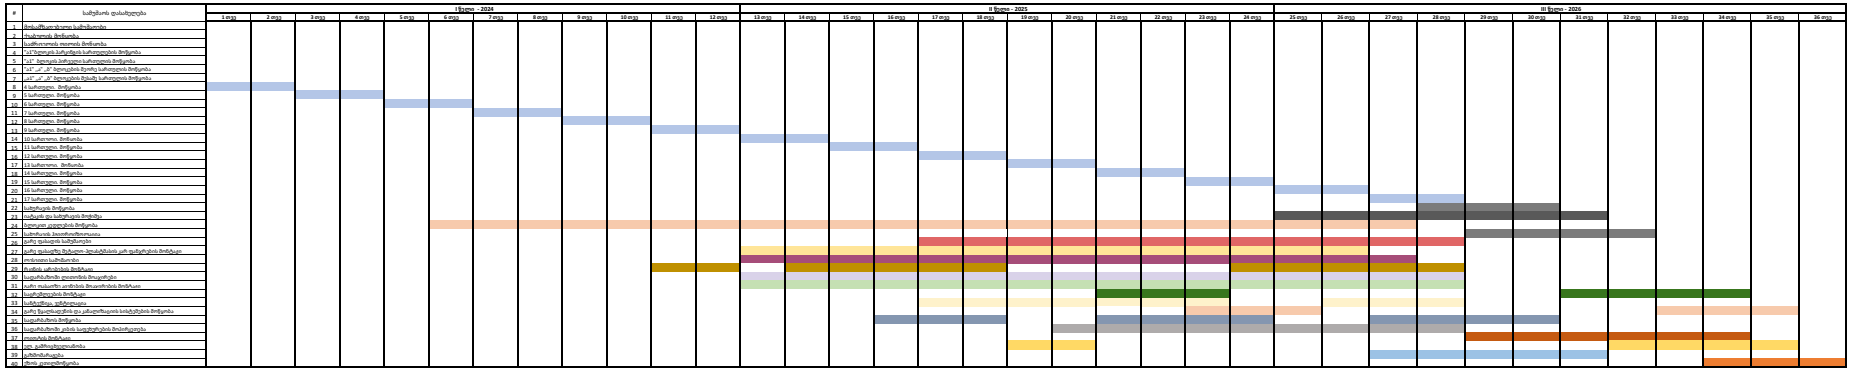

1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე 12 თვე 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 17 თვე 18 თვე 19 თვე 20 თვე 21 თვე 22 თვე 23 თვე 24 თვე 25 თვე 26 თვე 27 თვე 28 თვე 29 თვე 30 თვე 31 თვე 32 თვე 33 თვე 34 თვე 35 თვე 36 თვე

1 მოსამზადებელი სამუშაოები 2 ქვაბულის მოწყობა 3 საძრკველის ფილის მოწყობა 4 "ა1"ბლოკის პარკინგის სართულების მოწყობა 5 "ა1" ბლოკის პირველი სართულის მოწყობა 6 "ა1" ,ა" ,ბ" ბლოკების მეორე სართულის მოწყობა 7,ა1" ,ა" ,ბ" ბლოკების მესამე სართულის მოწყობა 8 4 სართული. მოწყობა 9 5 სართული. მოწყობა

10 6 სართული. მოწყობა
11 7 სართული. მოწყობა
12 8 სართული. მოწყობა
13 9 სართული. მოწყობა
14 10 სართული. მოწყობა
15 11 სართული. მოწყობა
16 12 სართული. მოწყობა
17 13 სართული. მოწყობა
18 14 სართული. მოწყობა
19 15 სართული. მოწყობა
20 16 სართული. მოწყობა
21 17 სართული. მოწყობა
22 სახურავის მოწყობა
23 იატაკის და სახურავის მოჭიმვა
24 ბლოკით კედლების მოწყობა
25 სახურავის ჰგიდროიზოლაცია
26 გარე ფასადის სამუშაოები
27 გარე ფასადზე მეტალო-პლასტმასის კარ ფანჯრების მონტაჟი
28 ლესვითი სამუშაოები
29 რკინის კარებების მონტაჟი
30 სადარბაზოში ლითონის მოაჯირები
31 გარე ფასადზე აივნების მოაჯირების მონტაჟი
32 საცრემლეების მონტაჟი
33 სანტექნიკა, ვენტილაცია
34 გარე წყალსადენის და კანალიზაციის სისტემების მოწყობა
35 სადარბაზოს მოწყობა
36 სადარბაზოში კიბის საფეხურების მოპირკეთება
37 ლიფტის მონტაჟი
38 ელ. გამრიცხველიანობა
39 გაზმომარაგება
40 ეზოს კეთილმოწყობა

II წელი - 2026
სამუშაოს დასახელება I წელი - 2024 I წელი - 2025
