შ.პ.ს „დემე“

დამკვეთი: შ.პ.ს. ,,ვესტა“.

ობიექტი: ქ. თბილისი, ლ. დევდარიაის ქუჩა, მე-2 შესახვევი N29, (სკ. 01.81.08.276.606)

საწარმოო და სასაწყობე შენობების მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ყურადღება!!! (შენიშვნა)

სამშენებლო მოედნიდან გამომავალი ყველა სატრანსპორტო საშუალებები და მანქანა მექანიზმების სავალი თვლები (ბორბლები) უნდა იქნას გარეცხილი

დირექტორი: /ლ. ხელია/

შეადგინა: /გ. ამბროლაძე/

ქ. რუსთავი. 2024 წელი

სარჩევი

1. სამშენებლო მოედნისა და ობიექტის დახასიათება;

2. მშენებლობის ხანგრძლივობის დადგენა;

3. მშენებლობის განხორციელების ტექნოლოგიური ნორმალი;

4. მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა;

5. მშენებლობის წაროების წესები და მეთოდიკა;

6. მოთხოვნილებები კადრებზე და ადმინისტრაციულ საყოფაცხოვრებო სათავსებზე;

7. მოთხოვნილებები სამშენებლო ავტოტრანსპორტზე;

8. რეკომენდებული ამწეების, სამშენებლო მანქანა-დანადგარების, მექანიზმების და ინსრუმენტების შერჩევა;

9. მშენებლობაზე შრომის ელექტრო და ხანძარუსაფრთხოების წესების დაცვა;

10. ინსტრუმენტალური კონტროლი;

11. მითითებები მიწის სამუშაოთა შესრულებაზე;

12. მითითებები მიწისზედა სამუშაოთა წარმართვის თაობაზე;

13. ეკოლოგია და ბუნების დაცვის საკითხები;

14. მოპ-ის შედგენისათვის ნორმატიული ბაზა

1.სამშენებლო მოედნისა და ობიექტის დახასიათება

1.1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი მოიცავს ქ. თბილისში, ლ. დევდარიანის მე-2 შესახვევი N 29, შ.პ.ს. ,,ვესტა"ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. 01.81.08.276.606) საწარმოო და სასაწყობე შენობების მოწყობის პროექტს.

1.2. სამშენებლო მოედანზე მისვლა ხორციელდება ადგილობრივი (საქალაქო) არსებული გზით, ნაკვეთის ფართობია 2000,0 მ2. ნაკვეთი გეგმაში მართკუთხა ფორმისაა, გააჩნია ქანობი 1.0-2,5%. საპროექტო მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდია 01.81.08.276.606.

1.3. მიწის ნაკვეთის ტექნიკური მაჩვენებელი შემდეგია:

- ტერიტორიის ფართი- 2000,0 მ²;
- საპროექტო შენობა-ნაგებობის მოშენების ფართი - 1378.50 მ²;

1.4. სამშენებლო მზიდ კონსტრუქციებში გამოყენებულია ბეტონი კლასით B-25.

1.5. სამშენებლო ტერიტორიის სეისმურობა შეადგენს 8 ბალს, თოვლის, ნორმატიული დატვირთვა შეადგენს 50კგმ/მ². ქარის ჩქაროსნული დაწნევა 70კგმ/მ ², ზაფხულის საანგარიშო ტემპერატურა 23.6°C, ზამთრისა-8°C.

1.6. მცირე მოცულობის ობიექტებისათვის, მოცულობით 18 000 კუბურ მეტრზე ნაკლები სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა აუცილებელი არ არის. მოპ-ის შედგენის საჭიროებით დაშვებულია მშენებლობის საორიენტაციო ღირებულების დადგენა. საქართველოში მიღებული გამოცდილებით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ღირებულება ჯდება 900-1200 ლარი. აქვე უნდა აღინიშნოს რომ სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობების პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობაზე სამუშაოთა განხორციელების წინასწარ ღირებულებას და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიჯარეს შორის გადახდის საშუალებას. მათ შორის ანგარიშსწორება უნდა მოხდეს ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით.

1.7. მშენებლობის მომარაგება მასალებითა და ნაკეთობებით ორიენტირებულია ბაზარზე.

1.8. სამუშაოთა მწარმოებელმა განურჩევლად უნდა იხელმძღვანელოს დამტკიცებული საპროექტო დოკუმენტაციით. კონსტრუქციულ ან სხვა საპროექტო გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანა ავტორებთან შეთანხმებისა და ნახაზების კორექტირების გარეშე დაუშვებელია, რაც უნდა მოხდეს დადგენილი წესით შესაბამისი ხელმოწერებით ავტორებისა და პროექტის მთავარი არქიტექტორის მხრიდან.

1.9. მშენებლობის განხორციელებასთან და წარმართვასთან დაკავშირებული ტექნიკური საკითხები, გაანგარიშებები და რეკომენდაციები ჩამოყალიბებული და განმარტებულია მოპ-ის ცალკეულ ნახაზებზე შესაბამის თავებში.

2.მშენებლობის ხანგრძლივობის დადგენა

2.1. მშენებლობის განხორციელების თვალსაზრისით საპროექტო შენობა სირთულით საშუალო კატეგორიისაა.

2.2. მშენებლობის ხანგრძლივობის დასადგენად ხელმძღვანელობენ სნ და წ. 1.04.03-85-ით, „მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები და მარაგნაკეთი“.

2.3. მშენებლობის ფინანსური უზრუნველყოფის გათვალისწინებით დამკვეთსა და მშენებელ ფირმას ვურჩევდით მშენებლობის დაგეგმვას გეგმიური ხანგრძლივობით 540 დღის განმავლობაში, რასაც ხელი უნდა შეუწყოს რაიონის ზომიერმა და რბილმა კლიმატურმა პირობებმა.

2.4. ზემოთ აღნიშნული მოსაზრებებისა და გაანგარიშებების საფუძველზე შედგა მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი მშენებლობის ცალკეულ ეტაპებზე. იხილეთ შესაბამისად პარაგრაფი №3.

3. მშენებლობის განხორციელების ტექნოლოგიური ნორმალი

3.1. მშენებლობის კალენდარული გეგმით გათვალისწინებული ფინანსური უზრუნველყოფისა და შესაძლებლობების საფუძველზე უნდა მოხდეს სამუშაოთა თანამიმდევრობის განსაზღვრა.

3.2. მშენებლობის განხორციელების გეგმიური ხანგრძლივობა 540 დღეა:

4. მსენებლობის საინჟინრო მომზადება და მშენებლობის წარმართვის ცალკეული ეტაპები

4.1. ჩვენს მიერ შედგენილი მოპ-ი ითვალისწინებს სნ და 3.01-01-85 „სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია“ მოთხოვნილებებს მშენებლობაზე ხანძარსაწინააღმდეგო და მშენებლობის უსაფრთხო წარმოების ღონისძიებათა დაცვით.

4.2. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის დამუშავებას საფუძვლად დაედო შემდეგი მონაცემები:

- დავალება პროექტირებაზე;
- პროექტით მიღებული კონსტრუქციული გადაწყვეტები;
- მშენებლობის რაიონის სიტუაციური გეგმა;
- გეოდეზიური გეგმები და პროფილები;
- საინჟინრო- გეოლოგიური გამოკვლევების მონაცემები;

4.3. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი შესრულებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესების და სახელმწიფო სტანდარტების (მათ შორის ხანძარფეთქებადი უსაფრთხოების) შესაბამისობით.

4.4. მიიღებს თუ არა დამკვეთისგან დამტკიცებულ საპროექტო დოკუმენტაციას, სამშენებლო ორგანიზაცია საჭიროების შემთხვევაში ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების პროექტს. ამ პროექტის შედგენა უნდა ხდებოდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისობით.

4.5. მშენებლობის დაწყება დაიშვება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო ექსპერტიზის სამმართველოს მიერ დამტკიცებისა და მის საფუძველზე ქალაქის მერიის სამსახურიდან სათანადო ნებართვის აღების შემდეგ, აუცილებელია სამშენებლო მოედნის დროებითი ხის ან მავთულბადოვანი ღობით.

4.6. მშენებლობის უზრუნველყოფა ელექტროენერგიითა და წყლით უნდა მოხდეს საქალაქო ქსელებიდან თელასთან და თბილწყალკანალთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

4.7. გეოდეზიურ- დაკვალვითი სამუშაოები სრულდება სნ და წ. 3.01-01-85 „გეოდეზური სამუშაოები მშენებლობაში მოთხოვნათა გათვალისწინებით. წითელ ხაზებში მოქცეული ტერიტორია უნდა დადასტურდეს ქალაქის მთავარი არქიტექტორის სამსახურის მიერ შენობის დაკვალვასთან ერთად.

4.8. ყველაზე საპასუხისმგებლო და შრომატევად სამუშაოდ გვევლინება დაარმატურებისა და დაბეტონების პროცესები, რომელთა წარმართვაც უნდა მოხდეს თანამედროვე ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით. ქარგილების უნდა იყოს ინვენტარულ-გადასაადგილებელი, ადვილად დასაშლელი და დიდგაბარიტული, არმატური ნაკეთობების დამზადება სასურველია საწარმოში ადგილზე მათი მოტანითა და საპროექტო მდგომარეობაში ჩაწყობით, ხოლო ბეტონის მიწოდებისათვის უნდა

გამოვიყენოთ მიქსერები და ბეტონდამჭიხნი დანადგარები ბეტონის აწოდებით სართულებზე მილსადენებში. სამუშაოები უნდა შესრულდეს სნ და წ. III-15-80-ით გათვალისწინებული მოთხოვნების სრული დაცვით.

4.9. სამშენებლო წარმოების უწყვეტობისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მშენებლობის წარმართვა ცხრილში ჩამონათვალი მანქანა-მექანიზმებითა და დანადგარებით.

4.10. მშენებლობის ცალკეულ ეტაპებზე და მათ წარმართვაზე უფრო დეტალურად იხილეთ კალენდარული გეგმა და სამშენებლო გენგეგმა.

4.11. მშენებლობა აუცილებელია წარიმართოს დამტკიცებული პროექტის სრული შესაბამისობით. მშენებლობის პროცესში ობიექტური მიზეზებით ნახაზებში ცვლილებების შემთხვევაში გადაწყვეტილებები უნდა შეთანხმდეს ავტორებთან, მათთან ოფიციალური ნებართვისა და ახალი ნახაზების გამოშვებით.

4.12. მშენებლობის მასალა-ნაკეთობებით მომარაგება ორიენტირებულია ბაზარზე და სამშენებლო ფირმის საწარმოო ბაზაზე. აღნიშნულის გამო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით დადგენილია მშენებლობის წინასწარი ღირებულება და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიჯარეს შორის გადახდის საშუალებას. მათ შორის ანგარიშსწორება ხდება დანახარჯების მიხედვით სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

5. მშენებლობის წარმოების წესები და მეთოდები

5.1. მშენებლობის ორგანიზაცია და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა წარმართვა უნდა მოხდეს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისობით. 1987 წ. მშენებლობის სამინისტრომ ქართულ ენაზე გამოსცა კრებული-სამახსოვრო „სამშენებლო წარმოების ნორმები და წესები“ ამონაკრები მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტებიდან.

5.2. მოედნის მოჭანდაკებისა და საძირკვლის ქვეშ ქვაბულის ამოღების სამუშაოები უნდა წარიმართოს მექანიზებული წესით, თანახმად სნ და წ. 3.02.01-83-ისა.

5.3. როგორც აღინიშნა ყველაზე შრომატევად და საპასუხისმგებლო სამუშაოებად გვევლინება დაარმატურებისა და დაბეტონების პროცესები. მათი შესრულება აუცილებელია სნ და წ.III-15-76 მოთხოვნილებების დაცვით.

5.4. ფუძე საძირკვლების მოწყობისას ხელმძღვანელობენ სნ და წ. 3.02.01-83 ნორმებით ფუძეები და საძირკვლები.

5.5. ქვემოთ ჩამოთვლილია მოქმედი ნორმები და წესები, რომლებითაც უნდა იხელმძღვანელოს სამშენებლო ფირმამ, სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოების დროს:

- სნ და წ. III-17-78 „ქვის კონსტრუქციები“ - სნ და წ. III-18-79 „ლითონის კონსტრუქციები“.

- სნ და წ. III-19-81 „ხის კონსტრუქციები“;
- სნ და წ. III-20-74 „ბურულები, ჰიდროიზოლაცია, ორთქლიზაცია და თბოიზოლაცია“;
- სნ და წ. 3.04.03-85 „კოროზიისაგან დაცვა“;
- სნ და წ. III-29-79 „გაზით მომარაგება, შიდა მოწყობილობა, გარე ქსელები და ნაგებობები“;
- სნ და წ. III-30-79 „წყალმომარაგება და თბომომარაგება; გარე ქსელები, ნაგებობები;
- სნ და წ. III-33-79 „ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები“;
- სნ და წ. III-10-78 „ტერიტორიის კეთილმოწყობა“;
- სნ და წ. III-4-80 „უსაფრთხოების ტექნიკა“;
- სახანძრო უსაფრთხოების წესები სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოების დროს;
- სნ და წ. 1.06.05-85 „მშენებლობისადმი საპროექტო ორგანიზაციების მიერ საავტორო ზედამხედველობა“;
- ინსტრუქცია „სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოთა ხარისხის შეფასების შესახებ“;
- ინსტრუქცია მშენებლობით დამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება“;

5.6. აგრეთვე საჭიროა საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული შემდეგი კანონებით ხელმძღვანელობაც:

- გარემოს დაცვის თაობაზე, 1996 წელი;
- წყლის გამოყენების შესახებ, 1997 წელი;
- მავნე ქიმიური ელემენტები , მათი კლასიფიკაცია და უსაფრთხოება , 1998 წელი.

5.7. გარემოს დაცვის შესახებ კანონი განსაზღვრავს ჰაერის დაბინძურების, წყლის დაბინძურების, წყლის აღებისა და ჩაშვების, ნახაზების უტილიზაციის, ხმაურისა და სხვათა შესახებ საკითხებს, რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია სამსენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა შესრულების პროცესში.

5.8. ასევე კანონით წყლის შესახებ განსაზღვრულია ზედაპირული, მიწისქვეშა და სანაპირი წყლების აღება და ჩაშვების ლიცენზიებთან დაკავშირებული საკითხები.

5.9. კანონი ატმოსფერული ჰაერის შესახებ ითვალისწინებს ჰაერის კონტროლსა და დაბინძურების შეზღუდვის მეთოდებს, ჰაერის ხარისხიანობის სტანდარტებს და განსაზღვრავს დასაშვებ ზღვრებს სამშენებლო საქმიანობის პირობებში.

5.10. მავნე ქიმიური ელემენტების შესახებ კანონი მოიცავს მავნე ნივთიერებათა კლასიფიკაციას და მათ უსაფრთხო მოხმარების საკითხებს. მაგალითად, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა აუცილებელია სპეციალური ბუნკერებით, ხოლო სამშენებლო ნაგვისა დამოკიდებულია სამშენებლო - სარეკონსტრუქციო სამუშაოების მტვერშემცველობაზე. თუ სამშენებლო ნაგავი მტვრის გაბნევის

საშიშროებას მოიცავს თვითმცლელ მანქანებზე დაყრის შემდეგ, მას აუცილებელია გადაეფაროს სახურავი ბრეზენტისაგან ან მყარი მასალისგან.

6. მოთხოვნილებები კადრებზე და ადმინისტრაციულ - საყოფაცხოვრებო სათავსებზე.

6.1. მომუშავეთა რაოდენობის განსაზღვრა წარმოებს მუშის საშუალო წლიური გამომუშავების მიხედვით. მშენებლობის ხანგრძლივობა კალენდარული გეგმის მიხედვით 540 დღეა. აღნიშნულიდან გამომდინარე მშენებლობის პერიოდში მშენებლობაზე ყოველდღიურად უნდა დავასაქმოდ საშუალოდ 3-5 მუშაკი მთლიანი სამშენებლო პროგრამის შესასრულებლად. ცხადია, მათი რაოდენობა მშენებლობაზე დაძაბულობის გათვალისწინებით დროის სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა იქნება, რაც დამოკიდებულია დამკვეთის ფინანსურ მდგომარეობაზე.

7. მოთხოვნილება სამშენებლო ავტოტრანსპორტზე

7.1. თანამედროვე პირობებში მანქანების დაქირავება წარმოებს მასალა - ნაკეთობებზე მოთხოვნილების მომენტისათვის. ამიტომ რეკომენდებულია მასალა - ნაკეთობების შემოტანა საჭიროების მიხედვით და მოკლე დროში საპროექტო მდგომარეობაში ჩაწყობით.

8. რეკომენდებული ამწეების, სამშენებლო მანქანა - დანადგარების, მექანიზმების და ინსტრუმენტების შერჩევა

8.1. მშენებლობის წარმოების უწყვეტი რიტმისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მისი აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით. მათი რეკომენდირებული ჩამონათვალი მოცემულია ცხრილში:

№	დასახელება	მარკა	რაო-ბა ცალი
1	2	3	4
1	სამშენებლო ამწე	RDK -25	1.0
2	თვითმცლელი,ძირიანი და სპეცავტო ტრანსპორტი სამსენებლო ტვირთის შემოსატანად.	სხვადასხვა	1
3	ზედაპირული ვიბრატორი	C-697	1

4	ცემენტის ფენის მოსასწორებელი აგრეგატი	CO-89	1
5	მობილური ამწე მუხლუხა ან საავტომობილო სვლაზე	სხვადასხვა	1
6	ელექტროშესადუღებელი აპარატი	კომპლ	1
7	პარკეტის მოსახვეწი აპარატი	CO III	1
8	ლითონის სახარაჩო სექციები 100 მ ² ფართობისათვის	კომპლ	1
9	სხვადასხვა დანიშნულების ხელის მოწყობილობა - ინსტრუმენტები: ნიჩბები, ბარები, ლომები, წერაქვები და სხვა.	კომპლ	3

9. მშენებლობაზე შრომისა და ელექტროუსაფრთხოების წესების დაცვა

9.1. მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოების ყველა ეტაპზე უნდა იყოს დაცული თანახმად „სნ დაწ. III-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში“ და სხვა ნორმატიულ - საკანონმდებლო დოკუმენტების მითითებების შესაბამისობით. მათგან ყურადღება მახვილდება შემდეგზე.

9.2. სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილ უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებებით.

9.3. ბეტონის ტუმბოს გამოყენებისას ნარევის მიწოდება და ჩასხმა ქარგილებში უნდა მოხდეს ერთ მეტრზე ნაკლები სიმაღლიდან.

9.4. დამუშავებულ ქვაბულში მუშებისა და ინჟინერ - ტექნიკური პერსონალის ჩასვლისათვის უნდა ჩაიდგას ინვენტარული კიბეები, ამავე დროს აუცილებელია ქვაბულის ფერდოების ჩამოშლისადმი მდგრადობის შემოწმება, საჭიროების შემთხვევაში მისი გამაგრება შეფიცვრით ან შპუნტებით.

9.5. ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე უნდა წარმოებდეს გვერდიდან ან უკანა მხრიდან.

9.6. მშენებლობაში საჭიროა სერტიფიცირებული მასალების და ნაკეთობების გამოყენება მათი ტოქსიკურობის გათვალისწინებით დაშვებულ ნორმებში.

9.7. ადვილად აალებადი სამღებრო, საიზოლაციო და სხვა მასალების, აგრეთვე მომწამლავი ნივთიერებების დღიური რაოდენობა სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების ზონაში არ უნდა აღემატებოდეს დღიურ მოთხოვნილებას.

9.8. საჰიდროიზოლაციო სამუშაოთა შესრულებისას, პარკეტზე ლაქის წასმისას და ზოგიერთ სხვა სამუშაოებზე მუშები უნდა იყენებდნენ სპეცტანსაცმელს, რესპირატორებს და თავსაბურებს.

9.9. საყალიბო ქარგილები დაყენების შემდეგ მოწმდება საიმედობაზე მათში ბეტონის ჩასხმამდე. ასევე მოწმდება ბადიის საიმედობაც და წესრიგიანობაც სამაგრების თვითგახსნა რომ არ მოხდეს.

9.10. მასალებისა და ნაკეთობების დასაწყობება უნდა მოხდეს ტექნოლოგიური მოთხოვნილებების პირობათა გათვალისწინებით; ამავე დროს ისინი უნდა დაეწყოს მოწორებულ ადგილზე, რომ მათი მოცურებაც არ მოხდეს.

9.11. ელექტროუსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია საქ. სტანდარტში 12.1.013-88. ელექტროკარადა ყოველთვის უნდა იყოს ჩაკეტილ მდგომარეობაში, ელექტროკაბელები, ელექტროსადენები და მოწყობილობები კი იზოლირებული. გაშიშვლებული სადენების გამოყენება აკრძალულია.

9.12. იკრძალება ვიბრატორის სხვა ადგილას გადატანა მისი ელექტროქსელიდან გამორთვის გარეშე. სამუშაოს შესრულების შემდეგ ვიბრატორი სუფთავდება და მშრალად იწმინდება.

9.13. სამშენებლო მოწყობილობათა ჩართვა (საწეველები, პარკეტისა და მოზაიკის საპრიალებელ - მოსახვეწი დანადგარები, ელექტროშესადუღებელი აპარატი და სხვა) საბინაო ელექტროქსელში აკრძალულია. თელასის ან ენერგოპროს (ან ალტერნატიული სამსახურის) ტექზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით ნებადართული სატრანსფორმატორო ქვესადგურიდან უნდა მოხდეს სამწვერიანი ელექტროკაბელის შემოყვანა დახურულ კარადაში, მრიცხველის დაყენება, საიდანაც ძალოვანი და განათებელი სადენები გაიმართება მომხმარებლისაკენ.

9.14. მობილური ამწეების, ბეტონდამჭიხნი დანადგარების („პომპა"), ელექტროსაწეველას და სხვა მანქანა - მექანიზმების მუშაობის პერიოდში მის ქვეშ ან სიახლოვეს უცხო და სამშენებლო ოპერაციებში დაუსაქმებელ პირთა ყოფნა აკრძალულია.

10.ინსტრუმენტალური კონტროლი

10.1. გეოდეზური კონტროლის დროს მოწმნდება შენობის ელემენტებისა და ცალკეული კონსტრუქციების შესაბამისობა პროექტთან მათი მოწყობის პროცესში.

10.2. თავდაპირველად ამაგრებენ დაკვალვის გარე ქსელს სამშენებლო მოედანზე ნახაზზე მიღებული ღერძების გადატანით ნატურაში. სანიველირო და დგომითი დაკვალვის წერილები უნდა იყოს გაერთიანებული.

10.3. ელემენტებისა და კონსტრუქციების გეგმური და მაღლივი მდგომარეობა, მათი ვერტიკალურობა, ჩასატანებელი დეტალების დაყენების სიზუსტე მოწმდება შენობის შიდა დაკვალვის ნიშნულებიდან, ხოლო საინჟინრო კომუნიკაციებისა - გარე დაკვალვის ქსელის ან რეპერების მყარი წერტილებიდან.

11. მითითებები მიწის სამუშაოთა შესრულებაზე

11.1. მიწის ჩაყრა უნდა ვაწარმოოთ ხელით, ჩასაყრელი გრუნტის სამუშაოების შესრულება დამოკიდებულია დამკვეთის სურვილის კვალობაზე, რადგან აღნიშნული სამუშაოები არ საჭიროებს თვითმცლელი ავტოტრანსპორტის გამოყენებას, მისი საჭიროება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, როდესაც ჩასაყრელი გრუნტი შორი მანძილიდანაა შემოსატანი საპროექტო ობიექტზე,

11.2. მიწის სამუშაოები შესრულების დროს უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ინსტრუმენტალური კონტროლი.

12. მითითებები მიწისზედა სამუშაოთა წარმართვის თაობაზე

12.1. წარმოდგენილი მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და მშნებელობის კალენდარული გეგმით გათვალისწინებულია სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოება უწყვეტი რიტმით, ნაკადური მეთოდების გამოყენებით, რომელიც გულისხმობს მანქანა - მექანიზმების გადაადგილებას სამშენებლო ბრიგადებთან ერთად შენობის ცალკეულ ნაწილზე მათზე დაკისრებული სამუშაოების წშესასრულებლად. ცხადია, სამუშაოთა ფართო ფრონტით წარმოების დროს აუცილებელია სამუშაოთა შორის ტექნოლოგიური ინტერვალების დაცვა. სამუშაოთა ფართო ფრონტი საშუალებას იძლევა მუშახელის პროფესიონალური მოცდენა არ მოხდეს სხვადასხვა სამუშაო უბნებზე მათი გადაადგილების გამო, რისი უზრუნველყოფაც, ცხადია, სამუშაოთა მწარმოებლის ნიჭსა და უნარზეა დამოკიდებული.

13. ეკოლოგია და ბუნების დაცვის საკითხები

13.1.მშენებლობის პერიოდში აუცილებელია განხორციელდეს სპეციალური ღონისძიებები მიმდინარე ტერიტორიის დამტვრიანებისაგან თავის ასაცილებლად. ამ მიზნით სართულებიდან სამშენებლო ნაგვის ჩამოყრა უნდა განხორციელდეს დახურულ ღარებში და ინვენტარული ტიპის კონუსული ნაგავსაყრელების მეშვეობით. უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ნაგვის ჩაყრა უშუალოდ თვითმცლელი ავტომანქანების ძარებში.

13.2. საბათქაშო და მოსახვითი სამუშაოების შესრულების პერიოდში ფასადებს საჭიროა ჩამოეფაროს ფარდა, რათა ამ შემთხვევაშიც არ მოხდეს მტვრის გაბნევა სელიტებულ ზონაში.

13.3. აკრძალულია სპეციალური ნებართვის გარეშე სელიტებულ ზონაში მშენებარე ობიექტების სიახლოვეს ბეტონ და

ხსნარმრევი კვანძების მოწყობა. მათი სასაქონლო მოწოდება უნდა მოხდეს სტაციონალური კვანძებითა ან სამშენებლო ბაზებიდან.

13.4. დაუშვებელია არსებულ საკანალიზაციო ჭებში ბეტონ და ხსნარ - მილსადენების ჩარეცხვა ან მათი დანაგვიანება სამშენებლო ნარჩენებით.

13.5. ასევე არსებული საკანალიზაციო ქსელის პირობებში მიზანშეწონილად ვერ ჩაითვლება დროებითი ტუალეტის მოწყობა ამოსახაპ ორმოზე. მათი დროებითი ჩართვაც სასურველია საკანალიზაციო კოლექტორში.

13.6. გარემოს დაცვის სამსახურიდან ნებართვის გარეშე მშენებლობის ზონაში იკრძალება მრავალწლიანი ხეების და ნარგავების მოჭრა - განადგურება.

13.7 ზემოთ მითითებული დებულებებიდან გამომდინარე მშენებლობა უნდა განხორციელდეს ბუნების დაცვითი და ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვით მოქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად.

14. მოპ-ის შედგენისათვის ნორმატიული ბაზა

14.1. სნ და წ 3.01.01.85 „სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია“.

14.2. სნ და წ 3.04.03-85 „მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები საცხოვრებელი სახლების მშენებლობაზე“.

14.3. შ. ბაქანიძე, მ.ლორთქიფანიძე, რ. მახვილაძე „ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაში“, თბილისი, სტუ. 2006 წ.

14.4. რ.მახვილაძე, დ.ბუჩუკური, თ. ღუდუმიძე, დ.ჭელიშვილი, ზ.ჯუღელი, „ფასწარმოქმნა მშენებლობაში, ინვესტიციები და საბანკო კრედიტი“, თბილისი, სტუ, 2006 წ.

14.5. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შედგენის ეტალონი სამხრეთის მთიანი რაიონებისათვის.

14.6. კრებული - სამახსოვრო „სამშენებლო წარმოების ნორმები და წესები „ამონაკრები მომქმედი სამშენებლო ნორმებიდან და წესებიდან“, ურბანიზაციისა და მსენებლობის სამინისტროს გამოცემა, თილისი, 1987 წელი, ქართულ ენაზე.

14.7. სნ და წ III-4-80 “უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე“.

14.8. ს.გ.ნ.-73 „გაანგარიშების ნორმატივები 1 მილიონ მანეთ შესასრულებელ სამშენებლო სამონტაჟ სამუშაოებზე“.

14.9. ამავე დროს გათვალისწინებულია სნ და წ.01.01-85, დანართი 2, პუნქტი 3-ის მოთხოვნა საცხოვრებელ სახლებზე მშენებლობით ათვისებულ რაიონებში მოპ-ის შემადგენლობისა და მოცულობის თაობაზე.

ყურადღება!!! (შენიშვნა)

სამშენებლო მოედნიდან გამომავალი ყველა სატრანსპორტო საშუალებები და მანქანა მექანიზმებიs სავალი თვლები (ბორბლები) უნდა იქნას გარეცხილი.

დირექტორი: /ლ. ხელია/

შეადგინა: /გ.ამბროლაძე/

სამშენებლო გენგეგმა

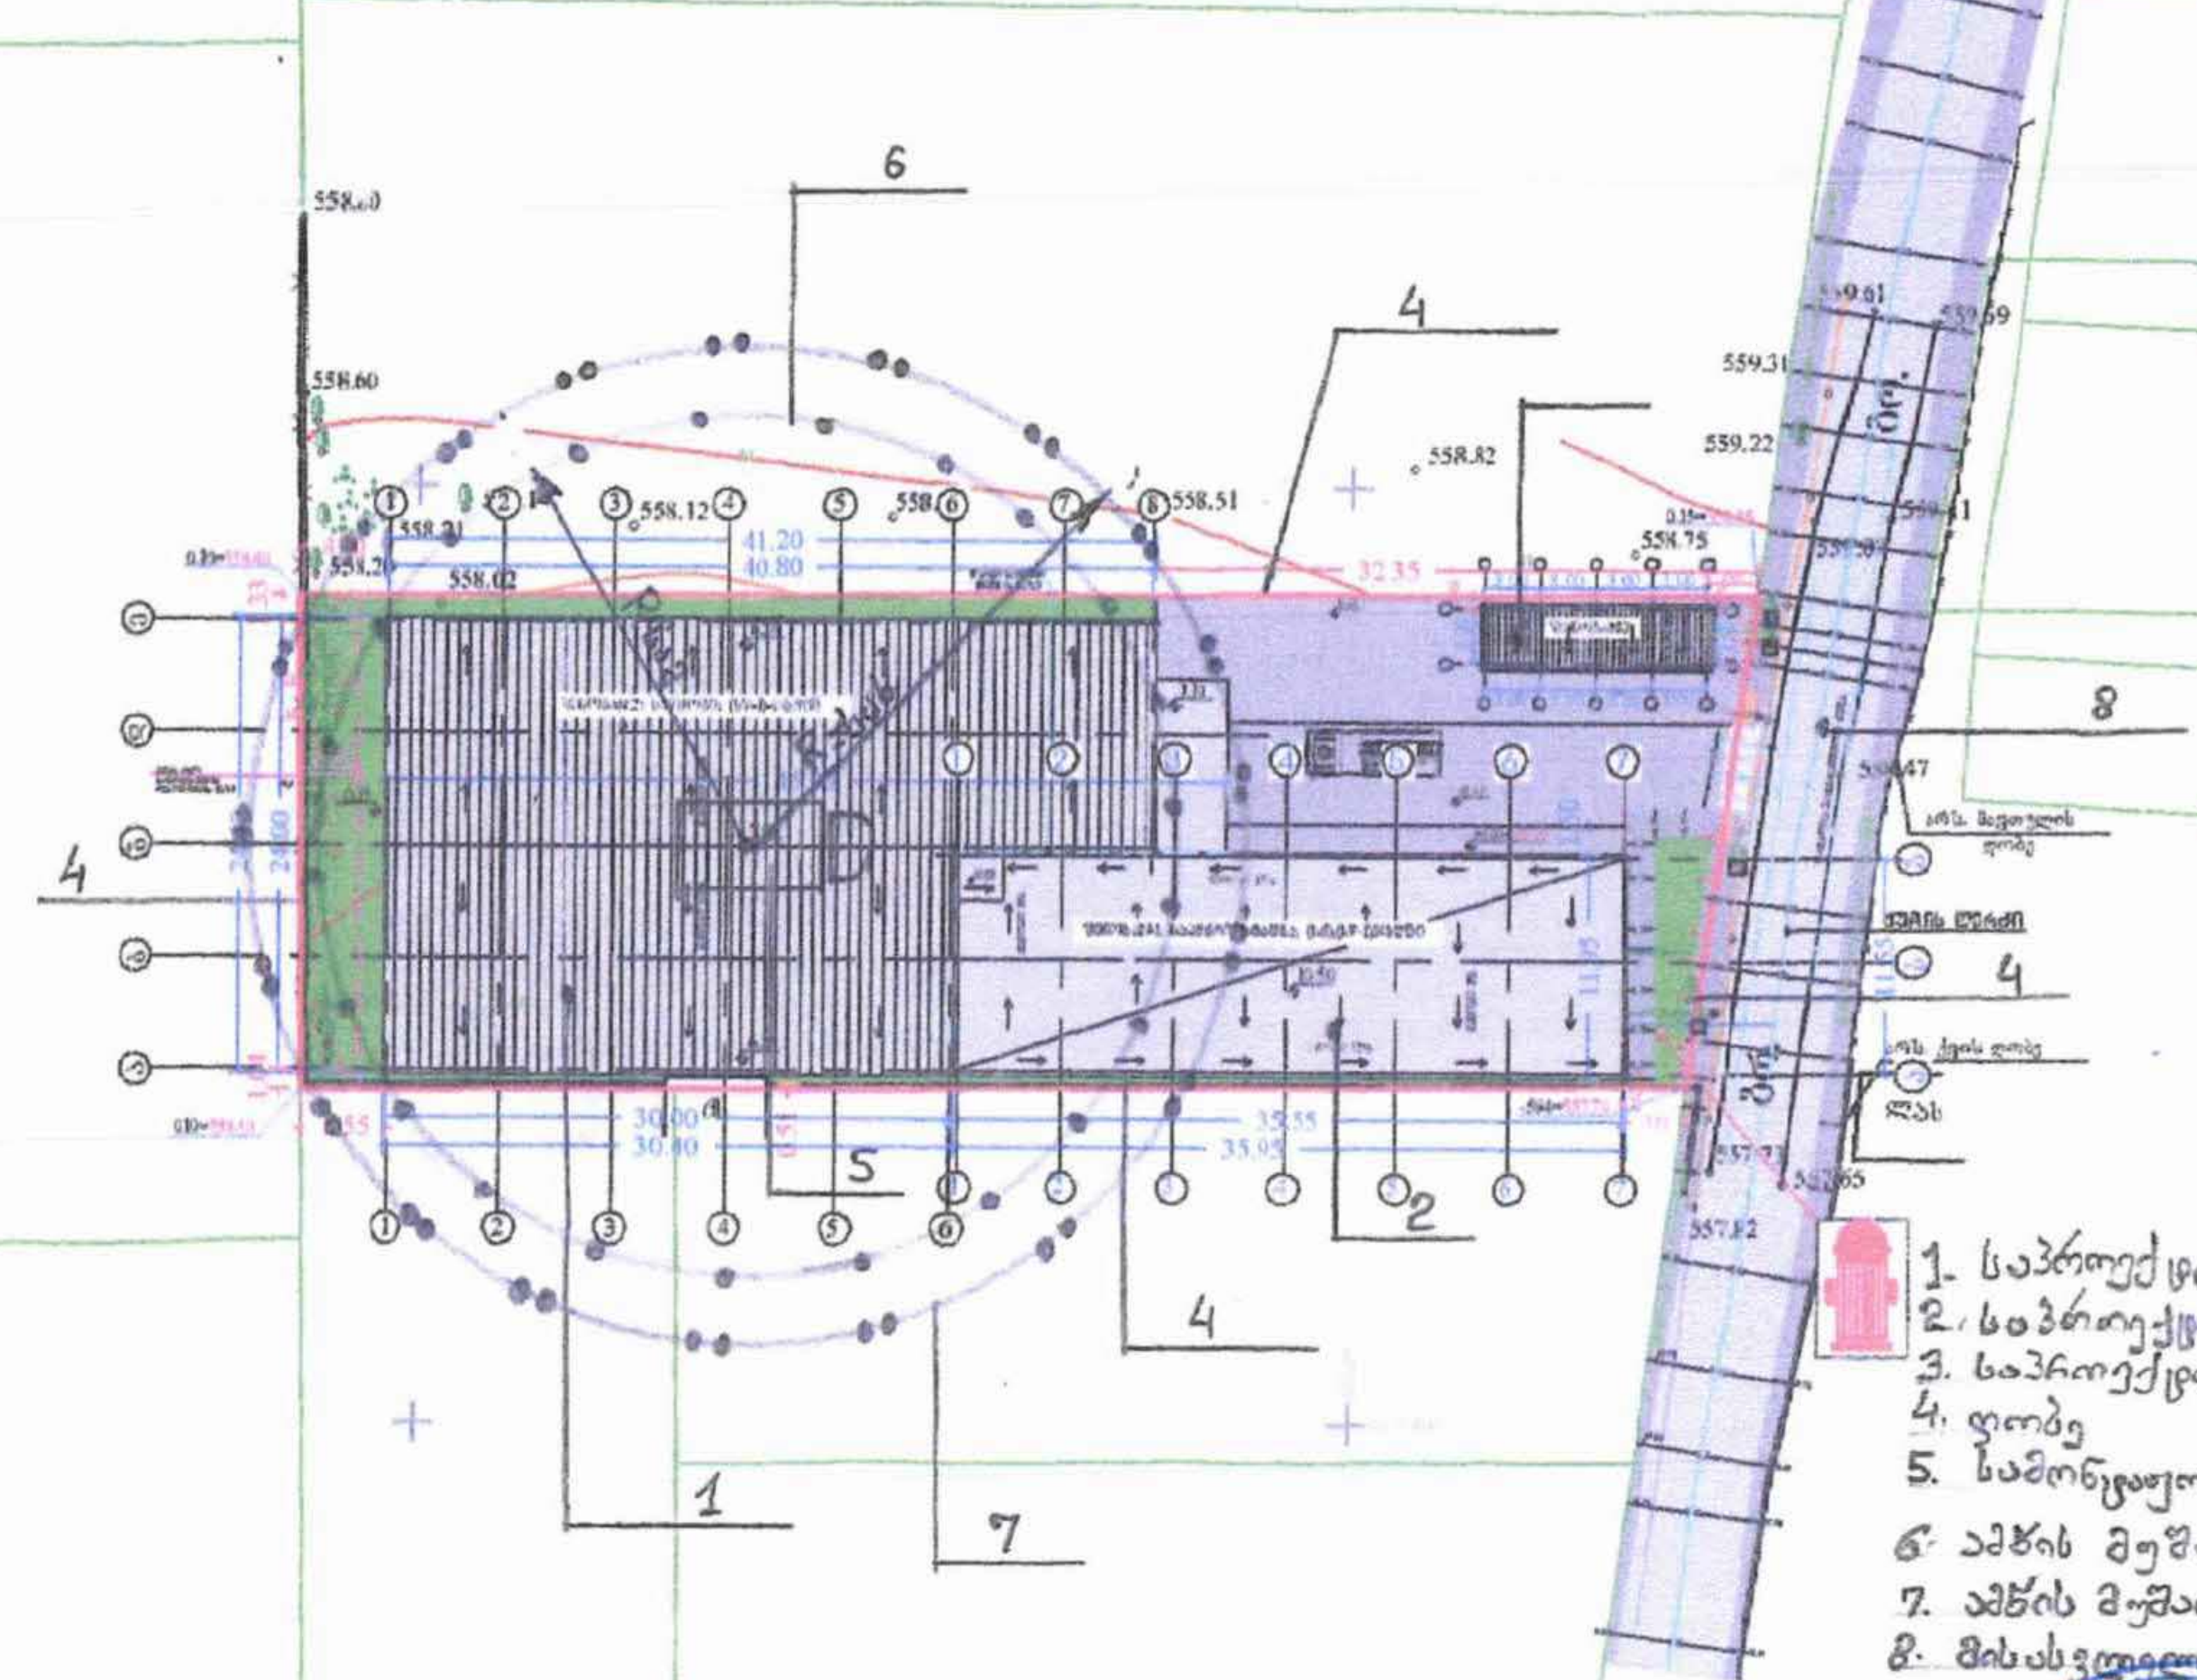

1. საპროექტო შენობა N1
2. საპროექტო შენობა N2
3. საპროექტო შენობა N3
4. ღობე
5. სამონტაჟო ამწე
6. ამწის მუშაობის სამოქმედო ზონა
7. ამწის მუშაობის სახიფათო ზონა
8. მისასვლელი გზა

შ.პ.ს. „დემე"ს დირექტორი: ლ. ხელაია

შეასრულა: გ. ამბროლაძე

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა (დღე)	თვეები. წლები. I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII	I-III	IV-VI
1	2	3	4					
	I რიგის სამუშაოები I ეტაპი							
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	15	15					
	II ეტაპი							
2	მიწის ნაკვეთის დაკვალვა დალურძვა	10	10					
	ძირითადი რიგის სამუშაოები III ეტაპი							
3	მიწის სამუშაოები	30	30					
	შენობის ფუძის მოწყობა	20	20					
	IV ეტაპი							
4	საძირკვლების მოწყობა	25		25				
	შენობის ძირითადი კონსტუქციების მოწყობა	200			200			
	შნობის სახურავის მოწყობა	25					25	
	არამზიდი კონსტრუქციების (კედულები, ტიხრები) მოწყობა	50					50	
	V ეტაპი							
5	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. (ფასადების შელესვა-შეღებვა)	75						75
	მიწის ნაკვეთის ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50						50

T = 450 დღე (18 თვე)

შ.პ.ს. „დემე"ს დირექტორი: ლ.ხელაია

შემსრულებელი: გ.ამბროლაძე

DEME
