ს ა ა მ შ ე ნ ე ბ ლ ო გ ე ნ გ ე გ მ ა

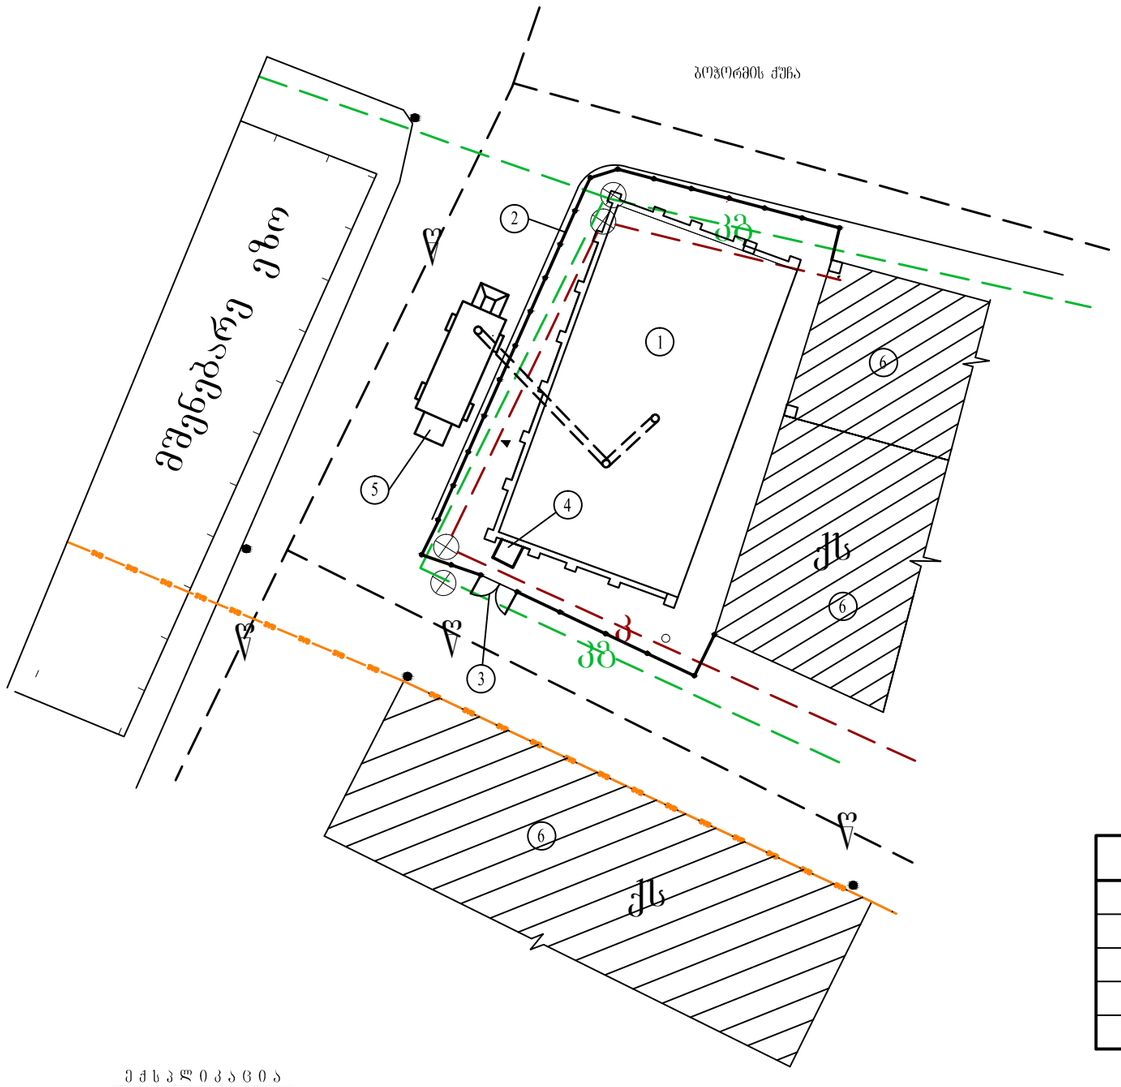

ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

1. საპროექტო მრავალფუნქციური შენობა .
2. დროებითი ღობე
3. დროებითი ჭიშკარი
4. სამსენებლო საწეველა
5. ბეტონის ტუმბოს დროებითი ადგილი
6. არსებული სახლები

პ ი რ ო ბ ი თ ი ა ღ ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

საპროექტო შენობა

არსებული შენობა - ნაგაბობები

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ÑÍêÌ 3.01.01-85 თანახმად , შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტი , სასტუმროს შენობა ბოჯორმის №3 , კარკასული ტიპისაა , 6 სართულიანი , სარდაფით, შიგა და გარე კედლები წვრილი , ღრუბანიანი ბლოკისაგან .
3. თბილისის ტერიტორიის ძოგადი რაიონირების სქემის მიხედვით, სამშენებლო უბანი მიეკუთვნება 8 ბალიან ზონას .
4. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ÑÍêÌ 1.04.03-85 , გვ. 259 , პ.6 -ის მიხედვით Ò = 11.5 თვეს, სადაც 21 დღე - მოსამზადებელი პერიოდია .
5. მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები: არსებული საკანალიზაციო ქსელის გადატანა , ტერიტორიის შემოღობვა , საპროექტო ქსელების მოწყობა , საამშენებლო უბნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ელ. ენერგიით საპროექტო ქსელიდან .
6. სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება მოხდება მოძრავი ბეტონის ტუმბოს საშუალებით , ამწის და საწეველას დახმარებით . საწეველას დაყენება მოხდეს " 2-2 " ღერძზე . პირველ რიგში გათვალისწინებულია რკ. ბ. მონოლითური კარკასის მოწყობა .
7. გრუნტის დამუშავება არსებულ სახლებთან მომიჯნავე ტერიტორიებზე განხორციელდეს ხელით , ერთდროულად ნატარდეს გამაგრებითი სამუშაოები .
8. რკ. ბეტონის სამუშაოების განხორციელება მოხდეს ÑÍêÌ III-4-80, გვ. 44-47 მიხედვით .
9. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ- ჰიგიენური ნორმების დაცვა მიღებულია ÑÍêÌ III-4-80 მიხედვით.

გამოყენებული სამშენებლო ტექნიკის მაჩვენებლები

Autobetonpumpe MM -26 ოქნიკური დახასიათება

	მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ ი	პ ა რ ა მ ე ტ რ ი
1	აღვის სიმაღლე	25.60 მ
2	შვერა	22.00 მ
3	ჩაღვის სიღრმე	16.00 მ
4	მოზრუნვის კუთხე	360 °
5	მანქანების ზომები	2.5 X 3.85 X 6.2 მ

ТП - 3А ოქნიკური დახასიათება

	მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ ი	პ ა რ ა მ ე ტ რ ი
1	ტვირთამწეობა	320.0 კგ
2	აღვის სიმაღლე	18.00 მ
3	აღვის სიჩქარე	0.50 მ / წ
4	ზომა	1.50 მ - 0.90 მ

ვინაობა-ფუნქციონალი ფენომენის კვლევის ისტორია (ჩასვენების ადგილი)

№№	სასწავლო პროგრამის დასახელება	ხანგრძლივობა კვ.	დაწყების თარიღი	1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე				5 თვე				6 თვე				7 თვე				8 თვე				9 თვე				10 თვე				11 თვე				12 თვე			
				კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4
1	ვოლეიბოლისტების სპორტული სავარჯიშო	კვ3	18																																											
2	ვიოლინოს სავარჯიშოები	კვ3	14																																											
3	პანტომიმური ეტიუდი სავარჯიშოები	კვ3	13																																											
4	სანიმაციო ფილმის -3,500 ფოტოზე	კვ3	21																																											
5	სანაღვაცის ფიზიკის ელექტრონული ტექნიკა	კვ3	21																																											
6	სანაღვაცის ბაზარზე გატანის ორგანიზება	კვ3	22																																											
7	I სპორტული ცეკვების სავარჯიშოები	კვ3	24																																											
8	II სპორტული ცეკვების სავარჯიშოები	კვ3	24																																											
9	III სპორტული ცეკვების სავარჯიშოები	კვ3	24																																											
10	IV სპორტული ცეკვების სავარჯიშოები	კვ3	24																																											
11	V სპორტული ცეკვების სავარჯიშოები	კვ3	24																																											
12	VI სპორტული ცეკვების სავარჯიშოები	კვ3	24																																											
13	ვიოლინოს ეტიუდების სავარჯიშოები	კვ3	28																																											
14	სინქრონული სპორტული ცეკვების სავარჯიშოები	კვ3	21																																											
15	ვიოლინოს ტექნიკური სავარჯიშოები	კვ3	35																																											

ձեռնարկության գործունեության ընթացքում առաջացող թափոնների տեղափոխման ուղեկցագրերի ամսական հաշվետվություն (ապրիլ 2026թ.)

№№	Ծածկագրման ապրանքների անվանումը	չափ-ման միավոր	քանակ	1 օդանավակայան				2 օդանավակայան				3 օդանավակայան				4 օդանավակայան				5 օդանավակայան				6 օդանավակայան				7 օդանավակայան				8 օդանավակայան				9 օդանավակայան				10 օդանավակայան				11 օդանավակայան				12 օդանավակայան			
				1 կողմ	2 կողմ	3 կողմ	4 կողմ	1 կողմ	2 կողմ	3 կողմ	4 կողմ	1 կողմ	2 կողմ	3 կողմ	4 կողմ	1 կողմ	2 կողմ	3 կողմ	4 կողմ	1 կողմ	2 կողմ	3 կողմ	4 կողմ	1 կողմ	2 կողմ	3 կողմ	4 կողմ	1 կողմ	2 կողմ	3 կողմ	4 կողմ	1 կողմ	2 կողմ	3 կողմ	4 կողմ	1 կողմ	2 կողմ	3 կողմ	4 կողմ	1 կողմ	2 կողմ	3 կողմ	4 կողմ	1 կողմ	2 կողմ	3 կողմ	4 կողմ
16	I-VI կարգի պինդ տնային թափոններ ամառային աղբահանության	կգ	42																																												
17	ածխ-ցեխ խառնված գոմաղբ	կգ	18																																											
18	գնալարված քարերի ամառային մնացորդներ	կգ	35																																											
19	ցած վնասված-չհրկիզվող ամառային նյութեր	կգ	12																																											
20	ցած չհրկիզվող ամառային մնացորդներ	կգ	18																																											
21	ցած ձմեռային ամառային մնացորդներ	կգ	12																																											
22	ցած ցինկապատ մետաղալարային ամառային	կգ	65																																											
23	օգտագործած ամառային	կգ	35																																											
24	ձմեռային կոմունալ ցած-փայտային	կգ	8																																											
25	գնալարված ամառային	կգ	10																																											
26	ցած վնասված ամառային	կգ	64																																											
27	ձմեռ կոմունալ մնացորդ-գոյանյութ ցած	կգ	7																																											
28	ցածված ձմեռային մնացորդ-ամառային կոմունալ	կգ	12																																											
29	կոմունալ ցած ձմեռային	կգ	31																																											
30	մետաղալար	կգ	7																																											
