
დანართი 1.

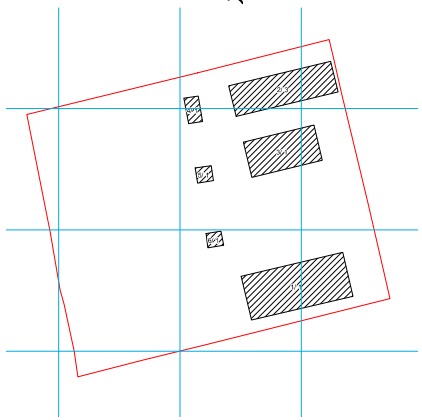

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ქ.თბილისი, დასახლება ორხევი, ქუჩა მშენებელთა N1.
3. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმების და წესების - СНиП-1.04.03-85 მიხედვით. აღნიშნული სამუშაოების , ასევე დამკვეთის სურვილის გათვალისწინებით მშენებლობის ხანგრძლივობათ მიღებულია მშენებლობის ნებართვის მიღებიდან 1 თვე.
4. ძირითადი სამუშაოები სრულდება მუშის ძალით. მასალების მიწოდება მოხდება ეტაპობრივად მშენებლობის პერიოდების გათვალისწიინებით, ქუჩის მხრიდან. სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი ენერგიით და წყლით მოხდება საპროექტო ქსელებიდან. სამშენებლო ნაგავი გატანილ იქნას მოედნიდან.
5. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების დასანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების СНиП-Ш-4-80* <<უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში>>.

სასაწყობე ნაგებობის დემონტაჟის პროექტი, ქ.თბილისი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი ჩასატარებელ სამუშაოებზე (დღეები)

N	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	დღე	3დღე	3დღე	3დღე	3დღე	3დღე	3დღე	3დღე	3დღე	3დღე	3დღე	1დღე
1	შენობის სახურავიდან იზალაციის მოხსნა		X	X									
2	შენობიდან სახურავის პეკაუების მოხსნა ამწეს საშუალებით				X	X							
3	შენობის პარაპეტზე ბლოკის კედლების და ტიხრების დემონტაჟი						X	X					
4	რიგელების, კოლონების და ყასაურების დემონტაჟი								X	X			
5	საძირკვლების დემონტაჟისთვის გრუნტის მოჭრა										X		
6	კომბინირებული საძირკვლების დემონტაჟი										X	X	
7	სამუშაოების დასრულება												X

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან


შენიშვნა: კალენდარული გრაფიკი არ ითვალისწინებს კლიმატური პირობებით გამოწვეულ შეფერხებებს.

მითითება

1. დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები
2. აკრძალულ იქნას უცხო პირთა მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე
3. მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი

შპს "შაკო"			სასაწყობე ნაგებობა (ქალაქი თბილისი. დასახლება ორხევი. მშენებელთა ქუჩა N1)	
დირექტორი	ქ.წულაძე		არქიტექტურული ნაწილი	2013
შესრულა	მ.ზუმბაძე		განმარტებითი ბარათი. ნახაზები. მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	მ.1:100

გეგმა

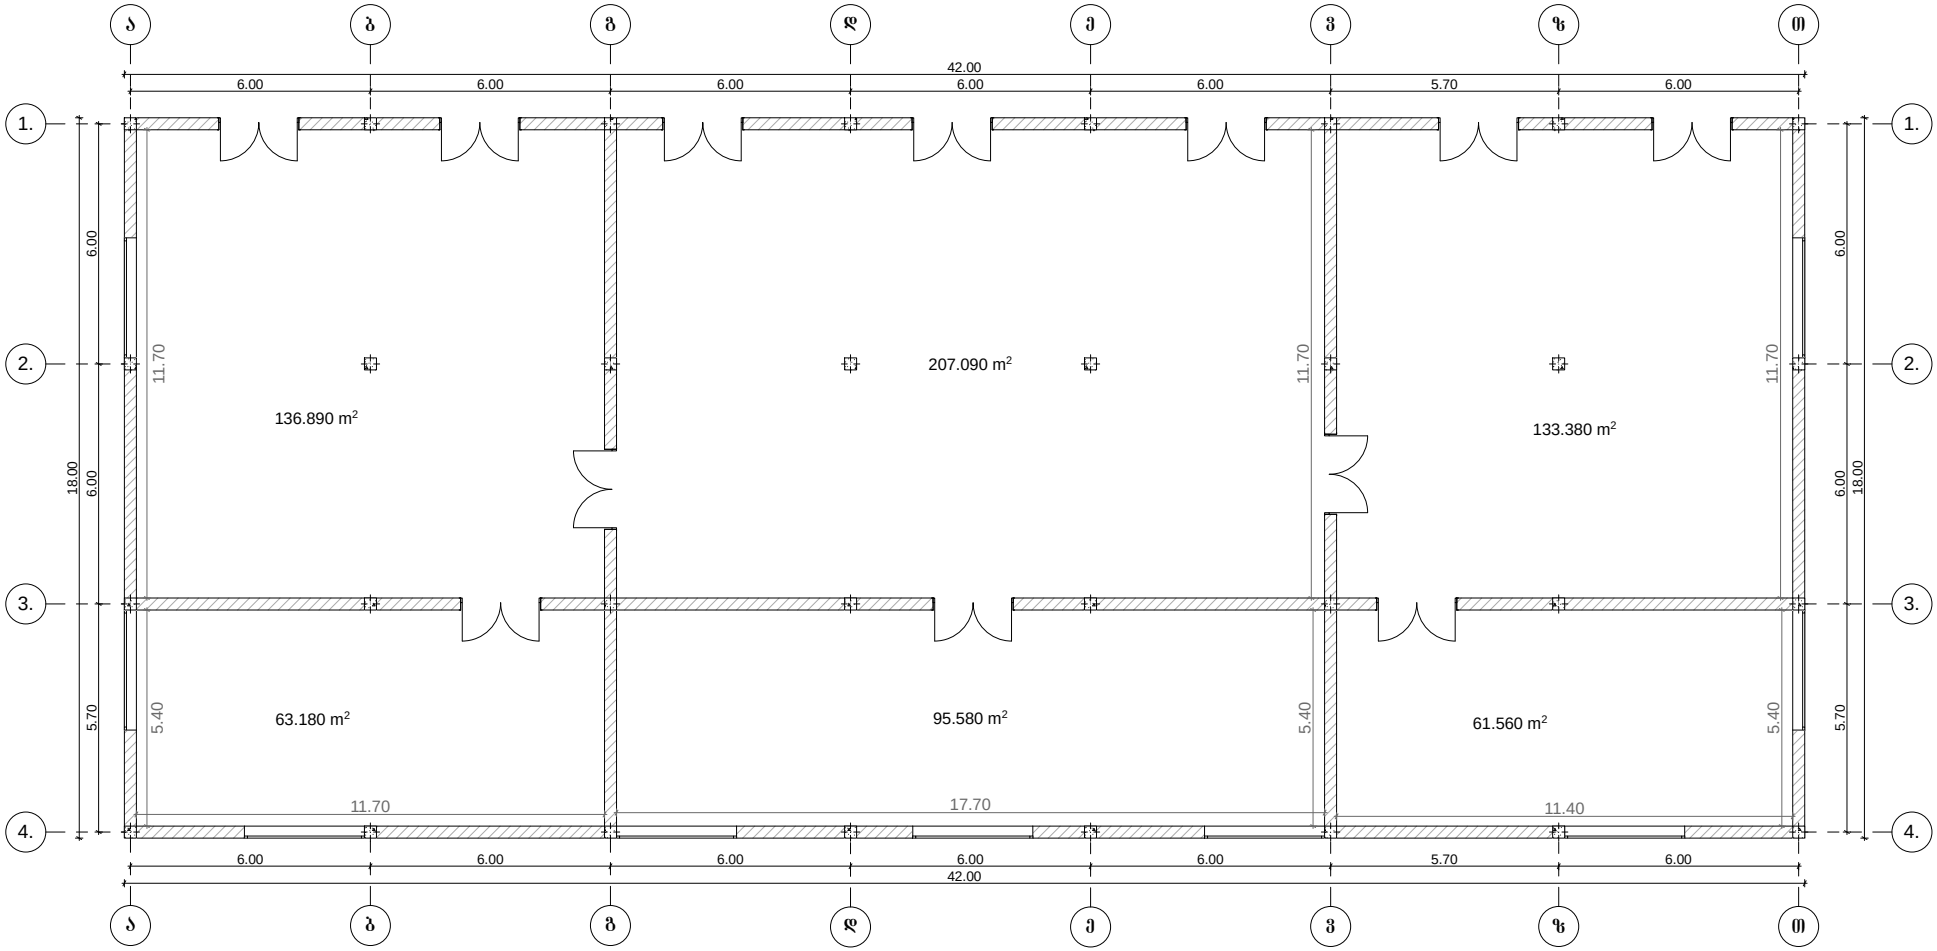
ა
ბ
გ
დ
ე
ვ
ზ
თ
42.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.70
6.00
1.
2.
3.
4.
6.00
18.00
6.00
5.70
11.70
5.40
136.890 m²
207.090 m²
133.380 m²
63.180 m²
95.580 m²
61.560 m²
11.70
17.70
11.40
