
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 30 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლივობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
საძირკვლის ქვეშ ბრუნტის ამოღება	1,5 თვე																								
შენობის შუძის მოწყობა	2 თვე																								
ნულოვანი ციკლის დასრულება	4 თვე																								
შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა ნიშნულების შესაბამისად	4 თვე																								
სახურავის მოწყობა	2 თვე																								
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება	2 თვე																								
შენობის ფასადების დამუშავება: მოპირკეთება, შელესვა, შეღებვა	2 თვე																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება	1 თვე																								
მშენებლობის საერთო ხანგრძლივობა 12 თვე																									

დროებითი ღობის პროფილი

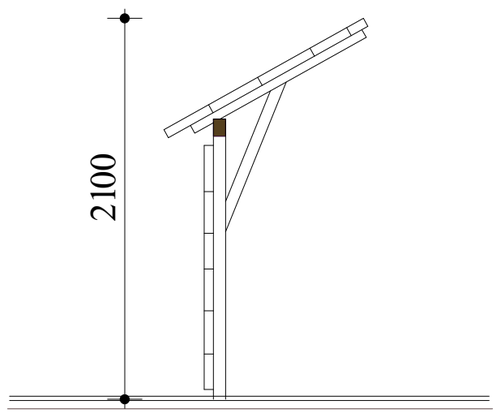

შენიშვნა: შესაძლებელია დროებითი ღობე არ მოეწყოს, რადგან ტერიტორია შემოღობილია კაპიტალური ღობით.

ფ/პ "არჩილ მიქუჭაძე" ს/კ 01019012603					
ქ. თბილისში, მუხრანის II შესახვევი №11-ში ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი					
პრ. ავტორი		ა. მიქუჭაძე	მშენებლობის ორგანიზაცია	ფურცელი	მოპ-4
		ე. ცქვიტინიძე	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	თარიღი	2011 წ.
				მასშტაბი	
შესასრულა		ლ. მიქუჭაძე			
