სამშენებლო გენგეგმა მ. 1:500

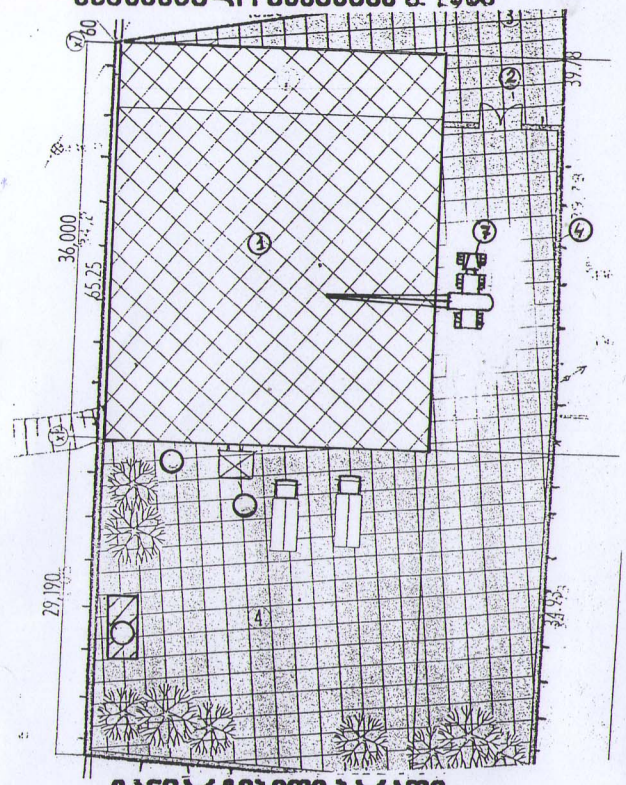

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოსაზღვრულ ვარიანტში.

2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმების და წესების–СНиП-1.04.03ю-85 (ც.1.479 პ.4) მიხედვით T=22 თვე სადაც 1 თვე–მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობა. სეისმური კოეფიციენტის მიხედვით T=22x1.1=24 თვე.

3. მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები –საშენი ქსელების ვოროშკა. ნავის გაგანა. საპროექტო ობიექტის გაყვანა. სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი ენერგიით და წყლით საპროექტო ობიექტებიდან.

4. ძველის დამუშავების დროს გრუნტი უნდა იქნას გაგანილი და შემოგანილი უკე ჩაჯრისათვის. არსებულ ობიექტებთან გრუნტი უნდა დამუშავდეს ხელით.

5. საშონგაჟო სამუშაოებისთვის უნდა იქნას გათვალისწინებული სამშენებლო სანიველა ТП-3А(С-598).ჩე МКА-16 ტიპის სამ.აგზ

6. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მოთხოვნათა შრომის უსაფრთხოების და სანიგარულ-ჰიგიენური მოსახერხებლობის საკითხებზე მითითები გათვალისწინებულია სამშენებლო ნორმების და წესების СНиП-III-4-80*<< უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში >>.

საშონგაჟო სქემა მ. 1:200

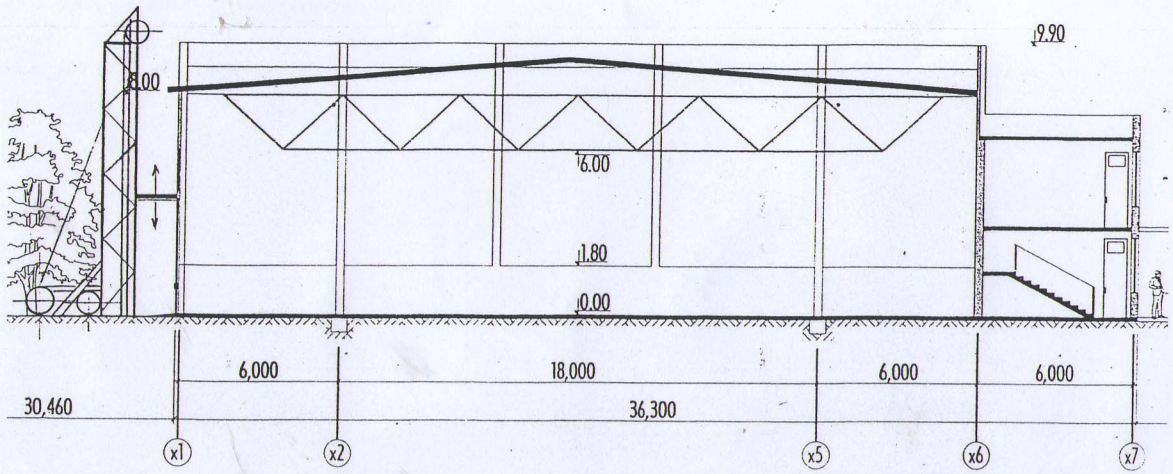

საავტომობილო აგზა МКА-16 ტექნიკური დახასიათება			
ისრის ფენის მ.	ბეირთაე წეოზა ტნ		ფენის აგების სიმაღლე მ.
	საყრდენზე	შუაყრდენთან	
	ისრის სიგრძე 15 მ.		
5.0	11.5	3.20	15.20
7.0	6.6	1.60	14.70
10.0	3.90	1.00	13.00
12.0	2.80	0.90	11.50
15.0	2.00	0.80	8.00

პირობითი აღნიშვნები

- დროებითი შენობა
- საპროექტო შენობა
- ღობე

ექსპლიკაცია

1. საპროექტო ობიექტი
2. ჭიშკარი
3. გვიმონტრევი
4. ღობე
5. საწვავეღა
6. დროებითი შენობა
7. საავტომობილო აგზე

ТП-3А ტექნიკური დახასიათება

1. ბეირთ აგნეობა — 320 კნ
2. აგების სიმაღლე — 9 მ
3. აგების სიგრძე — 0.5 მ/წ
4. ბაზის ზომა:
   - სიგრძე — 1.5 მ
   - სიგანე — 0.9 მ

შეს.	„კოლხა-07„		ქ.ბაღდათი, სოფ. დიდოფალო, შპალერის ჩაის ფაბრიკა
დირექტ.		თანამდებობა	ქალაქ ბაღდათის ადმინისტრაცია 20 წელი
გიპ...ტრისტი			
შეს.		ხელმოწერა	საშენებლო გენგეგმა საავტომობილო აგზა
შეს.			
შეს.			

ცვლილება | რაოდენობა | ფურცელი | დოკუმენტი | ხელმოწერა | თარიღი

ფურცელი 1

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	VI თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
1. ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა	5																							
2. საძირკვლის ქვეშ მიწის ამოღება		75																						
3. შენობის ფუძის მოწყობა				90																				
4. ნულოვანი ციკლის დასრულება							90																	
5. შენობის რკინის კარკასის მონტაჟი													300											
6. შენობის გადახურვა და მისი იზოლაციის მოწყობა																	180							
7. გარე და შიდა კედლების ბლოკით შევსება																		330						
8. გარე და შიდა კედლების ბალესვა																				260				
9. გარე კედლების შედებვა მოპირკეთება																					190			
10. ტერიტორიის დასუფთავება კეთილმოწყობა										450														

ღობე

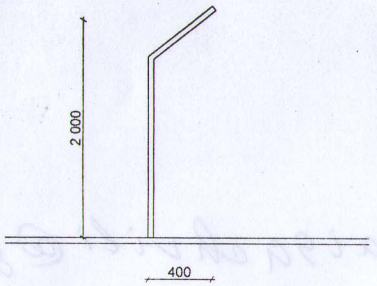

შპს „კოლხა-07„			ქ.ოზურგეთი. სოფ. ღილოჭა მაღ-ვალდუნქსი უარი შენობის ჩარ.
დირექტ.		თანაავთორია	ვეკანავლობის ობიექტზე.
მთ.კონსტრ.			
შესახ.		ა.ვასაძე	ვეკანავლობის ღღიური გრაფიკი

ეტაპი			
სტადია	ფურცელი	ფურცლების რაოდენობა	შენიშვნა
	2		
