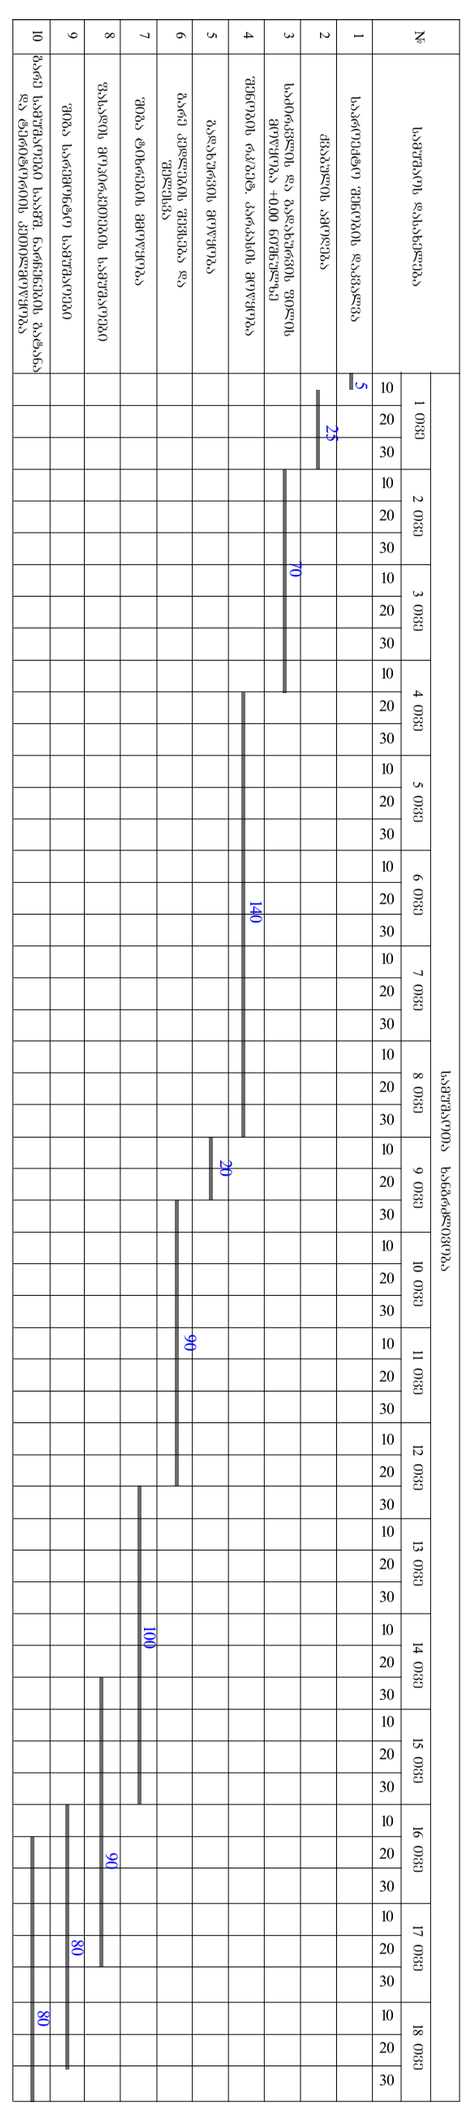

10

საპროექტო შენობის დაკვალვა

შენობის რკ/ბეტ. კარკასის მოწყობა

გადახურვის მოწყობა

გარე კედლების შევსება და

შელესვა
შიგა ტიხრების მმოწყობა

ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები

გარე სამუშაოები საამშ. ნარჩენების გატანა

და ტერიტორიის კეთილმოწყობა

შიგა სარემონტო სამუშაოები

20

140

5

25

90

100

1 თვე

90

80

80

30

საძირკვლის და გადახურვის ფილის

მოწყობა +0.00 ნიშნულზე

70

ქვაბულის ამოღება

მშენებლობის დღიური გრაფიკი (18 თვე)O
1
2

3

4

5

6

7

8

9

სამუშაოს dasaxelebaO

10

20

სამუშაოთა xangrZlivobaO

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების

შესაბამისად და შესრულებულია შემოკლებულ ვარიანტში;

2. სამშენებლო უბანზე არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები არ აღინიშნება. უბნის სეისმურობა - 8 ბალი;

3. საპროექტო შენობა წარმოადგენს 1-სართულიან ანტრესოლით და სარდაფით ნაგებობას. შენობის მზიდი ელემენტები შედგება შემდეგი

კონსტრუქციებისგან: საძირკველი - წერტილოვანი და ლენტური; კონსტრუქციული ელემენტები - მონოლითური რკ/ბ;

4. სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას აუცილებელია უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვა;

5. მოსამზადებელი სამუშაოები:

- სამშენებლო ტერიტორიის გასუფთავება;

- შენობის დაკვალვა /დაგეგმარება/;

- დროებითი წყლის და ელ მომარაგება;

-რკ/ბეტ.კარკასის საამშენებლო ბადით შემოსვა

6. სამონტაჟო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია საავტომობილო ამწე KC 3575 "ა";

7. მშენებლობის ხანგრძივობის დასადგენად ვისარგებლეთ СНИП-1-04.03-85 (გვ. 479, პ.4) "მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები".

მშენებლობის ხანგრძივობას ანალოგის მიხედვით დავადგინეთ თვე 8 ბალი სეისმურობის გათვალისწინებით;

8. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების წყაროდ

წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების კრებული СНИП-III-4-80 "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში" '

2 თვე 5 თვე 6 თვე 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე 12 თვე 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 17 თვე 18 თვე 3 თვე 4 თვე

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

განმარტებითი baraTiO

S.p.s. "NDN GROUP

"

2014

დამკვეთი: შ.პ.ს. :ზამბახი:
საქ.სამხედრო გზაზე ახმეტელის

ქუჩისა და ა.გ.ს. :გრეკოს: შორის

შ.პ.ს. :ზამბახის: სავაჭრო ობიექტი
ნ.კარანაძე

1-100

2008

გ.დათებაშვილი

დაკვეთა #

ფორმატი ფურცლის

სახელი

თბილისი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

ხელმოწერა

პროექტის სახელწოდება:

მისამართი:

თანამდებობა

შენიშვნები

შეასრულა

არქიტექტურული ნაწილი

პირობითი აღნიშვნები
გვარი

პრ.მთ.არქიტ

შეამოწმა

დირექტორი

A-3

გრაფიკი
