გენგეგმა მ. 1:500



შენიშვნა: სამუშაოების განხორციელება მოხდეს ხელით!

ფორმატი A-3	თბილისი 2012 წ.	
	დაკვეთა #09-2012	

ექსპლიკაცია:

1. სადემონტაჟო შენობა - 1 რიგი
2. სადემონტაჟო შენობა - 2 რიგი
3. არსებული შენობა
4. სამუშაოთა მწარმოებლის ოთახი
5. დროებითი საგარდერობო
6. დროებითი საინვენტარო
7. დროებითი ფარდული
8. დროებითი დახურული საწყობი
9. დროებითი საფარიანი ღობე
10. დროებითი ხის ჭიშკარი
11. დროებითი ღია სასაწყობო მოედანი

პირობითი ნიშნები

წითელი ხაზი

დროებითი ხის ღობე

სადემონტაჟო შენობა

დროებითი შენობა

შენიშვნები:

პროექტში ცვლილებები შეთანხმებული უნდა იქნეს პროექტის ავტორთან და მერიის საქალაქო სამსახურთან.

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი. თაქთაქიშვილის ქუჩა #12, 12ა.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი


შპს "კოლხი არტექსი"

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ლოსაბერძე	
პროექტის ავტორი	ბ. გოგოლაური	
მასშტაბი	1:100	გენგეგმა
თარიღი	23.04.2012	
სტადია		ფურცლები / ფურცელი
ესკიზი		4 / 1

ხის სართულშუა გადახურვის დემონტაჟის სქემა


ა/




ბ/



გ/



დ/

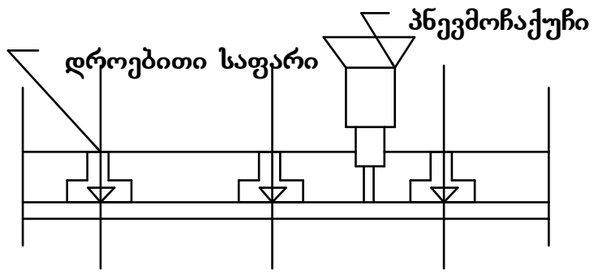

ა/ გადახურვა დემონტაჟის წინ

ბ/ გადახურვა იატაკის დემონტაჟის შემდეგ

გ/ გადახურვა უკუჩაყრის ამოღების შემდეგ

დ/ გადახურვა ჭერის დემონტაჟის შემდეგ

ფორმატი A-3	თბილისი 2012 წ.	
	დაკვეთა #09-2012	

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები:

პროექტში ცვლილებები შეთანხმებული უნდა იქნეს პროექტის ავტორთან და მერიის საქალაქო სამსახურთან.

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი. თაქთაქიშვილის ქუჩა #12, 12ა.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი

შპს "კოლხი არტექსი"

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ლოსაბერიძე	
პროექტის ავტორი	ბ. გოგოლაური	
მასშტაბი	1:100	ხის სართულშუა გადახურვის დემონტაჟის სქემა
თარიღი	23.04.2012	
სტადია		ფურცლები / ფურცელი
ესკიზი		4 / 2

კალენდარული გეგმა T=3.0 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით, დროებითი შენობების დაყენება	5																		
2	არსებული მაგისტრალური ქსელების გამორთვა და დემონტაჟი	2																		
	ძირითადი პერიოდის სადემონტაჟო სამუშაოები																			
	პირველი რიგი																			
1	სახურავის და მისი კონსტრუქციების დემონტაჟი	60																		
2	არსებული შიდა ქსელების დემონტაჟი																			
3	არსებული კარ-ფანჯრების ამოღება																			
4	არსებული კედლების და ხის იატაკის დემონტაჟი																			
5	არსებული საძირკვლის დანგრევა																			
	მეორე რიგი																			
1	სახურავის და მისი კონსტრუქციების დემონტაჟი	30																		
2	არსებული შიდა ქსელების დემონტაჟი																			
3	არსებული კარ-ფანჯრების ამოღება																			
4	არსებული კედლების და ხის იატაკის დემონტაჟი																			
5	არსებული საძირკვლის დანგრევა																			

ფორმატი A-3	თბილისი 2012 წ.	
	დაკვეთა #09-2012	

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები:

პროექტში ცვლილებები შეთანხმებული უნდა იქნეს პროექტის ავტორთან და მერიის საქალაქო სამსახურთან.

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი. თაქთაქიშვილის ქუჩა #12, 12ა.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი

შპს "კოლხი არტექსი"

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ლოსაბერძე	
პროექტის ავტორი	ბ. გოგოლაური	
მასშტაბი	1:100	კალენდარული გეგმა
თარიღი	23.04.2012	
სტადია		ფურცლები / ფურცელი
ესკიზი		4 / 3

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

დაამუშაა: / ბ. გოგოლაური /

ფორმატი A-3	თბილისი 2012 წ. დაკვეთა #09-2012

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები:

პროექტში ცვლილებები შეთანხმებული უნდა იქნეს პროექტის ავტორთან და მერიის საქალაქო სამსახურთან.

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი. თაქთაქიშვილის ქუჩა #12, 12ა.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი

შპს "კოლხი არტექსი"

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ლოსაბერძე	
პროექტის ავტორი	ბ. გოგოლაური	

მასშტაბი	1:100	კალენდარული გეგმა	
თარიღი	23.04.2012		
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
ესკიზი		4	4
